

E - INFORMATION GÉNÉRALE

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Type de l'inspection ? Mécanique ☒ Visuelle complète ☐ Visuelle partielle ☒ | Oui | Non | N/A |
| 2. Depuis la dernière inspection, un incendie est-il survenu ? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 3. Des changements d'occupation ont-ils eu lieu depuis la dernière inspection ? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 4. Est-ce que toutes les installations sont en service ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 5. Toutes les sections (nouvelles & anciennes) du bâtiment sont-elles bien protégées ? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 6. Dans certains secteurs, y-a-t-il un risque du gel de la tuyauterie ? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 7. Les chambres de gicleurs sont-elles dégagées, bien entretenues, chauffées ? | ☒ | ☐ | ☐ |

F - ÉTATS DES VALVES

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | N/A |
| 1. En bonne position et bien identifiées ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 2. Supervisées ou cadenassées ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 3. Lubrifiée et en bon condition ? | ☒ | ☐ | ☐ |

G - ÉTAT DE LA TUYAUTERIE

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | N/A |
| 1. La tuyauterie est-elle corrodée ? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 2. Les supports sont-ils adéquats ? | ☒ | ☐ | ☐ |

H - GICLEURS AUTOMATIQUES

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | N/A |
| 1. Installé depuis plus de 50 ans ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 2. Corrodés ou peints ? | ☐ | ☒ | ☐ |
| 3. Dégagés (18" des obstacles) ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 4. Munis de protecteurs si requis ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 5. De température appropriée ? | ☒ | ☐ | ☐ |

I - RACCORD SIAMOIS

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | N/A |
| 1. Y-a-t-il des raccords siamois ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 2. Sont-ils accessibles ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 3. Sont-ils bien identifiés ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 4. Sont-ils munis de capuchons ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 5. Les filets sont-ils en bon état ? | ☒ | ☐ | ☐ |

J - CABINETS DE RÉERVE DE GICLEURS

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Oui | Non | N/A |
| 1. Y-a-t-il un cabinet de réserve dans chaque salle de gicleur ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 2. Le nombre de têtes est-il suffisant ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 3. Protège-t'il de la poussière, de l'humidité etc ? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 4. Une clé est-elle présente ? | ☒ | ☐ | ☐ |

K - CANALISATION INCENDIE ET ROBINETS

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | Oui | Non | |
| 1. Le bâtiment est-il protégé par des boyaux incendie ? | ☒ | ☐ | Si oui, raccordée sur : Entrée d'eau gicleur |
| 2. Y a t-il des robinets pompier 2 1/2 ? | ☒ | ☐ | |

L - INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

1- Système Glycol Débarcadère : Test octobre 2025 (- 45)

2- Système Glycol Chaufferie : Test octobre 2025 (- 40)

M - INFORMATION SUR LES SYSTÈMES

1. Nombre de salles de gicleur	3	7. Nombre de points bas	
2. Nombre de systèmes sous-eau	3	8. Nombre de pompe incendie	
3. Nombre de systèmes sous-air	5	9. Nb. de robinets pompier 2 1/2	
4. Nombre de systèmes préaction	1 fm-200	10. Nombre de chute a déchets	
5. Nombre de débit		11. Nombre de D.A.R.	3
6. Nombre de valves		12. Nombre de système au glycol	2

13. Autre information

Normand : 418-564-5068

Responsable Monastère : 418-520-4102

14. Localisation des points bas

No système	Emplacement	No système	Emplacement
4	syst.air #1 (voir liste)		
5	syst.air #2 (voir liste)		
6	syst.air #3 (voir liste)		
7	syst.air #4 (voir liste)		
8	syst.air #5 (voir liste)		

15. Pompe d'appoint

Oui ☐ Non ☒

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)

Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : N/A

16. Pompe Incendie

Oui ☐ Non ☒ N/A

N/A

Bon fonctionnement sur essai de roulement : N/A

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)

Pression statique : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement du clapet de décharge : N/A

Salle des pompes est propre et accessible : N/A

Gallonnage : Gpm Raccord : N/A

N - SYSTÈME SOUS-EAU

1. Détails du système no 1

Marque et modèle : No. de série :

Année de fabrication : Diamètre (po) :

Zone protégée :

Emplacement :

Localisation du robinet d'essai :

2. Pompe de surpression Oui ☐ Non ☒

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)

Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Délai pour rebatir la pression :

Bon fonctionnement : Oui ☐ Non ☐

3. Essai des cloches satisfaisant

Oui Non N/A

Cloche électrique intérieure : ☐ ☐ ☒

Cloche électrique extérieure : ☐ ☐ ☒

Cloche hydraulique : ☐ ☐ ☒

4. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

Oui Non N/A

Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert : ☒ ☐ ☐

Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur : ☒ ☐ ☐

Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :

6. Renseignements supplémentaires

Oui Non N/A

La soupape d'alarme a-t-elle bien fonctionné ? ☐ ☐ ☒

La valve principale ferme-t-elle étanche ? ☒ ☐ ☐

La ligne d'alarme a été laissée en position normale? ☐ ☐ ☒

Le système a-t-il été laissé en opération ? ☒ ☐ ☐

N - SYSTÈME SOUS-EAU**1. Détails du système no 2**

Marque et modèle : No. de série :

Année de fabrication : Diamètre (po) :

Zone protégée :

Emplacement :

Localisation du robinet d'essai :

2. Pompe de surpression Oui ☐ Non ☒Pression au démarrage : lb/po2(kPa)Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)Délai pour rebatir la pression : Bon fonctionnement : Oui ☐ Non ☒**3. Essai des cloches satisfaisant**

Oui Non N/A

Cloche électrique intérieure : ☐ ☐ ☒Cloche électrique extérieure : ☐ ☐ ☒Cloche hydraulique : ☐ ☐ ☒**4. Essai d'écoulement (2")**Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)**5. Tuyau d'essai**

Oui Non N/A

Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert : ☐ ☐ ☒Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur : ☐ ☐ ☒Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur : **6. Renseignements supplémentaires**

Oui Non N/A

La soupape d'alarme a-t-elle bien fonctionné ? ☐ ☐ ☒La valve principale ferme-t-elle étanche ? ☒ ☐ ☐La ligne d'alarme a été laissée en position normale? ☐ ☐ ☒Le système a-t-il été laissé en opération ? ☒ ☐ ☐

N - SYSTÈME SOUS-EAU

1. Détails du système no 3

Marque et modèle : No. de série :

Année de fabrication : Diamètre (po) :

Zone protégée :

Emplacement :

Localisation du robinet d'essai :

2. Pompe de surpression Oui ☒ Non ☐

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)

Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Délai pour rebatir la pression :

Bon fonctionnement : Oui ☒ Non ☐

3. Essai des cloches satisfaisant

Oui Non N/A

Cloche électrique intérieure : ☐ ☐ ☒

Cloche électrique extérieure : ☐ ☐ ☒

Cloche hydraulique : ☐ ☐ ☒

4. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

Oui Non N/A

Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert : ☒ ☐ ☐

Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur : ☒ ☐ ☐

Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :

6. Renseignements supplémentaires

Oui Non N/A

La soupape d'alarme a-t-elle bien fonctionné ? ☒ ☐ ☐

La valve principale ferme-t-elle étanche ? ☒ ☐ ☐

La ligne d'alarme a été laissée en position normale? ☒ ☐ ☐

Le système a-t-il été laissé en opération ? ☒ ☐ ☐

N - SYSTÈME SOUS-EAU

1. Détails du système no 4

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Pompe de surpression Oui ☒ Non ☐

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)
 Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)
 Délai pour rebatir la pression :
 Bon fonctionnement : Oui ☒ Non ☐

3. Essai des cloches satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☒	☐	☐

4. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)
 Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Renseignements supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape d'alarme a-t-elle bien fonctionné ?	☒	☐	☐
La valve principale ferme-t-elle étanche ?	☒	☐	☐
La ligne d'alarme a été laissée en position normale?	☒	☐	☐
Le système a-t-il été laissé en opération ?	☒	☐	☐

O - SYSTÈME SOUS-AIR

1. Détails du système no 5

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Dispositif d'ouverture rapide

Oui ☒ Non ☐

Marque : Modèle : Année :

3. Compresseur à air

Individuel ☐ Usine ☒

Marque : Modèle :

Pression au démarrage : lb/po2(kPa) Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : Oui

4. Essai des cloche satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☐	☐	☒

5. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Déclenchement

Partiel ☒ Complet ☐ N/A ☐ Année du dernier déclenchement :

Pression de l'eau : lb/po2(kPa) Pression de l'air avant : lb/po(kPa) Pression déclenchement :

Délai de déclenchement de la soupape : Si complet, délai à l'orifice d'essai :

7. Informations supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape s'est bien déclenché et le clapet est resté ouvert ?	☒	☐	☐
Les valves et le robinet à bille sont fonctionnels et étanche ?	☒	☐	☐
Le déclenchement complet a été fait lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les pentes ont été vérifiées lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les points bas ont été vidangés ?	☒	☐	☐

O - SYSTÈME SOUS-AIR

1. Détails du système no 6

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Dispositif d'ouverture rapide

Oui ☒ Non ☐

Marque : Modèle : Année :

3. Compresseur à air

Individuel ☐ Usine ☒

Marque : Modèle :

Pression au démarrage : lb/po2(kPa) Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : Oui

4. Essai des cloche satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☐	☐	☒

5. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Déclenchement

Partiel ☒

Complet ☐

N/A ☐

Année du dernier déclenchement :

Pression de l'eau : lb/po2(kPa) Pression de l'air avant : lb/po(kPa) Pression déclenchement :

Délai de déclenchement de la soupape : Si complet, délai à l'orifice d'essai :

7. Informations supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape s'est bien déclenché et le clapet est resté ouvert ?	☒	☐	☐
Les valves et le robinet à bille sont fonctionnels et étanche ?	☒	☐	☐
Le déclenchement complet a été fait lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les pentes ont été vérifiées lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les points bas ont été vidangées ?	☒	☐	☐

O - SYSTÈME SOUS-AIR

1. Détails du système no 7

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Dispositif d'ouverture rapide

Oui ☒ Non ☐

Marque : Modèle : Année :

3. Compresseur à air

Individuel ☐ Usine ☒

Marque : Modèle :

Pression au démarrage : lb/po2(kPa) Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : Oui

4. Essai des cloche satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☐	☐	☒

5. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Déclenchement

Partiel ☒

Complet ☐

N/A ☐

Année du dernier déclenchement :

Pression de l'eau : lb/po2(kPa) Pression de l'air avant : lb/po(kPa) Pression déclenchement :

Délai de déclenchement de la soupape : Si complet, délai à l'orifice d'essai :

7. Informations supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape s'est bien déclenché et le clapet est resté ouvert ?	☒	☐	☐
Les valves et le robinet à bille sont fonctionnels et étanche ?	☒	☐	☐
Le déclenchement complet a été fait lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les pentes ont été vérifiées lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les points bas ont été vidangées ?	☒	☐	☐

O - SYSTÈME SOUS-AIR

1. Détails du système no 7

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Dispositif d'ouverture rapide

Oui ☒ Non ☐

Marque : Modèle : Année :

3. Compresseur à air

Individuel ☐ Usine ☒

Marque : Modèle :

Pression au démarrage : lb/po2(kPa) Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : Oui

4. Essai des cloche satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☐	☐	☒

5. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Déclenchement

Partiel ☒ Complet ☐ N/A ☐ Année du dernier déclenchement :

Pression de l'eau : lb/po2(kPa) Pression de l'air avant : lb/po(kPa) Pression déclenchement :

Délai de déclenchement de la soupape : Si complet, délai à l'orifice d'essai :

7. Informations supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape s'est bien déclenché et le clapet est resté ouvert ?	☒	☐	☐
Les valves et le robinet à bille sont fonctionnels et étanche ?	☒	☐	☐
Le déclenchement complet a été fait lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les pentes ont été vérifiées lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les points bas ont été vidangées ?	☒	☐	☐

O - SYSTÈME SOUS-AIR

1. Détails du système no 8

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Dispositif d'ouverture rapide Oui ☒ Non ☐

Marque : Modèle : Année :

3. Compresseur à air

Individuel ☐ Usine ☒

Marque : Modèle :

Pression au démarrage : lb/po2(kPa) Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : Oui

4. Essai des cloche satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☐	☐	☒

5. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Déclenchement Partiel ☒ Complet ☐ N/A ☐ Année du dernier déclenchement :

Pression de l'eau : lb/po2(kPa) Pression de l'air avant : lb/po(kPa) Pression déclenchement :

Délai de déclenchement de la soupape : Si complet, délai à l'orifice d'essai :

7. Informations supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape s'est bien déclenché et le clapet est resté ouvert ?	☒	☐	☐
Les valves et le robinet à bille sont fonctionnels et étanche ?	☒	☐	☐
Le déclenchement complet a été fait lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les pentes ont été vérifiées lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les points bas ont été vidangés ?	☒	☐	☐

O - SYSTÈME SOUS-AIR

1. Détails du système no 9

Marque et modèle : No. de série :
 Année de fabrication : Diamètre (po) :
 Zone protégée :
 Emplacement :
 Localisation du robinet d'essai :

2. Dispositif d'ouverture rapide Oui ☒ Non ☐

Marque : Modèle : Année :

3. Compresseur à air

Individuel ☐ Usine ☒

Marque : Modèle :

Pression au démarrage : lb/po2(kPa) Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : Oui

4. Essai des cloche satisfaisant

	Oui	Non	N/A
Cloche électrique intérieure :	☐	☐	☒
Cloche électrique extérieure :	☐	☐	☒
Cloche hydraulique :	☐	☐	☒

5. Essai d'écoulement (2")

Pression statique de l'eau : lb/po2(kPa)

Pression résiduelle de l'eau : lb/po2(kPa)

5. Tuyau d'essai

	Oui	Non	N/A
Robinet(s) d'essai de l'inspecteur ouvert :	☒	☐	☐
Libre écoulement au tuyau de l'inspecteur :	☒	☐	☐
Diamètre de l'orifice au tuyau de l'inspecteur :	1/2		

6. Déclenchement Partiel ☒ Complet ☐ N/A ☐ Année du dernier déclenchement :

Pression de l'eau : lb/po2(kPa) Pression de l'air avant : lb/po(kPa) Pression déclenchement :

Délai de déclenchement de la soupape : Si complet, délai à l'orifice d'essai :

7. Informations supplémentaires

	Oui	Non	N/A
La soupape s'est bien déclenché et le clapet est resté ouvert ?	☒	☐	☐
Les valves et le robinet à bille sont fonctionnels et étanche ?	☒	☐	☐
Le déclenchement complet a été fait lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les pentes ont été vérifiées lors des 5 dernières années ?	☐	☐	☐
Les points bas ont été vidangés ?	☒	☐	☐

- INFORMATION SUR LES POINTS BAS DES SYSTÈMES SOUS-AIR

SYSTÈME # Zone-1 (vert)

No	Emplacement	No	Emplacement
1	Local SS-7C (1")		

SYSTÈME # Zone-2 (jaune)

No	Emplacement	No	Emplacement
1	Vide sanitaire (SS R-22) (1")		
2	Local R-16 Ouest (1/2")		
3	Local R-19 Ouest (1/2")		

SYSTÈME # Zone-3 (bleu)

No	Emplacement	No	Emplacement
1	Mur face frigo #2 local 46 Ouest (3/4")	7	Local R-6 monastère (1/2")
2	SS local 46 escalier arr.cuisine (1")	8	Local R-2 monastère (1/2")
3	Local R-38 Ouest (1/2")		
4	Local R-40 Ouest (1/2")		
5	Local R-46 Ouest bur. petite porte (1/2")		
6	Couloir près R-4 (monastère) (1/2")		



P - Liste des contrôles du système

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre pouce	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Valve Principale (SS R-22)	1	Waffer		6"	02-197	✓		
Valve #1 DAR (SS R-22)	1	Bfv	Vict	6"	02-195	✓		
Valve #2 DAR (SS R-22)	1	Bfv	Vict	6"	02-196	✓		
Valve Boyaux ouest (SS R-22)	1	Bfv	Global	4"	02-161	✓		
Débit Boyaux ouest	1	Wf	Vsr	4"	02-160	✓		
Valve Boyaux #2 (SS R-22)	1	Waffer	Pcvs	4"	02-208	✓		
Valve chute à linge (SS R-22)	1	Osy	Pts-c	2"	02-162	✓		
Débit gicleur chute à linge	1	Wf	Vsr	2"	02-163	✓		
Valve principale ouest (SS R-22)	1	Waffer	Pts-c	6"	02-207	✓		
Débit principale sect. ouest	1	Wf	Vsr	6"	02-179	✓		
Système sous-air #1 (vert) (R-22)	5							
Valve principale système	5	Bfv	Global	4"	02-206	✓		
Haute pression	5	Ps	Ps-40	1/2"	02-185	✓		
Basse pression	5	Ps	Ps-40	1/2"	02-186	✓		
Débit système air #1	5	Ps	Ps-10	1/2"	02-177	✓		
Valve isolement local 205	5	Waffer	Pts-c	2" 1/2	02-166	✓		
Valve isolement local 305	5	Waffer	Pts-c	2" 1/2	02-164	✓		
Valve isolement local 407	5	Waffer	Pts-c	2" 1/2	02-168	✓		
Système sous-air #2 (jaune) (R-22)	6							
Valve principale système	6	Bfv	Global	4"	02-204	✓		
Haute pression	6	Ps	Ps-40	1/2"	02-187	✓		
Basse pression	6	Ps	Ps-40	1/2"	02-188	✓		
Débit système air #2	6	Ps	Ps-10	1/2"	02-178	✓		
PIV Extérieur	1	PIV	Pcvs	-	02-198	✓		
Basse pression ligne d'air principale	1	Ps	Ps-40	1/2"	03-174	✓		
Valve isolement Boyaux vide tech.	1	Bfv	-	4"	02-209			



P - Liste des contrôles du système

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre pouce	Adresse	Signal reçu Oui / Non		Note
Système sous-air #3 (bleu) (R-22)	7							
Valve principale système	7	Bfv	Global	4"	02-205	✓		
Haute pression	7	Ps	Ps-40	1/2"	02-189	✓		
Basse pression	7	Ps	Ps-40	1/2"	02-190	✓		
Débit système air #3	7	Ps	Ps-10	1/2"	03-175	✓		
Système sous-air #4 (orange) (R-22)	8							
Valve principale système	8	Bfv	Global	4"	02-202	✓		
Haute pression	8	Ps	Ps-40	1/2"	02-191	✓		
Basse pression	8	Ps	Ps-40	1/2"	02-192	✓		
Débit système air #4	8	Ps	Ps-10	1/2"	02-176	✓		
Système sous-air #5 (mauve) (R-22)	9							
Valve principale système	9	Bfv	Global	4"	02-203	✓		
Haute pression	9	Ps	Ps-40	1/2"	02-193	✓		
Basse pression	9	Ps	Ps-40	1/2"	02-194	✓		
Débit système air #5	9	Ps	Ps-10	1/2"	02-173	✓		
Valve #1 DAR monastère	2	Bfv	Vict	4"	02-210	✓		
Valve #2 DAR monastère	2	Bfv	Vict	4"	02-210	✓		
Valve principale monastère	2	Waffer	Pts-c	4"	02-211	✓		
Salle Mécanique R-15	3							
Valve #1 DAR (R15)	3	Bfv	Vict	4"	03-129	✓		
Valve #2 DAR (R15)	3	Bfv	Vict	4"	03-129	✓		
Valve principale Boyaux Est (R15)	3	Waffer	Pcvs	4"	02-214	✓		
Débit principale Boyaux Est	3	Wf	Vsr	4"	02-213	✓		
Valve alimentation chaufferie (R15)	3	Bfv	Vict	4"	03-155	✓		
Débit principale alim. chaufferie	3	Wf	Vsr	4"	03-154	✓		
Valve principale syst.#3 Est (R15)	3	Bfv	Global	4"	03-157	✓		



P - Liste des contrôles du système

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre pouce	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Haute Pression	3	Ps	Ps-120	1/2"	03-158	✓		
Basse Pression	3	Ps	Ps-120	1/2"	03-159	✓		
Débit système sous-eau #3	3	Ps	Ps-10	1/2"	03-156	✓		
Valve Rdc-Est (R-15)	3	Bfv	Global	3"	03-152	✓		
Débit Rdc-Est	3	Wf	Vsr	3"	03-153	✓		
Valve Rdc-Nord (R-15)	3	Bfv	Vict	2"	03-161	✓		
Débit Rdc-Nord	3	Wf	Vsr	2"	03-162	✓		
Valve section colonne Est près R-31	3	Waffer	Pcvs	4"	02-184	✓		
Valve section colonne Est près R-12	3	Waffer	Pcvs	4"	02-183	✓		
Valve section colonne Est près R-11	3	Waffer	Pcvs	4"	02-182	✓		
Valve syst. glycol local R-13	3	Bfv	Vict	1" 1/4	03-160	✓		
Valve chute à linge local R-17	3	Bfv	Global	2"	02-171	✓		
Débit chute à linge	3	Wf	Vsr	2"	02-170	✓		
Contrôle niveau-1 (local-131)	3	Bfv	Vict	2"	03-163	✓		
Débit niveau-1	3	Wf	Vsr	2"	03-164	✓		
Contrôle niveau-2 (local-213)	3	Bfv	Vict	2"	03-150	✓		
Débit niveau-2	3	Wf	Vsr	2"	03-151	✓		
Contrôle niveau-3 (local-315)	3	Bfv	Vict	2"	03-403	✓		
Débit niveau-3	3	Wf	Vsr	2"	03-404	✓		
Contrôle niveau-4 (local-415)	3	Bfv	Vict	2"	03-401	✓		
Débit niveau-4	3	Wf	Vsr	2"	03-402	✓		
Contrôle niveau-5 (local-515)	3	Bfv	Vict	2"	03-399	✓		
Débit niveau-5	3	Wf	Vsr	2"	03-400	✓		
Contrôle niveau-6 (local-613)	3	Bfv	Flavico	2" 1/2	03-395	✓		
Débit niveau-6	3	Wf	Vsr	2" 1/2	03-396	✓		
Contrôle niveau-7 (cabanon)	3	Bfv	Global	2" 1/2	03-397	✓		
Débit niveau-7	3	Wf	Vsr	2" 1/2	03-398	✓		
Valve iso. cellule crise niveau-3	3	Bfv	Global	1" 1/4	03-410	✓		
Valve iso. unité intensive niveau-3	3	Bfv	Global	1" 1/2	03-412	✓		
Valve iso. unité interne niveau-3	3	Bfv	Global	1"1/2	03-414	✓		

P - Liste des contrôles du système (SUITE)

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Chaudière	4					☐	☐	
Valve principale système #4	4	Bfv	Global	4"	05-133	☒	☐	
Haute pression	4	Ps	Ps-120	1/2"	05-138	☒	☐	
Basse pression	4	Ps	Ps-120	1/2"	05-134	☒	☐	
Débit système sous-eau #4	4	Ps	Ps-10	1/2"	05-137	☒	☐	
Contrôle chaudière/atelier/bouilloire	4	Bfv	Global	4"	05-136	☒	☐	
Débit chaudière atelier/bouilloire	4	Wf	Wf	4"	05-135	☒	☐	
Contrôle secteur Nord-Ouest tunnel	4	Bfv	Global	2"	05-132	☒	☐	
Débit secteur Nord-Ouest tunnel	4	Wf	Vsr	2"	05-131	☒	☐	
Contrôle secteur Nord-Est tunnel	4	Bfv	Vict	2" 1/2	05-130	☒	☐	
Débit secteur Nord-Est tunnel	4	Wf	Vsr	2" 1/2	05-129	☒	☐	
Valve système glycol chaudière	4	Bfv	Vict	1" 1/2	05-128	☒	☐	
Contrôle niveau-2	4	Bfv	Vict	2"	05-127	☒	☐	
Débit niveau-2	4	Wf	Vsr	2"	05-126	☒	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	



CERTIFICAT D'INSPECTION

BÂTIMENT :

CENTRE HÉBERGEMENT SACRÉ-COEUR
1, AVENUE SACRÉ-COEUR
QUÉBEC, QC

DESCRIPTION DE
L'INSPECTION :

INSPECTION ANNUELLE DE VOS BOYAUX INCENDIE
ET DE VOTRE CANALISATION INCENDIE

TYPE

☒ ANNUELLE
☐ BI-ANNUELLE

L'INSPECTION A ÉTÉ ACCOMPLIE SELON LES EXIGENCES DE LA NORME NFPA 25 RELATIVE AU CONTRÔLE, À L'ESSAI ET À LA
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE

CONFORME : ☐

FONCTIONNEL AVEC NON-CONFORMITÉS :

(VOIR DÉTAIL SUR LE RAPPORT)

DATE DE L'INSPECTION : 28 OCTOBRE 2025

INSPECTEUR :

SIGNATURE



6-B RUE THOMAS-PAGEAU
QUÉBEC (QC), G2N 1H8
TÉLÉPHONE 1 : (418)-563-0526
TÉLÉPHONE 2 : (418)-563-0350

R - Liste des boyaux/cabinets incendies

Localisation	Longueur	Année Fab.	Dernier Test	Prochain Test	Conforme	Oui / Non	Note
1- Près porte B (# 32)	75'	1990	2023	2026	✓		+ valve 2" 1/2
2- Près 101 Ouest (#31)	75'	1986	2023	2026	✓		+ valve 2" 1/2
3- Près Porte-E (#12)	75'	1998	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
4- Près local 144 Est (#11)	100'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
5- Près local 108 Nord (#21)	75'	1998	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
6- Près local R-36 Est (#13)	75'	1988	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
7- Près local R-8 Est (#14)	100'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
8- Près local R-13 Est (#22)	100'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
9- Près local R-3 Ouest (#33)	75'	1984	2023	2026	✓		+ valve 2" 1/2
10- Près local R-18 Ouest (#34)	75'	1984	2023	2026	✓		+ valve 2" 1/2
11- Près local R-5 Centrale (#16)	75'	1988	2023	2026	✓		+ valve 2" 1/2
12- Près local 110 Centrale (#15)	75'	1988	2023	2026	✓		+ valve 2" 1/2
13-Près local 513 Ouest (#23)	75'	1988	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
14- Près local 428 Ouest (#25)	75'	1988	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
15- Près local 400 Est (#24)	75'	1983	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
16- Près local 507 Est (#04)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
17- Près local 529 Est (#03)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
18- Près local 634 Est (#01)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
19- Près local 608 Est (#02)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
20- Près local 409 Nord (#18)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
21- Près local 241 (#30)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
22- Près local 210 (#29)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
23- Près local 214 (#10)	100'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
24- Près local 226B (#09)	75'	1983	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
25- Près local 309 Nord (#19)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
26- Près local 211 Nord (#20)	75'	2000	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
27- Près local 314 (#08)	75'	1986	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
28- Près local 336 (#07)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
29- Près local 310 (#26)	75'	1986	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
30- Près local 334 (27)	75'	1986	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
31- Près local 362 Ouest (#28)	75'	1984	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
32- Près local (#05)	75'	1986	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
33- Près local (#06)	75'	1986	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)
34- Près local (#17)	75'	1986	2023	2026		✓	+ valve 2"1/2 (manque clé boyaux)



PREVENTCO
INCENDIE INC.

RAPPORT D'ESSAI ET VÉRIFICATION D.A.R.

Date: 28 octobre 2025

RENSEIGNEMENTS CLIENT

Adresse de la propriété: 1, Avenue Sacré-Coeur Occupant: _____
Propriétaire/dispositif: Centre Hébergement Sacré-Coeur
Personne contact : _____ tél: _____
Adresse du propriétaire: _____ Code postal: _____

DISPOSITIF

Dispositif anti-refoulement: DArPR ☐ DAr2Cr ☒ C-VP ☐ C-VPAD ☐
Type d'essai: Initial ☐ Annuel ☒ Reprise pour réparation ☐
Marque du dispositif: Watts Modèle: 757-DC No série: JH-1169 Diamètre: 6"
Numéro d'inventaire du dispositif: #1
Emplacement du dispositif: Entrée d'eau gicleur local R-22

RÉSULTAT DES ESSAIS

Pression de la conduite pendant l'essai: 77 lb/po2

Dispositif à 2 clapets de retenue et robinets ou à pression réduite				Casse-Vide à pression	
Clapet # 1		Clapet # 2		Soupape de décharge	Soupape d'admission d'air
Sens normal	Contre-sens	Sens normal	Contre-sens	Défaillance: ☐ Ouverture: ☐ _____ lb/po2	Défaillance: ☐ Ouverture: ☐ _____ lb/po2
Fuite ☐	Fuite ☐	Fuite ☐	Fuite ☐		
Étanche ☒	Étanche ☒	Étanche ☒	Étanche ☒	Chute de retenue dans le clapet de retenue _____ lb/po2	Fuite ☐ Étanche ☐ Chute de retenue dans le clapet de retenue _____ lb/po2
Chute de retenue dans le clapet <u>2.6</u> lb/po2	Chute de retenue dans le clapet <u>3.0</u> lb/po2	Chute de retenue dans le clapet <u>3.0</u> lb/po2	Chute de retenue dans le clapet <u>3.0</u> lb/po2		

A- Différentiel de pression du clapet # 1 : _____ lb/po2 B- Point d'ouverture de la soupape de: _____ lb/po2

A- B = Différence (3 PSI ou plus) : _____ lb/po2 Robinet d'arrêt #2 : Fuite ☐ Étanche ☒

RÉSULTAT DES ESSAIS : Réussite: ☒ Échec: ☐

En cas d'échec au cours de l'essai du dispositif, pour toute raison, identifier la ou les causes de défaillances

Cause de défaillance (si visible) : _____

Observations : _____

VÉRIFICATEUR

Nom du vérificateur : _____ Nom de L'entreprise: Préventco Incendie, 6 rue Thomas-Pageau, Qc, G2N 1H8

Numéro de certificat: 2016621265 Téléphone 1: 418-563-0526 Téléphone 2: 418-563-0350

Marque du matériel d'essai: Mid-West - Modèle: 845 - Numéro de série: 08230680 - Date d'étalonnage: 11 décembre 2024

Signature du vérificateur: _____ Date: 28 octobre 2025



PREVENTCO
INCENDIE INC.

RAPPORT D'ESSAI ET VÉRIFICATION D.A.R.

Date: 28 octobre 2025

RENSEIGNEMENTS CLIENT

Adresse de la propriété: 1, Avenue Sacré-Coeur Occupant: _____
Propriétaire/dispositif: Centre Hébergement Sacré-Coeur
Personne contact : _____ tél: _____
Adresse du propriétaire: _____ Code postal: _____

DISPOSITIF

Dispositif anti-refoulement: DArPR ☒ DAr2Cr ☐ C-VP ☐ C-VPAD ☐
Type d'essai: Initial ☐ Annuel ☒ Reprise pour réparation ☐
Marque du dispositif: Wilkins Modèle: 375 AST No série: 22710C Diamètre: 4"
Numéro d'inventaire du dispositif: #2
Emplacement du dispositif: Entrée d'eau gicleur local R-15 EST

RÉSULTAT DES ESSAIS

Pression de la conduite pendant l'essai: 75 lb/po₂

Dispositif à 2 clapets de retenue et robinets ou à pression réduite				Casse-Vide à pression	
Clapet # 1		Clapet # 2		Soupape de décharge	Soupape d'admission d'air
Sens normal	Contre-sens	Sens normal	Contre-sens	Défaillance: ☐ Ouverture: ☒ <u>2.6</u> lb/po ₂	Défaillance: ☐ Ouverture: ☐ _____ lb/po ₂
Fuite ☐	Fuite ☐	Fuite ☐	Fuite ☐		
Étanche ☒	Étanche ☐	Étanche ☒	Étanche ☒		
Chute de retenue dans le clapet <u>7.4</u> lb/po ₂		Chute de retenue dans le clapet <u>2.6</u> lb/po ₂			Clapet de retenue Fuite ☐ Étanche ☐ Chute de retenue dans le clapet de retenue _____ lb/po ₂

A- Différentiel de pression du clapet # 1 : 7.4 lb/po₂ B- Point d'ouverture de la soupape de: 2.6 lb/po₂

A - B = Différence (3 PSI ou plus) : 4.8 lb/po₂ Robinet d'arrêt #2 : Fuite ☐ Étanche ☒

RÉSULTAT DES ESSAIS : Réussite: ☒ Échec: ☐

En cas d'échec au cours de l'essai du dispositif, pour toute raison, identifier la ou les causes de défaillances

Cause de défaillance (si visible) : _____

Observations : _____

VÉRIFICATEUR

Nom du vérificateur : _____ Nom de L'entreprise: Préventco Incendie, 6 rue Thomas-Pageau, Qc, G2N 1H8

Numéro de certificat: 2016621265 Téléphone 1: 418-563-0526 Téléphone 2: 418-563-0350

Marque du matériel d'essai: Mid-West - Modèle: 845 - Numéro de série: 08230680 - Date d'étalonnage: 11 décembre 2024

Signature du vérificateur: _____ Date: 28 octobre 2025



PREVENTCO
INCENDIE INC.

RAPPORT D'ESSAI ET VÉRIFICATION D.A.R.

Date: 28 octobre 2025

RENSEIGNEMENTS CLIENT

Adresse de la propriété: 1, Avenue Sacré-Coeur Occupant: _____
Propriétaire/dispositif: Centre Hébergement Sacré-Coeur
Personne contact : _____ tél: _____
Adresse du propriétaire: _____ Code postal: _____

DISPOSITIF

Dispositif anti-refoulement: DArPR ☐ DAr2Cr ☒ C-VP ☐ C-VPAD ☐
Type d'essai: Initial ☐ Annuel ☒ Reprise pour réparation ☐
Marque du dispositif: Watts Modèle: 757-DC No série: OK-1412 Diamètre: 4"
Numéro d'inventaire du dispositif: #3
Emplacement du dispositif: Entrée d'eau boyaux incendie monastère

RÉSULTAT DES ESSAIS

Pression de la conduite pendant l'essai: 79 lb/po2

Dispositif à 2 clapets de retenue et robinets ou à pression réduite				Casse-Vide à pression		
Clapet # 1		Clapet # 2		Soupape de décharge	Soupape d'admission d'air	Clapet de retenue
Sens normal	Contre-sens	Sens normal	Contre-sens	Défaillance: ☐ Ouverture: ☐ _____lb/po2	Défaillance: ☐ Ouverture: ☐ _____lb/po2	Fuite ☐
Fuite ☐	Fuite ☐	Fuite ☐	Fuite ☐			Étanche ☐
Étanche ☒	Étanche ☒	Étanche ☒	Étanche ☒			Chute de retenue dans le clapet de retenue
Chute de retenue dans le clapet 30. _____lb/po2		Chute de retenue dans le clapet 2.2 _____lb/po2				_____lb/po2

A- Différentiel de pression du clapet # 1 : _____ lb/po2 B- Point d'ouverture de la soupape de: _____ lb/po2

A - B = Différence (3 PSI ou plus) : _____ lb/po2 Robinet d'arrêt #2 : Fuite ☐ Étanche ☒

RÉSULTAT DES ESSAIS : Réussite: ☒ Échec: ☐

En cas d'échec au cours de l'essai du dispositif, pour toute raison, identifier la ou les causes de défaillances

Cause de défaillance (si visible) : _____

Observations : _____

VÉRIFICATEUR

Nom du vérificateur : _____ Nom de L'entreprise: Préventco Incendie, 6 rue Thomas-Pageau, Qc, G2N 1H8

Numéro de certificat: 2016621265 Téléphone 1: 418-563-0526 Téléphone 2: 418-563-0350

Marque du matériel d'essai: Mid-West - Modèle: 845 - Numéro de série: 08230680 - Date d'étalonnage: 11 décembre 2024

Signature du vérificateur: _____ Date: 28 octobre 2025

DATE DE L'INSPECTION

5 janvier 2026

Art. 53 54 et 56
LADOP**INSPECTEUR**Trimestrielle ☒ Bi-annuelle ☐**PREVENTCO**
INCENDIE INC.

RAPPORT D'INSPECTION SYSTÈME DE GICLEUR AUTOMATIQUE

A - INFORMATION SUR LE BÂTIMENT

IDENTIFICATION :

CH Sacré-Coeur

ADRESSE :

1, avenue du Sacré-Coeur

Québec, Qc

REPRÉSENTANT :

Guy Dufour

**NFPA 25**
Standard for the
Inspection, Testing,
and Maintenance



- ☐ Conforme
- ☒ Fonctionnel avec non-conformités
- ☐ Non-fonctionnel

C - NON-CONFORMITÉS

- | |
|---|
| 1- Changer 2x accélérateurs des systèmes sous air jaune et bleu... ne sont plus fonctionnel |
| 2- Changer les 4x tuyaux d'alimentation d'air flexible au 4x systèmes sous air car elles fuient |
| 3- Refaire la tuyauterie de drainage et ajouter une "cup" sous les purgeur a ressort de la ligne d'alarmes des systèmes sous-air vert/jaune et bleu |
| 4- Il n'y a pas de gicleurs pour le corridor du sous-sol vers le monastère et près de la cuisine... un nouveau plafond a été installer mais les gicleurs n'ont pas suivi.... |
| 5- Changer le type de panier protecteur du corridor près du local R-22 par des paniers approuvés. |
| 6- 27x clef de type Trinal pour les boyaux incendie sont manquante dans les cabinets |
| 7- Les tuyauteries des systèmes sous-air semblent bouchées selon les derniers rapport... une investigation devrait être fait ainsi que la localisation des points bas... Par la suite un déclenchement complet devrait être réalisé |

D - RECOMMANDATIONS

- | |
|---|
| 1- Changer les 2x courroies du compresseur à air car elle est craqué et sur le point de briser... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Identification du système : Système #1 section Ouest Easy riser (sous-sol R-22)

Vérifié par : XXXXXXXXXX Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système		☐	☐	☒	
Pression d'air de l'accélérateur		☐	☐	☒	
Pression d'eau de la ville	76	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	76	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bonne état de fonctionnement		☐	☐	☒	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage		☐	☐	☒	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).

Identification du système : Système #2 sous eau Monastère (Sous-sol Monastère)

Vérifié par : XXXXXXXXXX Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système		☐	☐	☒	
Pression d'air de l'accélérateur		☐	☐	☒	
Pression d'eau de la ville	78	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	78	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux	78	☒	☐	☐	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☒	☐	☐	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage	74	☒	☐	☐	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).



PREVENTCO
INCENDIE INC.

Fiche d'inspection trimestrielle

Identification du système : Système #3 sous eau Zone Est Astra E (Salle mécanique R-15)

Vérifié par : [REDACTED]

Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système		☐	☐	☒	
Pression d'air de l'accélérateur		☐	☐	☒	
Pression d'eau de la ville	59	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	59	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☒	☐	☐	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage	46	☒	☐	☐	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).



PREVENTCO
INCENDIE INC.

Fiche d'inspection trimestrielle

Identification du système : Système #4 sous air (zone vert) aile Ouest Tyco DPV-1 (Salle de bain R-22)

Vérifié par : [REDACTED]

Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système	42	☒	☐	☐	
Pression d'air de l'accélérateur	42	☒	☐	☐	
Pression d'eau de la ville	75	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	75	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☒	☐	☐	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage		☐	☐	☒	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	Courroie du compresseur à changer et fuite sur ligne d'air
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).

Identification du système : Système #5 sous air (zone jaune) aile Ouest Tyco DPV-1 (Salle de bain R-22)

Vérifié par : [REDACTED] Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système	40	☒	☐	☐	
Pression d'air de l'accélérateur		☐	☒	☐	accélérateur fermé à remplacer
Pression d'eau de la ville	75	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	75	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☐	☐	☒	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage		☐	☐	☒	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	Courroie du compresseur à changer et fuite sur ligne d'air
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).



PREVENTCO
INCENDIE INC.

Fiche d'inspection trimestrielle

Identification du système : Système #6 sous air (zone bleu) aile Ouest Tyco DPV-1 (Salle de bain R-22)

Vérifié par : [REDACTED]

Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système	40	☒	☐	☐	
Pression d'air de l'accélérateur		☐	☒	☐	Accélérateur fermé à remplacer
Pression d'eau de la ville	70	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	70	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☒	☐	☐	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage		☐	☐	☒	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	Courroie du compresseur à changer et fuite sur ligne d'air
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).

Identification du système : Système #7 sous air (zone orange) aile Ouest Tyco DPV-1 (Salle de bain R-22)

Vérifié par : [REDACTED] Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système	40	☒	☐	☐	
Pression d'air de l'accélérateur	40	☒	☐	☐	
Pression d'eau de la ville	70	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	70	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☒	☐	☐	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage		☐	☐	☒	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	Courroie du compresseur à changer et fuite sur ligne d'air
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).



PREVENTCO
INCENDIE INC.

Fiche d'inspection trimestrielle

Identification du système : Système #8 sous air (zone mauve) aile Ouest Tyco DPV-1 (Salle de bain R-22)

Vérifié par : [REDACTED]

Date : 5 janvier 2026

Pressions des jauges + pompe incendie	Pression (Psi)	C	NC	N/A	Commentaires
Pression d'air du système	42	☒	☐	☐	
Pression d'air de l'accélérateur	42	☒	☐	☐	
Pression d'eau de la ville	75	☒	☐	☐	
Pression de service du système de gicleur	75	☒	☐	☐	
Pression de service des canalisations/boyaux		☐	☐	☒	
Panneau de pompe incendie en bon état de fonctionnement		☒	☐	☐	
État des manomètres		☒	☐	☐	
Pression de la canalisation au dernier étage		☐	☐	☒	

Vannes et alarmes	C	NC	N/A	Commentaires
Système en service à l'arrivée	☒	☐	☐	
Compresseur/pompe de surpression en état de marche	☒	☐	☐	Courroie du compresseur à changer et fuite sur ligne d'air
Vérification visuelle de l'ensemble des composantes	☒	☐	☐	
Salle de gicleur propre et accessible	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle en position ouverte	☒	☐	☐	
Vannes de contrôle facilement accessibles	☒	☐	☐	
Siamoise extérieure accessible et en bon état.	☒	☐	☐	
Vanne de l'alarme en position ouverte	☒	☐	☐	
Absence de fuites sur la tuyauterie	☒	☐	☐	
Drainer le ou les vidanges auxiliaire(s) (au besoin)	☐	☐	☒	
Abasence d'alarme ou de supervision au panneau d'alarme	☒	☐	☐	

Légende : conforme (C), non-conforme (NC) ou non-applicable (N/A).

M - INFORMATION SUR LES SYSTÈMES

1. Nombre de salles de gicleur	3	7. Nombre de points bas	
2. Nombre de systèmes sous-eau	3	8. Nombre de pompe incendie	
3. Nombre de systèmes sous-air	5	9. Nb. de robinets pompier 2 1/2	
4. Nombre de systèmes préaction	1 fm-200	10. Nombre de chute a déchets	
5. Nombre de débit		11. Nombre de D.A.R.	3
6. Nombre de valves		12. Nombre de système au glycol	2

13. Autre information

14. Localisation des points bas

No système	Emplacement	No système	Emplacement
4	syst.air #1 (voir liste)		
5	syst.air #2 (voir liste)		
6	syst.air #3 (voir liste)		
7	syst.air #4 (voir liste)		
8	syst.air #5 (voir liste)		

15. Pompe d'appoint

Oui ☐ Non ☒

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)

Pression d'arrêt : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement : N/A

16. Pompe Incendie

Oui ☐ Non ☒ N/A

N/A

Bon fonctionnement sur essai de roulement : N/A

Pression au démarrage : lb/po2(kPa)

Pression statique : lb/po2(kPa)

Bon fonctionnement du clapet de décharge : N/A

Salle des pompes est propre et accessible : N/A

Gallonnage : Gpm Raccord : N/A

P - Liste des contrôles du système

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre pouce	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Valve Principale (SS R-22)	1	Waffer		6"	02-197	✓		
Valve #1 DAR (SS R-22)	1	Bfv	Vict	6"	02-195	✓		
Valve #2 DAR (SS R-22)	1	Bfv	Vict	6"	02-196	✓		
Valve Boyaux ouest (SS R-22)	1	Bfv	Global	4"	02-161	✓		
Débit Boyaux ouest	1	Wf	Vsr	4"	02-160	✓		
Valve Boyaux #2 (SS R-22)	1	Waffer	Pcvs	4"	02-208	✓		
Valve chute à linge (SS R-22)	1	Osy	Pts-c	2"	02-162	✓		
Débit gicleur chute à linge	1	Wf	Vsr	2"	02-163	✓		
Valve principale ouest (SS R-22)	1	Waffer	Pts-c	6"	02-207	✓		
Débit principale sect. ouest	1	Wf	Vsr	6"	02-179	✓		
Système sous-air #1 (vert) (R-22)	5							
Valve principale système	5	Bfv	Global	4"	02-206	✓		
Haute pression	5	Ps	Ps-40	1/2"	02-185	✓		
Basse pression	5	Ps	Ps-40	1/2"	02-186	✓		
Débit système air #1	5	Ps	Ps-10	1/2"	02-177	✓		
Valve isolement local 205	5	Waffer	Pts-c	2" 1/2	02-166	✓		
Valve isolement local 305	5	Waffer	Pts-c	2" 1/2	02-164	✓		
Valve isolement local 407	5	Waffer	Pts-c	2" 1/2	02-168	✓		
Système sous-air #2 (jaune) (R-22)	6							
Valve principale système	6	Bfv	Global	4"	02-204	✓		
Haute pression	6	Ps	Ps-40	1/2"	02-187	✓		
Basse pression	6	Ps	Ps-40	1/2"	02-188	✓		
Débit système air #2	6	Ps	Ps-10	1/2"	02-178	✓		
PIV Extérieur	1	PIV	Pcvs	-	02-198	✓		
Basse pression ligne d'air principale	1	Ps	Ps-40	1/2"	03-174	✓		
Valve isolement Boyaux vide tech.	1	Bfv	-	4"	02-209			

P - Liste des contrôles du système

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre pouce	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Système sous-air #3 (bleu) (R-22)	7							
Valve principale système	7	Bfv	Global	4"	02-205	✓		
Haute pression	7	Ps	Ps-40	1/2"	02-189	✓		
Basse pression	7	Ps	Ps-40	1/2"	02-190	✓		
Débit système air #3	7	Ps	Ps-10	1/2"	03-175	✓		
Système sous-air #4 (orange) (R-22)	8							
Valve principale système	8	Bfv	Global	4"	02-202	✓		
Haute pression	8	Ps	Ps-40	1/2"	02-191	✓		
Basse pression	8	Ps	Ps-40	1/2"	02-192	✓		
Débit système air #4	8	Ps	Ps-10	1/2"	02-176	✓		
Système sous-air #5 (mauve) (R-22)	9							
Valve principale système	9	Bfv	Global	4"	02-203	✓		
Haute pression	9	Ps	Ps-40	1/2"	02-193	✓		
Basse pression	9	Ps	Ps-40	1/2"	02-194	✓		
Débit système air #5	9	Ps	Ps-10	1/2"	02-173	✓		
Valve #1 DAR monastère	2	Bfv	Vict	4"	02-210	✓		
Valve #2 DAR monastère	2	Bfv	Vict	4"	02-210	✓		
Valve principale monastère	2	Waffer	Pts-c	4"	02-211	✓		
Salle Mécanique R-15	3							
Valve #1 DAR (R15)	3	Bfv	Vict	4"	03-129	✓		
Valve #2 DAR (R15)	3	Bfv	Vict	4"	03-129	✓		
Valve principale Boyaux Est (R15)	3	Waffer	Pcvs	4"	02-214	✓		
Débit principale Boyaux Est	3	Wf	Vsr	4"	02-213	✓		
Valve alimentation chaufferie (R15)	3	Bfv	Vict	4"	03-155	✓		
Débit principale alim. chaufferie	3	Wf	Vsr	4"	03-154	✓		
Valve principale syst.#3 Est (R15)	3	Bfv	Global	4"	03-157	✓		

P - Liste des contrôles du système

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre pouce	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Haute Pression	3	Ps	Ps-120	1/2"	03-158	✓		
Basse Pression	3	Ps	Ps-120	1/2"	03-159	✓		
Débit système sous-eau #3	3	Ps	Ps-10	1/2"	03-156	✓		
Valve Rdc-Est (R-15)	3	Bfv	Global	3"	03-152	✓		
Débit Rdc-Est	3	Wf	Vsr	3"	03-153	✓		
Valve Rdc-Nord (R-15)	3	Bfv	Vict	2"	03-161	✓		
Débit Rdc-Nord	3	Wf	Vsr	2"	03-162	✓		
Valve section colonne Est près R-31	3	Waffer	Pcvs	4"	02-184	✓		
Valve section colonne Est près R-12	3	Waffer	Pcvs	4"	02-183	✓		
Valve section colonne Est près R-11	3	Waffer	Pcvs	4"	02-182	✓		
Valve syst. glycol local R-13	3	Bfv	Vict	1" 1/4	03-160	✓		
Valve chute à linge local R-17	3	Bfv	Global	2"	02-171	✓		
Débit chute à linge	3	Wf	Vsr	2"	02-170	✓		
Contrôle niveau-1 (local-131)	3	Bfv	Vict	2"	03-163	✓		
Débit niveau-1	3	Wf	Vsr	2"	03-164	✓		
Contrôle niveau-2 (local-213)	3	Bfv	Vict	2"	03-150	✓		
Débit niveau-2	3	Wf	Vsr	2"	03-151	✓		
Contrôle niveau-3 (local-315)	3	Bfv	Vict	2"	03-403	✓		
Débit niveau-3	3	Wf	Vsr	2"	03-404	✓		
Contrôle niveau-4 (local-415)	3	Bfv	Vict	2"	03-401	✓		
Débit niveau-4	3	Wf	Vsr	2"	03-402	✓		
Contrôle niveau-5 (local-515)	3	Bfv	Vict	2"	03-399	✓		
Débit niveau-5	3	Wf	Vsr	2"	03-400	✓		
Contrôle niveau-6 (local-613)	3	Bfv	Flavico	2" 1/2	03-395	✓		
Débit niveau-6	3	Wf	Vsr	2" 1/2	03-396	✓		
Contrôle niveau-7 (cabanon)	3	Bfv	Global	2" 1/2	03-397	✓		
Débit niveau-7	3	Wf	Vsr	2" 1/2	03-398	✓		
Valve iso. cellule crise niveau-3	3	Bfv	Global	1" 1/4	03-410	✓		
Valve iso. unité intensive niveau-3	3	Bfv	Global	1" 1/2	03-412	✓		
Valve iso. unité interne niveau-3	3	Bfv	Global	1"1/2	03-414	✓		

P - Liste des contrôles du système (SUITE)

Identification	No système	Type	Modèle	Diamètre	Adresse	Signal reçu		Note
						Oui	Non	
Chaudière	4					☐	☐	
Valve principale système #4	4	Bfv	Global	4"	05-133	☒	☐	
Haute pression	4	Ps	Ps-120	1/2"	05-138	☒	☐	
Basse pression	4	Ps	Ps-120	1/2"	05-134	☒	☐	
Débit système sous-eau #4	4	Ps	Ps-10	1/2"	05-137	☒	☐	
Contrôle chaudière/atelier/bouilloire	4	Bfv	Global	4"	05-136	☒	☐	
Débit chaudière atelier/bouilloire	4	Wf	Wf	4"	05-135	☒	☐	
Contrôle secteur Nord-Ouest tunnel	4	Bfv	Global	2"	05-132	☒	☐	
Débit secteur Nord-Ouest tunnel	4	Wf	Vsr	2"	05-131	☒	☐	
Contrôle secteur Nord-Est tunnel	4	Bfv	Vict	2" 1/2	05-130	☒	☐	
Débit secteur Nord-Est tunnel	4	Wf	Vsr	2" 1/2	05-129	☒	☐	
Valve système glycol chaudière	4	Bfv	Vict	1" 1/2	05-128	☒	☐	
Contrôle niveau-2	4	Bfv	Vict	2"	05-127	☒	☐	
Débit niveau-2	4	Wf	Vsr	2"	05-126	☒	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	
						☐	☐	

Art. 53 54 et
 56 LADOP

Coordonnées			
No client Facturé à: Q002980	No de contrat: R3237	No Bon de livraison: 6026825	Date de la maintenance: 31/03/2025
Nombre du système(s) (distincte):	1 de 1	Code I: Non	Inspection Annuelle
No client Livré à: Q003755-4	Nom du commerce (Livré à): CENTRE HEBERGEMENT DU SACRE COEUR	Adresse: 1, AVENUE DU SACRE COEUR	Ville: QUÉBEC, QC
Code Postal: G1N 2W1	Nom du responsable: SABRINA GIRARD	Téléphone [REDACTED]	Email:

Notes

Description du risque				
Nom du risque protégé: CUISINE PRINCIPALE		Localisation du risque:		Note particulière sur le risque:
Hotte(s):				
Nom	Longueur	Type	Matériaux	Filtres
H1	238	Ilot double	Acier Inoxydable	V bank
Collet(s):				
Hotte		Quantité	Dimension (po)	
H1		2	24x24	


Description du système de suppression incendie pour cuisine commerciale						
Manufacturier: SafetyFirst						
Configuration du système: SF/A 3x3 GALLONS		Localisation physique du système: CUISINE		Model de tête de contrôle: RÉGULATEUR		
Micro util.: 3	sur 3	Détection (type): Mécanique		Pointage: 27 /	33	
Panneau de relâche:		Manufacturier		Model		Localisation
Valve à gaz:		Type Mécanique		Diamètre 1 "		DROITE DU SYSTÈME
Lignes de détection:						
Ligne/Zone	Quantité de fusible/détecteur		Date		Température (°F)	
1	4		2025		360	
Cylindres:						
Type	Localisation	Année fabrication	Année dernier test	No série	Type cartouche	Poids cartouche (oz)
3 GALLONS	Automan	2010	2022		DOUBLE TANK	117 1/4
3 GALLONS	Caisson Double	2010	2022			
3 GALLONS	Caisson Double	2010	2022			

Test et résultats	
Le système rencontre le standard ULC-ORD-1254.6: Oui	Le système est conforme au manuel du fabricant: Oui
Neutraliser, enlever et nettoyer le(s) cylindre(s):	Oui
Vérifier le raccordement au cycle autonettoyant de la hotte:	N/A
Est-ce que le(s) cylindre(s) est(sont) T.C.?:	N/A
Vérifier la distance et l'opération de câblage:	Oui
Check the pressure gauge pressure.:	N/A
Pressuriser la ligne d'activation haute pression du système:	N/A
Vérifier si les appareils sont protégés de façon adéquate:	Oui
Rallumer les pilotes:	Oui
Activer la détection automatique par le dernier maillon fusible:	Oui

Peser et ou activer la(les) cartouche(s):	Oui
Activer la station manuelle et s'assurer qu'elle soit accessible et nettoyée.:	Oui
Remplacer la cartouche:	N/A
Tester le raccordement à l'alarme du bâtiment:	Oui
Inspecter le(s) réseau(x) de distribution contre tout obstruction et s'assurer que tout est bien fixé:	Oui
Nettoyer les lances et les supports à fusible:	Oui
Remplacer les maillons fusibles:	Oui
Vérifier le(s) disque(s) de sécurité ainsi que le(s) niveau(x) de liquide du(des) cylindre(s) non pressurisé(s):	Oui
Nettoyer les détecteurs de chaleur:	N/A
Activer la coupure d'alimentation en gaz (mécanique):	Oui
Réarmement du relais:	N/A
Activer la coupure d'alimentation en gaz (électrique):	N/A
Débarrer et remettre le système en fonction:	Oui
Activer la coupure d'alimentation électrique:	Oui
Informer le personnel de cuisine sur le fonctionnement du système:	Oui
Commentaire(s) et recommandation(s):	RECOMMANDATIONS : DEVRAIT FAIRE RETIRER LES GICLEURS DANS LA HOTTE. LE CÂBLE DE LA STATION MANUELLE EST DIFFICILE À DÉCLENCHER, IL FAUT PASSER UN NOUVEAU CÂBLE ET SOLIDIFIER LA STATION MANUELLE.

Signatures

Nom du technicien: [REDACTED]	Nom du responsable:
Prévention Incendie SAFETY FIRST inc est autorisée à remettre une copie du rapport de maintenance et une copie du certificat aux assureurs du client.:	
Initiales:	Signature d'une personne autorisée:

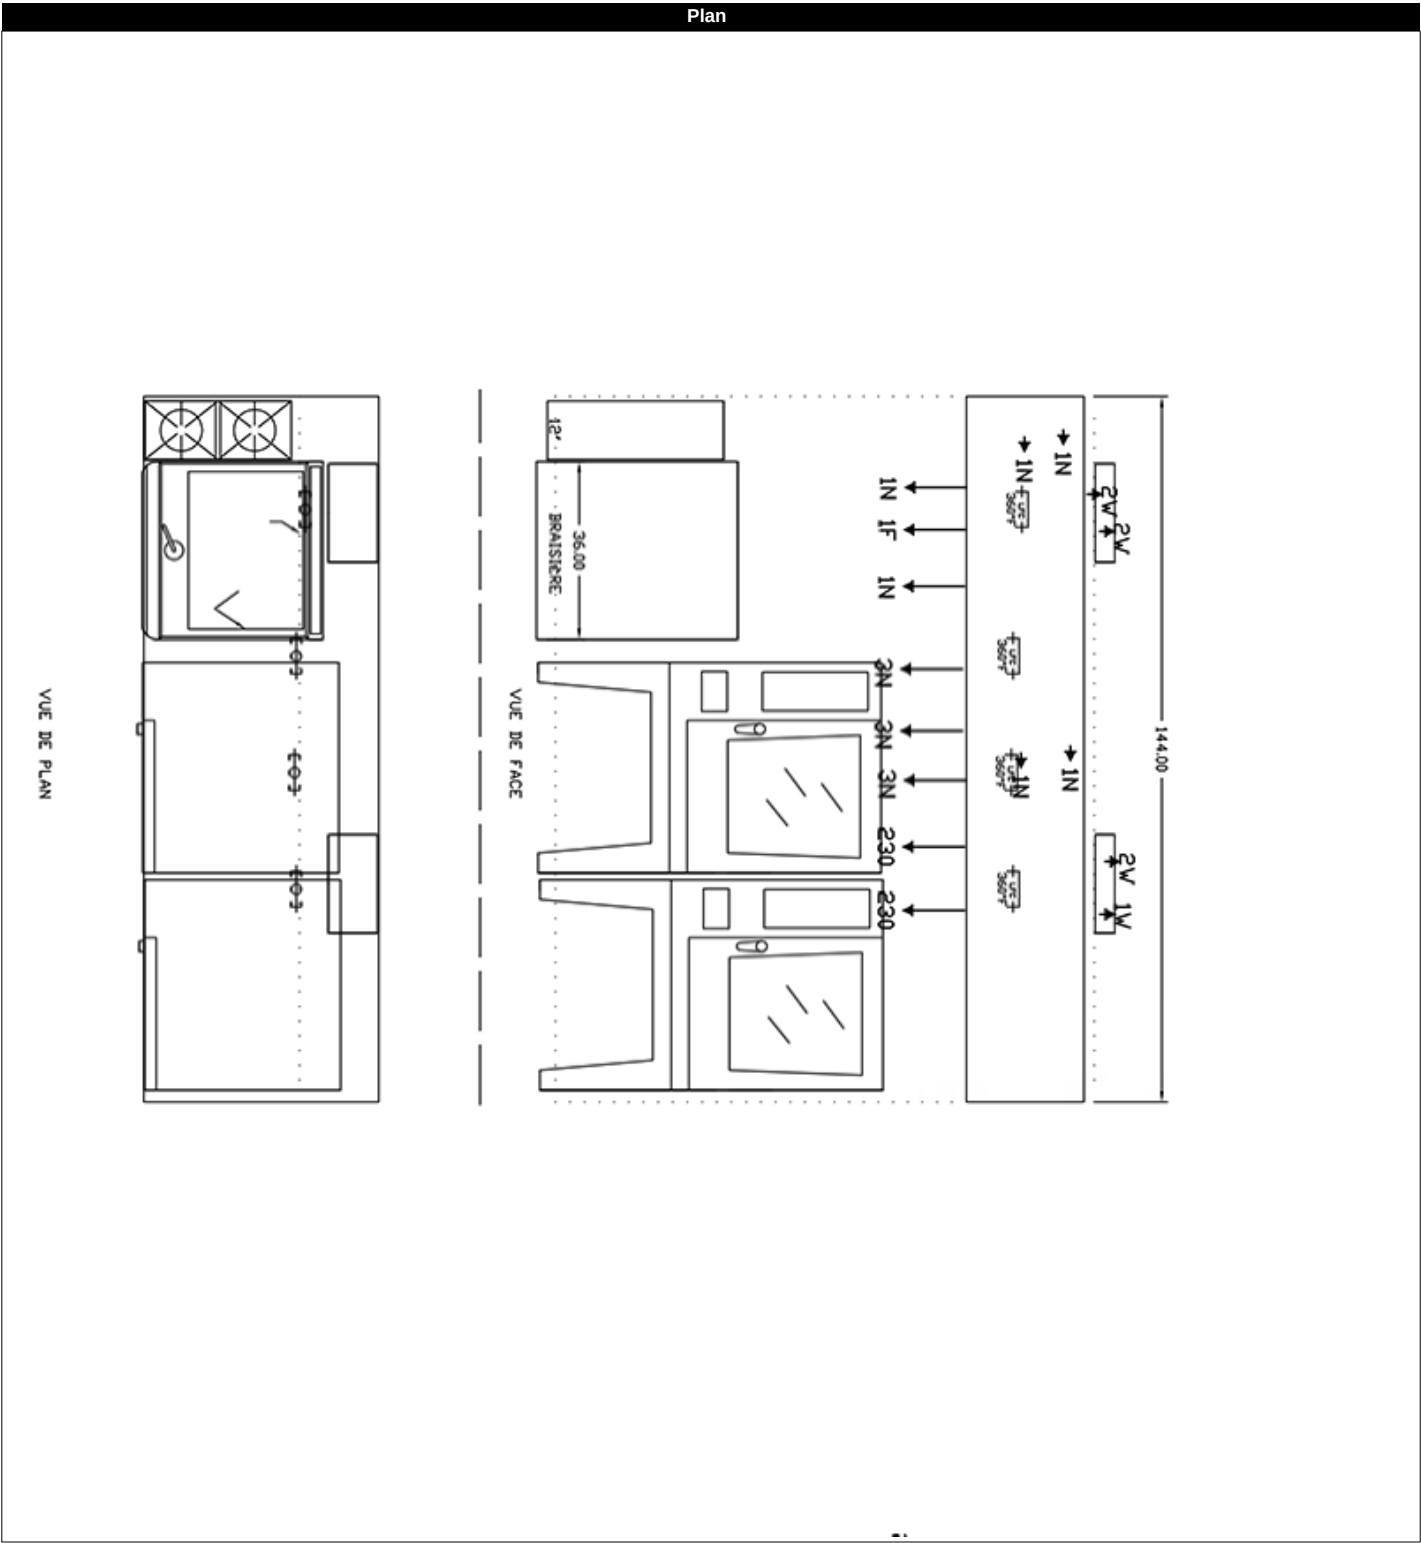


Art. 53 54
 et 56
 LADOP

Coordonnées				
No client Facturé à: Q002980	No de contrat: R3237	No Bon de livraison: 6045045	Date de la maintenance: 16/09/2025	
Nombre du système(s) (distincte):	1 de 1	Code I: Non	Inspection Semi-Annuelle	
No client Livré à: Q003755-4	Nom du commerce (Livré à): CENTRE HEBERGEMENT DU SACRE COEUR	Adresse: 1, AVENUE DU SACRE COEUR	Ville: QUÉBEC, QC	
Code Postal: G1N 2W1	Nom du responsable: MYRA GAGNON	Téléphone [REDACTED]	Email:	
Notes				
Description du risque				
Nom du risque protégé: CUISINE PRINCIPALE		Localisation du risque:		Note particulière sur le risque:
Hotte(s):				
Nom	Longueur	Type	Matériaux	Filtres
H1	238	Ilot double	Acier Inoxydable	V bank
Collet(s):				
Hotte		Quantité	Dimension (po)	
H1		2	24x24	
Description du système de suppression incendie pour cuisine commerciale				
Manufacturier: SafetyFirst				
Configuration du système: SF/A 3x3 GALLONS		Localisation physique du système: CUISINE		Model de tête de contrôle: RÉGULATEUR
Micro util.: 3	sur 3	Détection (type): Mécanique		Pointage: 20 / 33
Panneau de relâche:		Manufacturier		Model
Valve à gaz:		Type Mécanique		Diamètre 1 "
Lignes de détection:				
Ligne/Zone	Quantité de fusible/détecteur	Date	Température (°F)	
1	4	2025	360	
Cylindres:				
Type	Localisation	Année fabrication	Année dernier test	Proch. Hydro Test
3 GALLONS	Automan	2010	2022	
3 GALLONS	Caisson Double	2010	2022	
3 GALLONS	Caisson Double	2010	2022	
No série				
Type cartouche				
Poids cartouche (oz)				
DOUBLE TANK				
117 1/4				
Test et résultats				
Le système rencontre le standard ULC-ORD-1254.6: Oui			Le système est conforme au manuel du fabricant: Oui	
Neutraliser, enlever et nettoyer le(s) cylindre(s):				Oui
Vérifier le raccordement au cycle autonettoyant de la hotte:				N/A
Est-ce que le(s) cylindre(s) est(sont) T.C.?:				N/A
Vérifier la distance et l'opération de câblage:				Oui
Vérifier la pression du manomètre.:				N/A
Pressuriser la ligne d'activation haute pression du système:				N/A
Vérifier si les appareils sont protégés de façon adéquate:				Oui
Rallumer les pilotes:				Oui
Activer la détection automatique par le dernier maillon fusible:				Oui

Peser et ou activer la(les) cartouche(s):	Oui
Activer la station manuelle et s'assurer qu'elle soit accessible et nettoyée.:	Oui
Remplacer la cartouche:	N/A
Tester le raccordement à l'alarme du bâtiment:	Oui
Inspecter le(s) réseau(x) de distribution contre tout obstruction et s'assurer que tout est bien fixé:	Oui
Nettoyer les lances et les supports à fusible:	Oui
Remplacer les maillons fusibles:	Oui
Vérifier le(s) disque(s) de sécurité ainsi que le(s) niveau(x) de liquide du(des) cylindre(s) non pressurisé(s):	Oui
Nettoyer les détecteurs de chaleur:	N/A
Activer la coupure d'alimentation en gaz (mécanique):	Oui
Réarmement du relais:	N/A
Activer la coupure d'alimentation en gaz (électrique):	N/A
Débarrer et remettre le système en fonction:	Oui
Activer la coupure d'alimentation électrique:	Oui
Informer le personnel de cuisine sur le fonctionnement du système:	Oui
Commentaire(s) et recommandation(s):	RECOMMANDATIONS : DEVRAIT FAIRE RETIRER LES GICLEURS DANS LA HOTTE.

Signatures

Nom du technicien: [REDACTED]	Nom du responsable:
Prévention Incendie SAFETY FIRST inc est autorisée à remettre une copie du rapport de maintenance et une copie du certificat aux assureurs du client.:	
Initiales:	Signature d'une personne autorisée:

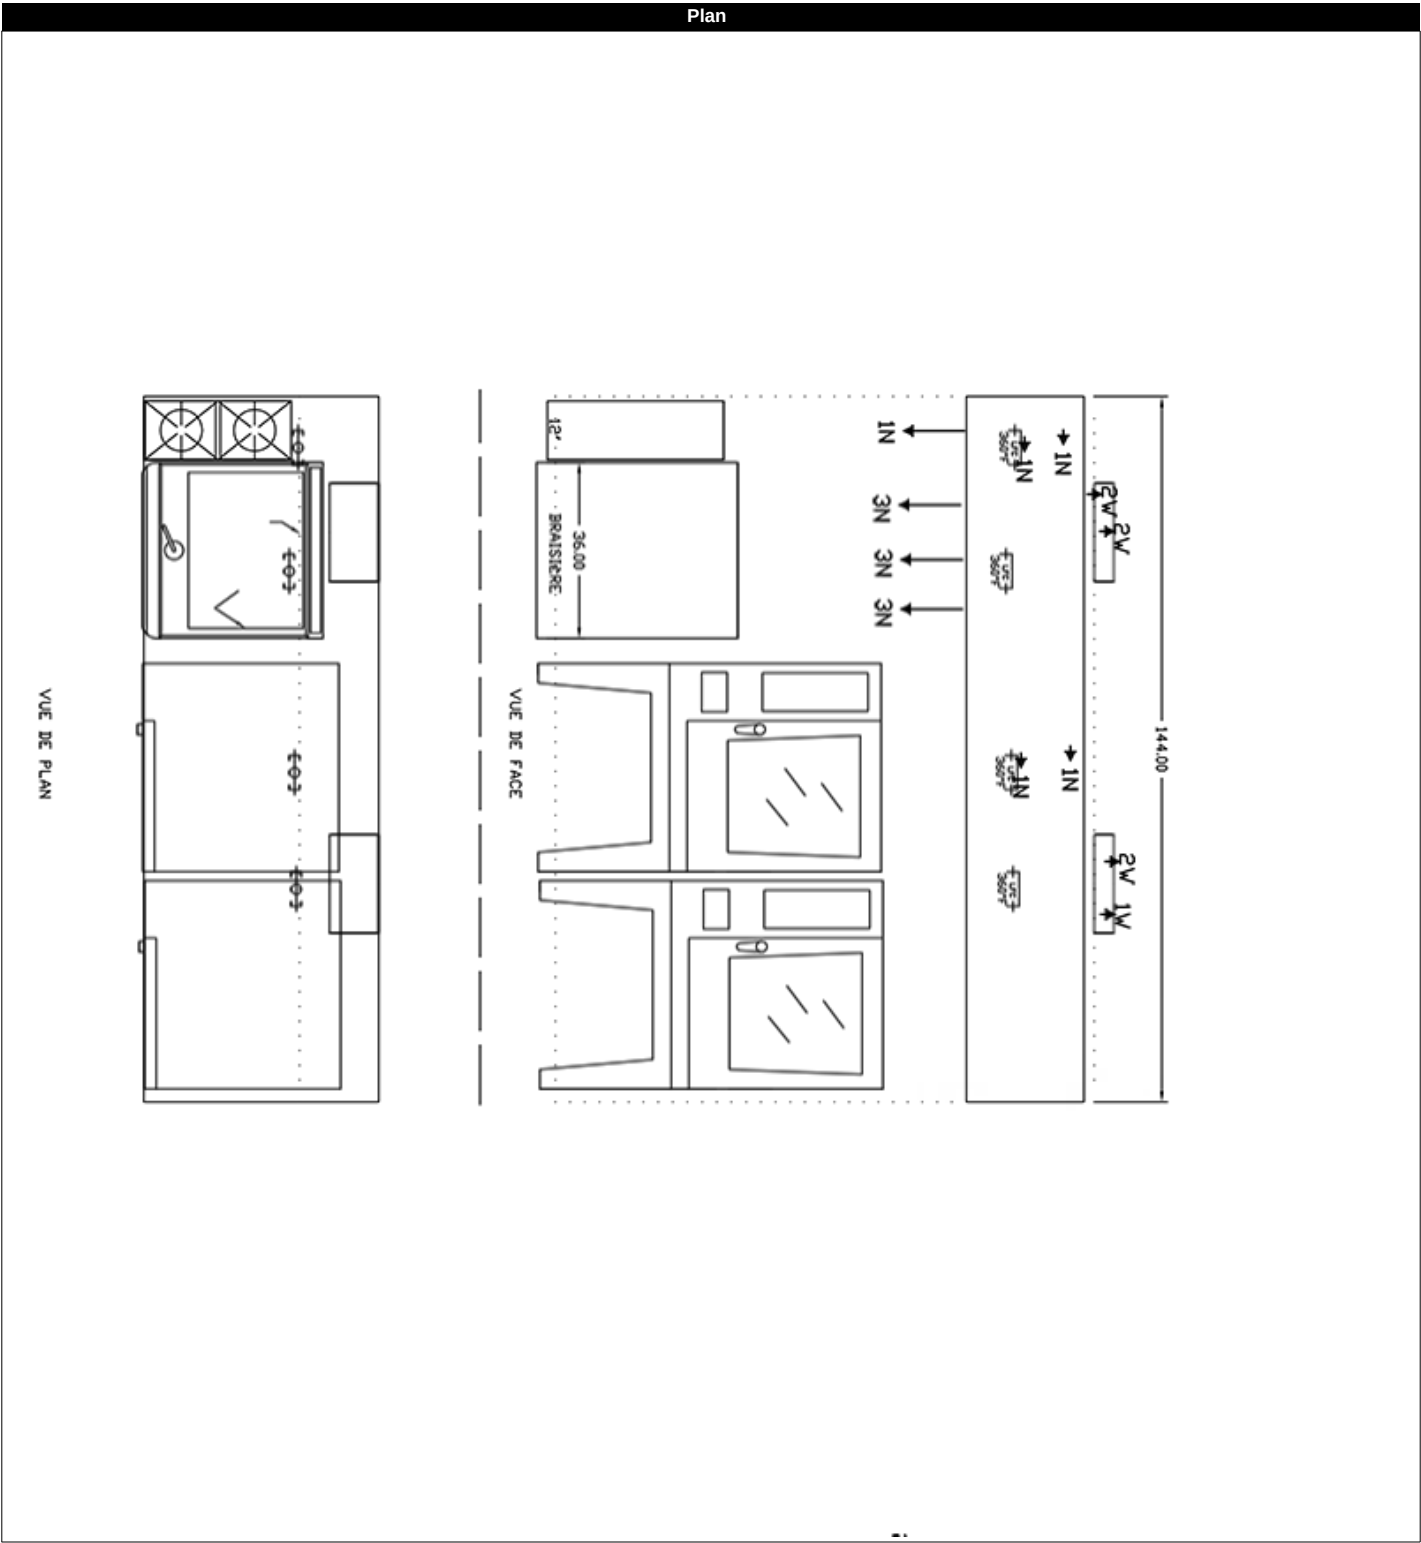

Images annexes



**Rapport d'essai et d'inspection
des réseaux de canalisations**
INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Projet :

Adresse :

C.H. SACRÉ-CŒUR

1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC

Date: **5/9/2025**

Technicien :

Essais					Résultats	Observations
Classe du système:	Combiné au système de gicleurs	Sortie 2½"	Cabinet et boyau 1½"	Cabinet, boyaux 1½" et sortie 2½"		
	Combiné	Classe I	Classe II	Classe III	III	
Pression de l'alimentation en eau: (lb/po2)					85	
Pression du système: (lb/po2)					85	
Pression statique à l'étage supérieur: (lb/po2)					55	
Pression résiduelle à l'étage supérieur: (lb/po2) (CNB90: 65lb/po2, CNB95: 100lb/po2)					S-O	
Longueur et diamètre des Boyaux au cabinet					75'-100'	
La pression d'entrée aux dispositifs de réduction de pression est ajustée à: (lb/po2)					S-O	
La pression de sortie aux dispositifs de réduction de pression est ajustée à: (lb/po2)					S-O	

Robinet	Résultats	Observations
Les robinets de contrôles sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont bien visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Proposition :

Date: **5/9/2025**

Général	Résultats	Observations
Le système est en service ?	OUI	
Le système est équipé d'interrupteur de débit ?	OUI	
Le système est équipé d'un clapet de retenue d'alarme ?	NON	
L'alarme extérieure du bâtiment fonctionne ?	S-O	
Le système semble étanche et sans coulisse ?	OUI	
Les bornes-fontaines murales sont verrouillées, visibles et identifiées ?	S-O	
Les étiquettes de signalisation sont bien en place ?	OUI	
Le panneau d'alarme est en état normal ?	OUI	
Essai de démarrage de la pompe est-il fait ?	S-O	
Les appareils d'alarme ont été activés?	OUI	
Essai de débit au 5 ans fait ? Date de l'essai :	2023	



Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 1 - VERT**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **LOCAL 407 OUEST**

Endroit prptégé: **ZONE 1 - AILE OUEST**

Date: **2/10/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2020	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 30	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	283	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide	TYCO	ACC-1		1/2"	2003	
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	N-A	NOTE 1	OUI
Avec D.O.R.						

Robins et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 1
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 2/10/2025

Tuyauterie		Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?		OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?		OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?		OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?		OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?		OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?		OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?		OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?		NON	
Emplacements des points bas:			
1 X LOCAL SS-7C OUEST DANS LOCAL R-7 OUEST (1")			

Raccordement au service d'incendie (siamoise)		Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?		OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?		OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?		OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?		OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?		OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?		OUI	

Têtes de gicleurs		Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?		OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?		OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?		NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?		OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?		OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?		OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?		OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?		OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?		OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?		OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?		OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Date: 2/10/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 2 - JAUNE**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **LOCAL 523 OUEST CABANON ASCENSEUR 1 - 2**

Endroit prptégé: **ZONE 2 - AILE OUEST**

Date: **2/10/2025**

Technicien : **[REDACTED]**

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 30	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	287	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide	TYCO	ACC-1		1/2"	2003	
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 1
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Date: 2/10/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X VIDE SANITAIRE PAR TOILETTE DU FOND LOCAL R-22 (1")		
1 X LOCAL R-16 OUEST À CÔTÉ MACHINE DISTRIBUTRICE (1/2")		
1 X LOCAL R-19 OUEST, SALLE À MANGER (1/2") (NON LOCALISÉ)		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	NON	NOTE 4
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Date: 2/10/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 3 - BLEU**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **EN HAUT DE L'ESCALIER PAR LOCAL 530 OUEST**

Endroit prptégé: **ZONE 1 - AILE COMMUNAUTÉ**

Date: **2/10/2025**

Technicien : **[REDACTED]**

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 29	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	76	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide	TYCO	ACC-1		1/2"	2007	
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 5
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 2/10/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X MUR EN FACE DU FRIGIDAIRE #2 46 OUEST (3/4")		
1 X SOUS-SOL DU 46 OUEST ESCALIER DERRIÈRE LA CUISINE (1")		
1 X LOCAL R-38 OUEST, SALLE DE PAUSE (1/2")		
1 X LOCAL R-40 OUEST MAGASIN #2 (3/4")		
1 X LOCAL R-46 OUEST, PRÈS DE L'ARMOIRE #6 (BUREAU PETITE PORTE) (1/2")		
1 X COULOIR PRÈS SORTIE R-4 (COMMUNAUTÉ) (1/2")		
1 X LOCAL R-6 (COMMUNAUTÉ) (1/2")		
1 X LOCAL R-2, SALLE ÉLECTRIQUE (COMMUNAUTÉ) (1/2")		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Date: 2/10/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 4 - ORANGE**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **CLOCHER DU GRENIER COMMUNAUTÉ (PORTE 436)**

Endroit prptégé: **ZONE 1 - AILE OUEST**

Date: **2/10/2025**

Technicien : **[REDACTED]**

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 29	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	45	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide						
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 5
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 2/10/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X CORRIDOR RDC PRÈS DE R-7 (COMMUNAUTÉ)		
1 X SOUS-SOL ENTRÉE D'EAU (COMMUNAUTÉ) (3/4")		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	1944 NON	NOTE 6
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	1944 NON	NOTE 6

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION SEMI-ANNUELLE

Proposition :

Date: 2/10/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 5 - MAUVE**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **3e ÉTAGE DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ AU DESSUS CHAMBRE 51**

Endroit prptégé: **ZONE 5 - AILE COMMUNAUTAIRE**

Date: **2/10/2025**

Technicien : **[REDACTED]**

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	70	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 29	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	67	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide						
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	70	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 5
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 2/10/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X CORRIDOR PRÈS DE R-7 (COMMUNAUTÉ)		
1 X SOUS-SOL LOCAL PEINTURE (COMMUNAUTÉ) (1.5")		
1 X SOUS-SOL, DESSOUS ESCALIER (COMMUNAUTÉ) (1/2")		
1 X RC LOCAL R-26 COIN GAUCHE GARDE-ROBE (COMMUNAUTÉ) (3/4")		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	1944 NON	NOTE 6
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	1944 NON	NOTE 6

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION ANNUELLE

Proposition :

Date: 2/10/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	



OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

SYSTÈME SOUS AIR

PROP: 0

PROJET: C.H. SACRÉ-CŒUR

NOTE CONTACT SUR PLACE: MICHEL 418-564-5068

NOTE 1 LE SYSTÈME N'A PAS ÉTÉ DÉCLENCHÉ CAR IL Y AVAIT UN RISQUE QU'IL SE BLOQUE. UNE INSPECTION INTERNE À ÉTÉ EFFECTUÉ.

NOTE 2 DÉFICIENCES: IL N'Y A PAS DE CLÉ DE GICLEUR DANS LE CABINET DE RECHANGE.

NOTE 3 DÉFICIENCES: LA FICHE SIGNALÉTIQUE N'EST PAS INSTALLÉ SUR LE SUR LE SYSTÈME.

NOTE 4 DÉFICIENCES: DES PANIERS DE PROTECTION NON APPROUVÉ POUR L'INCENDIE, ILS DEVRONT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PANIERS APPROUVÉS.

NOTE 5 DÉFICIENCES: LES SYSTÈMES SEMBLANT BOUCHÉS, J'AI RETROUVÉ UNE GRANDE QUANTITÉ DE RÉSIDUS DANS LES TUYAUX.

NOTE 6 DÉFICIENCES: LES TÊTES DE GICLEURS DANS LE MONASTÈRE ET L'ENTRETOIT DATE DE 1944, UN ÉCHANTILLONNAGE DES TÊTES DEVRA ÊTRE FAIT.

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 1 - VERT**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **LOCAL 407 OUEST**

Endroit prptégé: **ZONE 1 - AILE OUEST**

Date: **5/9/2025**

Technicien : **[REDACTED]**

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2025	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 30	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	283	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide	TYCO	ACC-1		1/2"	2003	
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	N-A	NOTE 1	OUI
Avec D.O.R.						

Robins et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 1
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Date: 5/9/2025

Tuyauterie		Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?		OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?		OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?		OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?		OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?		OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?		OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?		OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?		NON	
Emplacements des points bas:			
1 X LOCAL SS-7C OUEST DANS LOCAL R-7 OUEST (1")			

Raccordement au service d'incendie (siamoise)		Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?		OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?		OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?		OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?		OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?		OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?		OUI	

Têtes de gicleurs		Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?		OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?		OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?		NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?		OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?		OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?		OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?		OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?		OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?		OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?		OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?		OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Date: 5/9/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 2 - JAUNE**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **LOCAL 523 OUEST CABANON ASCENSEUR 1 - 2**

Endroit prptégé: **ZONE 2 - AILE OUEST**

Date: **5/9/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 30	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	287	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide	TYCO	ACC-1		1/2"	2003	
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 1
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 5/9/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X VIDE SANITAIRE PAR TOILETTE DU FOND LOCAL R-22 (1")		
1 X LOCAL R-16 OUEST À CÔTÉ MACHINE DISTRIBUTRICE (1/2")		
1 X LOCAL R-19 OUEST, SALLE À MANGER (1/2") (NON LOCALISÉ)		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	NON	NOTE 4
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Date: 5/9/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 3 - BLEU**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **EN HAUT DE L'ESCALIER PAR LOCAL 530 OUEST**

Endroit prptégé: **ZONE 1 - AILE COMMUNAUTÉ**

Date: **5/9/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 29	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim.	Année	
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1	76	4"	2011	
Dispositif d'ouverture rapide	TYCO	ACC-1	NOTE 7	1/2"	2007	
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 5
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 5/9/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X MUR EN FACE DU FRIGIDAIRE #2 46 OUEST (3/4")		
1 X SOUS-SOL DU 46 OUEST ESCALIER DERRIÈRE LA CUISINE (1")		
1 X LOCAL R-38 OUEST, SALLE DE PAUSE (1/2")		
1 X LOCAL R-40 OUEST MAGASIN #2 (3/4")		
1 X LOCAL R-46 OUEST, PRÈS DE L'ARMOIRE #6 (BUREAU PETITE PORTE) (1/2")		
1 X COULOIR PRÈS SORTIE R-4 (COMMUNAUTÉ) (1/2")		
1 X LOCAL R-6 (COMMUNAUTÉ) (1/2")		
1 X LOCAL R-2, SALLE ÉLECTRIQUE (COMMUNAUTÉ) (1/2")		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Date: 5/9/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 4 - ORANGE**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **CLOCHER DU GRENIER COMMUNAUTÉ (PORTE 436)**

Endroit prptégé: **ZONE 1 - AILE OUEST**

Date: **5/9/2025**

Technicien : **FREDERIC BEAUDOIN**

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	65	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 29	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Marque	Modèle		Numéro de série	Dim.	Année
Robinet différentiel	TYCO	DPV-1		45	4"	2011
Dispositif d'ouverture rapide						
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	65	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robinet et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 5
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 5/9/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X CORRIDOR RDC PRÈS DE R-7 (COMMUNAUTÉ)		
1 X SOUS-SOL ENTRÉE D'EAU (COMMUNAUTÉ) (3/4")		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Date: 5/9/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **ZONE 5 - MAUVE**

Emplacement du système : **SALLE DE BAIN, R-22 OUEST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Emplacement du robinet d'essai: **3e ÉTAGE DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ AU DESSUS CHAMBRE 51**

Endroit prptégé: **ZONE 5 - AILE COMMUNAUTAIRE**

Date: **5/9/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

Téléphone : **418-529-0931 #26480**

Essais	Résultats	Observations
Pression d'air: (lb/po2)	40	
Pression au dispositif d'ouverture rapide: (lb/po2)	40	
Pression de l'eau : (lb/po2)	70	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	REFOULE	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2023	OUI	
Les alarmes intérieures du bâtiment fonctionnent ?	OUI	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
Les alarmes extérieures du bâtiment sont bien identifiées ?	S-O	
Les alarmes extérieures du bâtiment fonctionnent ?	S-O	
L'alarme de basse pression a été vérifiée ? (lb/po2) 29	OUI	
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est revenu en état normal ?	OUI	

Table de déclenchement						
	Robinet différentiel	Dispositif d'ouverture rapide	Marque	Modèle	Numéro de série	Dim. Année
			TYCO	DPV-1	67	4" 2011
	Temps pour déclenchement (min. / sec.)	Pression d'eau (lb/po2)	Pressio n d'air (lb/po2)	Point de déclenchement (lb/po2)	Temps pour l'eau à atteindre la sortie (min. / sec.)	L'alarme a fonctionnée correctement
Sans D.O.R.	S-O	70	40	NOTE 1	S-O	OUI
Avec D.O.R.						

Robins et valves	Résultats	Observations
Tous les robinets sont identifiés avec des étiquettes ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne position ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les interrupteurs anti-vandalisme semblent fonctionnels ?	S-O	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Les robinets ont été fermés et retournés à leurs positions ouvertes ?	OUI	
Le robinet avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, et nombre de tours	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'intérieur du robinet différentiel est en bonne condition ?	OUI	
Le joint d'étanchéité du couvercle est en bonne condition ?	OUI	
Le siège est en bonne condition ?	OUI	
Robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet de contrôle ouvert partiellement ?	NON	
Le robinet différentiel mis à l'essai avec le robinet ouvert complètement ?	NON	NOTE 5
(Lorsqu'il y a eu des changements au système, ou aux 3 années)	S-O	

Proposition :

Date: 5/9/2025

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	
Une inspection interne de la tuyauterie est recommandée ?	OUI	
Tous les points bas ont été purgés ?	NON	
Emplacements des points bas:		
1 X CORRIDOR PRÈS DE R-7 (COMMUNAUTÉ)		
1 X SOUS-SOL LOCAL PEINTURE (COMMUNAUTÉ) (1.5")		
1 X SOUS-SOL, DESSOUS ESCALIER (COMMUNAUTÉ) (1/2")		
1 X RC LOCAL R-26 COIN GAUCHE GARDE-ROBE (COMMUNAUTÉ) (3/4")		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	NON	NOTE 2
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes à réponse rapide semblent moins de 20 ans et haute température de 5 ans ?	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs à sec INSPECTION TRIMESTRIELLE

Proposition :

Date: 5/9/2025

Général	Résultats	Observations
Le système est en opération ?	OUI	
L'alarme de basse température fonctionne ?	S-O	
Compresseur: Départ : REGUL. (lb/po2) Le niveau d'huile est plein ?	OUI	
RK COMPRESSORS (LOCAL SS-7B OUEST) Le réservoir a été vidé de son eau ?	OUI	
Capacité 80 gal.		
Moteur HP Volts amp.		
Les dispositifs de maintien d'air automatique fonctionnent ?	OUI	
Plaque de spécification hydraulique installée ?, Densité: S/O GUSPM / pi ca	NON	NOTE 3
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement correctement chauffé ?	OUI	
Les filtres, les tamis et les ouvertures restreintes sont inspectés et nettoyés aux 5 ans:	S-O	
Date de la dernière inspection:		
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	NON	



OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

SYSTÈME SOUS AIR

PROP: 0

PROJET: C.H. SACRÉ-CŒUR

NOTE CONTACT SUR PLACE:

NOTE 1 LE SYSTÈME N'A PAS ÉTÉ DÉCLENCHÉ CAR IL Y AVAIT UN RISQUE QU'IL SE BLOQUE. UNE INSPECTION INTERNE À ÉTÉ EFFECTUÉE. (08-2024)

NOTE 2 DÉFICIENCES: IL N'Y A PAS DE CLÉ DE GICLEUR DANS LE CABINET DE RECHANGE.

NOTE 3 DÉFICIENCES: LA FICHE SIGNALÉTIQUE N'EST PAS INSTALLÉ SUR LE SUR LE SYSTÈME.

NOTE 4 DÉFICIENCES: DES PANIERS DE PROTECTION NON APOUVÉ POUR L'INCENDIE, ILS DEVRONT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PANIERS APPROUVÉS.

NOTE 5 DÉFICIENCES: LES SYSTÈMES SEMBLANT BOUCHÉS, J'AI RETROUVÉ UNE GRANDE QUANTITÉ DE RÉSIDUS DANS LES TUYAUX.

NOTE 7 L'ACCELERATEUR DU SYSTEME #3 EST PRESENTEMENT FERME CAR IL A CAUSER DES FAUX DECLANCHEMENT. LE CLIENT AIMERAIT QU'IL SOIT REMPLACER

Prop:

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **SECTEUR NORD-EST**

Emplacement du système : **SALLE MÉCANIQUE R-15 EST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Marque / Modèle du système: **ASTRA MOD. E 4"**

Endroit protégé: **SECTEUR NORD ET EST**

Date: **2/10/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

418-529-0931 #26480

Année : **2003**

Essais	Résultats	Observations
Pression de l'alimentation en eau: (lb/po2)	70	
Pression du système : (lb/po2)	135	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	60	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
L'alarme intérieure du bâtiment fonctionne ?	OUI	
L'alarme extérieure du bâtiment fonctionne ?	S-O	
Pression lors de l'écoulement du robinet d'essai de l'inspecteur : (lb/po2)	40	6e étages
Emplacement : TEST AND DRAIN SUR CHAQUE ÉTAGES		
Délai du clapet de retenue (min/sec)	S-O	
Délai de l'interrupteur de pression: (min/sec)	S-O	
Délai du déclenchement de l'interrupteur de débit: (min/sec)	S-O	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ?	OUI	
L'interrupteur de basse pression a été vérifié ?	OUI	
Essai du démarrage automatique de la pompe incendie:	S-O	
Essai de démarrage manuel de la pompe incendie :	S-O	
Essai de démarrage de la pompe de surpression: Départ : (lb/po2) PSI 125	OUI	
Modèle : ALBANY HP : 1/2 Volts : 115/230 amp. : 4.1/8.2		
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Robins et valves	Résultats	Observations
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Le robinet du système antigel est verrouillé ouvert ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne condition ?	OUI	
La soupape de surpression est en bonne condition ?	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'extérieur du clapet de retenue d'alarme est en bonne condition ?	OUI	
Les robinets sont dans la bonne position ?	OUI	
Le robinet d'essai d'alarme est fermé ?	OUI	
Le robinet de contrôle a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Le robinet d'entrée d'eau a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Le robinet vanne avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, Nombre de tours	S-O	

Prop:

Date: 2/10/2025

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	OUI	
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	

Général	Résultats	Observations
L'usage principal et les risques sont les mêmes qu'à la dernière inspection ?	OUI	
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	OUI	
Les systèmes sont tous en service ?	OUI	
Les étiquettes de signalisation sont en place ?	OUI	
La solution antigel a été vérifiée pour fournir le bon degré de protection ?, Temp.	OUI	-42
L'alarme extérieure est bien identifiée ?	S-O	
La chambre de gicleur est-elle identifiée ?	NON	
Plaque de signalisation hydraulique installée ? Densité:	NON	NOTE 1
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement chauffé correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est en état normal ?	OUI	

Prop:

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **CHAUFFERIE**

Emplacement du système : **ATELIER ET BOUILLOIRE**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Marque / Modèle du système: **ASTRA MOD. E 4"**

Endroit protégé: **ATELIER, BOUILLOIRE ET CHAUFFERIE**

Date: **2/10/2025**

Technicien : **[REDACTED]**

418-529-0931 #26480

Année : **2002**

Essais	Résultats	Observations
Pression de l'alimentation en eau: (lb/po2)	65	
Pression du système : (lb/po2)	115	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	40	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
L'alarme intérieure du bâtiment fonctionne ?	OUI	
L'alarme extérieure du bâtiment fonctionne ?	OUI	
Pression lors de l'écoulement du robinet d'essai de l'inspecteur : (lb/po2)	65	
Emplacement : TEST AND DRAIN AU SYSTÈME, 2e ÉTAGE ET TUNNEL		
Délai du clapet de retenue (min/sec)	S-O	
Délai de l'interrupteur de pression: (min/sec)	S-O	
Délai du déclenchement de l'interrupteur de débit: (min/sec)	S-O	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2020	OUI	
L'interrupteur de basse pression a été vérifié ?	OUI	
Essai du démarrage automatique de la pompe incendie:	S-O	
Essai de démarrage manuel de la pompe incendie :	S-O	
Essai de démarrage de la pompe de surpression: Départ : (lb/po2) PSI 105		
Modèle : ALBANY HP : 1/2 Volts : 115/230 amp. : 4.1/8.2		
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccordements sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccordements sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Robins et valves	Résultats	Observations
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Le robinet du système antigel est verrouillé ouvert ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne condition ?	OUI	
La soupape de surpression est en bonne condition ?	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'extérieur du clapet de retenue d'alarme est en bonne condition ?	OUI	
Les robinets sont dans la bonne position ?	OUI	
Le robinet d'essai d'alarme est fermé ?	OUI	
Le robinet de contrôle a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Le robinet d'entrée d'eau a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Le robinet vanne avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, Nombre de tours	S-O	

Prop:

Date: 2/10/2025

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	OUI	
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	

Général	Résultats	Observations
L'usage principal et les risques sont les mêmes qu'à la dernière inspection ?	OUI	
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	S-O	
Les systèmes sont tous en service ?	OUI	
Les étiquettes de signalisation sont en place ?	OUI	
La solution antigel a été vérifiée pour fournir le bon degré de protection ?, Temp.	OUI	-45
L'alarme extérieure est bien identifiée ?	OUI	
La chambre de gicleur est-elle identifiée ?	S-O	
Plaque de signalisation hydraulique installée ? Densité:	NON	NOTE1
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement chauffé correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est en état normal ?	OUI	



OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

SYSTÈME SOUS EAU

PROP: 0

PROJET: C.H. SACRÉ-CŒUR

NOTE POUR CENTRALE : APPELER L'HOPITAL GÉNÉRAL : 418-529-0931 #26480

NOTE 1 DÉFICIENCES: IL N'Y A PAS DE FICHE SIGNALÉTIQUE SUR LE SYSTÈME, CETTE AFFICHE DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE SYSTÈME.

NOTE 2 DÉFICIENCES: LES MANOMÈTRES ONT PLUS DE CINQ ANS, ILS DEVRONT ÊTRE REMPLACÉS.

Proposition :

Projet :

Adresse :

Central de surveillance:

C.H. SACRÉ-CŒUR
1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC
MICROTECH

Date : 2/10/2025

Technicien : XXXXXXXXXX

Emplacements	Dispositif	Zone	Activation d'alarme confirmée	Observations
SALLE DE GICLÉUR R-22 OUEST :				
VALVE SYSTÈME #1 - VERT	GR. 4"	02-206	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-185	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-186	OUI	
ALARME	PS10-2	02-177	OUI	
LOCAL 205 : VALVE DE SECTEUR SYST 1 (WAFER 2.5")	PTS-C	02-166	OUI	
LOCAL 305 : VALVE DE SECTEUR SYST 1 (WAFER 2.5")	PTS-C	02-164	OUI	
LOCAL 407 : VALVE DE SECTEUR SYST 1 (WAFER 2.5")	PTS-C	02-168	OUI	
VALVE SYSTÈME #2 - JAUNE				
VALVE SYSTÈME #2 - JAUNE	GR. 4"	02-204	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-187	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-188	OUI	
ALARME	PS10-2	02-178	OUI	
VALVE SYSTÈME #3 - BLEU				
VALVE SYSTÈME #3 - BLEU	GR. 4"	02-205	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-189	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-190	OUI	
ALARME	PS10-2	03-175	OUI	
VALVE SYSTÈME #4 - ORANGE				
VALVE SYSTÈME #4 - ORANGE	GR. 4"	02-202	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-191	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-192	OUI	
ALARME	PS10-2	02-176	OUI	
VALVE SYSTÈME #5 - MAUVE				
VALVE SYSTÈME #5 - MAUVE	GR. 4"	02-203	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-193	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-194	OUI	
ALARME	PS10-2	02-173	OUI	
VIDE TECHNIQUE SOUS LE COULOIR SOUS-SOL :				
VALVE BOYAUX	GR. 4"	02-209	NON	NON LOCALISÉ
BASSE PRESSION LIGNE D'AIR	PS40-2	03-174	OUI	
P.I.V. EXTÉRIEUR	PCVS	02-198	OUI	
VIDE SANITAIRE PAR LOCAL R-22 :				
VALVE PRINCIPALE	WAFER 6"	02-197	OUI	
VALVE #1 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 6"	02-195	OUI	
VALVE #2 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 6"	02-196	OUI	
VALVE SYSTÈME DE BOYAUX EST	GR. 4"	02-161	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 4"	02-160	OUI	
VALVE SYSTÈME DE BOYAUX EST (WAFER 4")	PCVS	02-208	OUI	
VALVE CHUTE À LINGE OUEST (FILL 2")	PTS-C	02-162	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	02-163	OUI	
VALVE PRINCIPALE OUEST (WAFER 6")	PTS-C	02-207	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT PRINCIPALE OUEST	VSR-F 6"	02-179	OUI	
SOUS-SOL MONASTÈRE :				
VALVE #1 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	02-210	OUI	
VALVE #2 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	02-210	OUI	
VALVE PRINCIPALE	PTS-C 4"	02-211	OUI	

Emplacements	Dispositif	Zone	Activation d'alarme confirmée	Observations
SALLE MÉCANIQUE R-15 :				
VALVE #1 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	03-129	OUI	
VALVE #2 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	03-129	OUI	
VALVE SYSTÈME BOYAUX EST	PCVS-2 4"	02-214	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 4"	02-213	OUI	20 SEC
VALVE ALIMENTATION CHAUFFERIE	GR. 4"	03-155	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 4"	03-154	OUI	35 SEC
VALVE SYSTÈME SECTEUR EST	GR. 4"	03-157	OUI	
HAUTE PRESSION	PS120-2	03-158	OUI	
BASSE PRESSION	PS120-2	03-159	OUI	
ALARME	PS10-2	03-156	OUI	
VALVE RDC - EST	GR. 3"	03-152	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 3"	03-153	OUI	
VALVE RDC - NORD	GR. 2"	03-161	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-162	OUI	
LOCAL 131 : VALVE 1er ÉTAGE	GR. 2"	03-163	OUI	NOTE2 MANO
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-164	OUI	
LOCAL 213 : VALVE 2e ÉTAGE	GR. 2"	03-150	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-151	OUI	
LOCAL 315 : VALVE 3e ÉTAGE	GR. 2"	03-403	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-404	OUI	
LOCAL 415 : VALVE 4e ÉTAGE	GR. 2"	03-401	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-402	OUI	
LOCAL 515 : VALVE 5e ÉTAGE	GR. 2"	03-399	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-400	OUI	
LOCAL 613 : VALVE 6e ÉTAGE	GR. 2"	03-395	OUI	NOTE 2 MANO
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-396	OUI	
VALVE CABANON EST	GR. 2.5"	03-397	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2.5"	03-398	OUI	
LOCAL R-13 : VALVE GLYCOL DÉBARCADÈRE	FILL 1 1/4"	03-160	OUI	
DÉBIT GICLEUR CHUTE À LINGE EST		02-171	OUI	NON LOCALISE
VALVE CHUTE À LINGE R17		02-170		NON LOCALISE
RDC EST PRÈS R-31		02-184	OUI	
RDC EST PRÈS R-12		02-183	OUI	
RDC EST PRÈS R-11		02-182	OUI	

Rapport d'essai et d'inspection de Système de gicleurs sous eau

INSPECTION TRIMESTRIELLE

Prop:

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**

Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Numéro de système: **SECTEUR NORD-EST**

Emplacement du système : **SALLE MÉCANIQUE R-15 EST**

Central de surveillance: **MICROTECH**

Marque / Modèle du système: **ASTRA MOD. E 4"**

Endroit protégé: **SECTEUR NORD ET EST**

Date: **5/9/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

418-529-0931 #26480

Année : **2003**

Essais	Résultats	Observations
Pression de l'alimentation en eau: (lb/po2)	70	
Pression du système : (lb/po2)	135	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	60	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
L'alarme intérieure du bâtiment fonctionne ?	OUI	
L'alarme extérieure du bâtiment fonctionne ?	S-O	
Pression lors de l'écoulement du robinet d'essai de l'inspecteur : (lb/po2)	40	6e étages
Emplacement : TEST AND DRAIN SUR CHAQUE ÉTAGES		
Délai du clapet de retenue (min/sec)	S-O	
Délai de l'interrupteur de pression: (min/sec)	S-O	
Délai du déclenchement de l'interrupteur de débit: (min/sec)	S-O	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ?	OUI	
L'interrupteur de basse pression a été vérifié ?	OUI	
Essai du démarrage automatique de la pompe incendie:	S-O	
Essai de démarrage manuel de la pompe incendie :	S-O	
Essai de démarrage de la pompe de surpression: Départ : (lb/po2) PSI 125	OUI	
Modèle : ALBANY HP : 1/2 Volts : 115/230 amp. : 4.1/8.2		
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?		

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccordements sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccordements sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Robinet et valves	Résultats	Observations
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Le robinet du système antigel est verrouillé ouvert ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne condition ?	OUI	
La soupape de surpression est en bonne condition ?	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'extérieur du clapet de retenue d'alarme est en bonne condition ?	OUI	
Les robinets sont dans la bonne position ?	OUI	
Le robinet d'essai d'alarme est fermé ?	OUI	
Le robinet de contrôle a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Le robinet d'entrée d'eau a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Le robinet vanne avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, Nombre de tours	S-O	

Prop:

Date: 5/9/2025

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	OUI	
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	

Général	Résultats	Observations
L'usage principal et les risques sont les mêmes qu'à la dernière inspection ?	OUI	
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	OUI	
Les systèmes sont tous en service ?	OUI	
Les étiquettes de signalisation sont en place ?	OUI	
La solution antigel a été vérifiée pour fournir le bon degré de protection ?, Temp.	OUI	-42
L'alarme extérieure est bien identifiée ?	S-O	
La chambre de gicleur est-elle identifiée ?	NON	
Plaque de signalisation hydraulique installée ? Densité:	NON	NOTE 1
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement chauffé correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est en état normal ?	OUI	

Prop:

Projet : **C.H. SACRÉ-CŒUR**
Adresse : **1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC**

Date: **5/9/2025**

Technicien : XXXXXXXXXX

Numéro de système: **CHAUFFERIE**
Emplacement du système : **ATELIER ET BOUILLOIRE**
Central de surveillance: **MICROTECH**
Marque / Modèle du système: **ASTRA MOD. E 4"**
Endroit protégé: **ATELIER, BOUILLOIRE ET CHAUFFERIE**

418-529-0931 #26480

Année : **2002**

Essais	Résultats	Observations
Pression de l'alimentation en eau: (lb/po2)	65	
Pression du système : (lb/po2)	120	
Pression avec le robinet de purge principal ouvert et son diamètre: (lb/po2)	40	
Système équipé d'un dispositif anti-refoulement ?	OUI	
L'alarme intérieure du bâtiment fonctionne ?	OUI	
L'alarme extérieure du bâtiment fonctionne ?	OUI	
Pression lors de l'écoulement du robinet d'essai de l'inspecteur : (lb/po2)	65	
Emplacement : TEST AND DRAIN AU SYSTÈME, 2e ÉTAGE ET TUNNEL		
Délai du clapet de retenue (min/sec)	S-O	
Délai de l'interrupteur de pression: (min/sec)	S-O	
Délai du déclenchement de l'interrupteur de débit: (min/sec)	S-O	
Les manomètres semblent fonctionner correctement ? 2025	OUI	
L'interrupteur de basse pression a été vérifié ?	OUI	
Essai du démarrage automatique de la pompe incendie:	S-O	
Essai de démarrage manuel de la pompe incendie :	S-O	
Essai de démarrage de la pompe de surpression: Départ : (lb/po2) PSI 105		
Modèle : ALBANY HP : 1/2 Volts : 115/230 amp. : 4.1/8.2		
La compagnie de surveillance d'alarme a reçu l'alarme correctement ?	OUI	

Raccordement au service d'incendie (siamoise)	Résultats	Observations
Les bouchons sont en place ?	OUI	
Les raccords malléables sont fonctionnels ?	OUI	
Les raccords sont visibles et facilement accessibles ?	OUI	
La purge à bille est présente et en bonne condition ?	OUI	
Les raccords sont bien identifiés ?	OUI	
Les clapets de retenue sont étanches ?	OUI	

Robins et valves	Résultats	Observations
Les robinets sont accessibles ?	OUI	
Les robinets sont verrouillés ou surveillés ouverts ?	OUI	
Le robinet du système antigel est verrouillé ouvert ?	OUI	
Les robinets d'ajustement sont en bonne condition ?	OUI	
La soupape de surpression est en bonne condition ?	OUI	
Le clapet de retenue principal retient bien la pression ?	OUI	
L'extérieur du clapet de retenue d'alarme est en bonne condition ?	OUI	
Les robinets sont dans la bonne position ?	OUI	
Le robinet d'essai d'alarme est fermé ?	OUI	
Le robinet de contrôle a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Les robinets sont lubrifiés ?	OUI	
Le robinet d'entrée d'eau a été fermé et retourné à sa position ouverte ?	OUI	
Le robinet vanne avec colonne de manœuvre a été mis à l'essai ?, Nombre de tours	S-O	

Prop:

Date: 5/9/2025

Têtes de gicleurs	Résultats	Observations
Des têtes de rechange sont disponibles dans le cabinet ?	OUI	
Les têtes semblent de la bonne température ?	OUI	
Une clef est-elle disponible pour chaque sorte de tête ?	OUI	
Les têtes exposées au froid semblent exemptes de glace et de corrosion ?	OUI	
Les têtes semblent étanches et sans dommage ?	OUI	
Les têtes semblent libres de peinture ?	OUI	
Les têtes semblent du bon modèle (dressées, pendantes, murales) ?	OUI	
Les têtes standards semblent avoir moins de 50 ans / résidentielle moins de 20 ans ?	OUI	
Les têtes semblent libres de corps étranger ?	OUI	
Les jets de diffusion semblent sans obstruction ?	OUI	

Tuyauterie	Résultats	Observations
Inspection visuelle de la solidité des crochets et des attaches est-elle faite ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de tout dommage mécanique ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de toute fuite ?	OUI	
La tuyauterie semble exempte de corrosion ?	OUI	
La tuyauterie semble bien alignée ?	OUI	
La tuyauterie semble libre de poids extérieur ?	OUI	

Général	Résultats	Observations
L'usage principal et les risques sont les mêmes qu'à la dernière inspection ?	OUI	
Les déficiences rapportées à la dernière inspection ont-elles été corrigées ?	S-O	
Les systèmes sont tous en service ?	OUI	
Les étiquettes de signalisation sont en place ?	OUI	
La solution antigel a été vérifiée pour fournir le bon degré de protection ?, Temp.	OUI	-45
L'alarme extérieure est bien identifiée ?	OUI	
La chambre de gicleur est-elle identifiée ?	S-O	
Plaque de signalisation hydraulique installée ? Densité:	NON	NOTE1
Les tuyaux sous eau sont dans un environnement chauffé correctement ?	OUI	
Le panneau d'alarme est en état normal ?	OUI	



OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

SYSTÈME SOUS EAU

PROP: 0

PROJET: C.H. SACRÉ-CŒUR

NOTE POUR CENTRALE : APPELER L'HOPITAL GÉNÉRAL : 418-529-0931 #26480

NOTE 1 DÉFICIENCES: IL N'Y A PAS DE FICHE SIGNALÉTIQUE SUR LE SYSTÈME, CETTE AFFICHE
DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ SUR LE SYSTÈME.

Proposition :

Projet :

Adresse :

Central de surveillance:


C.H. SACRÉ-CŒUR
1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC
MICROTECH

Date : 5/9/2025

Technicien : XXXXXXXXXX

Emplacements	Dispositif	Zone	Activation d'alarme confirmée	Observations
SALLE DE GICLÉUR R-22 OUEST :				
VALVE SYSTÈME #1 - VERT	GR. 4"	02-206	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-185	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-186	OUI	
ALARME	PS10-2	02-177	OUI	
LOCAL 205 : VALVE DE SECTEUR SYST 1 (WAFER 2.5")	PTS-C	02-166	OUI	
LOCAL 305 : VALVE DE SECTEUR SYST 1 (WAFER 2.5")	PTS-C	02-164	OUI	
LOCAL 407 : VALVE DE SECTEUR SYST 1 (WAFER 2.5")	PTS-C	02-168	OUI	
VALVE SYSTÈME #2 - JAUNE				
VALVE SYSTÈME #2 - JAUNE	GR. 4"	02-204	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-187	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-188	OUI	
ALARME	PS10-2	02-178	OUI	
VALVE SYSTÈME #3 - BLEU				
VALVE SYSTÈME #3 - BLEU	GR. 4"	02-205	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-189	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-190	OUI	
ALARME	PS10-2	03-175	OUI	
VALVE SYSTÈME #4 - ORANGE				
VALVE SYSTÈME #4 - ORANGE	GR. 4"	02-202	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-191	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-192	OUI	
ALARME	PS10-2	02-176	OUI	
VALVE SYSTÈME #5 - MAUVE				
VALVE SYSTÈME #5 - MAUVE	GR. 4"	02-203	OUI	
HAUTE PRESSION	PS40-2A	02-193	OUI	
BASSE PRESSION	PS40-2A	02-194	OUI	
ALARME	PS10-2	02-173	OUI	
VIDE TECHNIQUE SOUS LE COULOIR SOUS-SOL :				
VALVE BOYAUX	GR. 4"	02-209	NON	NON LOCALISÉ
BASSE PRESSION LIGNE D'AIR	PS40-2	03-174	OUI	
P.I.V. EXTÉRIEUR	PCVS	02-198	OUI	
VIDE SANITAIRE PAR LOCAL R-22 :				
VALVE PRINCIPALE	WAFER 6"	02-197	OUI	
VALVE #1 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 6"	02-195	OUI	
VALVE #2 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 6"	02-196	OUI	
VALVE SYSTÈME DE BOYAUX EST	GR. 4"	02-161	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 4"	02-160	OUI	
VALVE SYSTÈME DE BOYAUX EST (WAFER 4")	PCVS	02-208	OUI	
VALVE CHUTE À LINGE OUEST (FILL 2")	PTS-C	02-162	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	02-163	OUI	
VALVE PRINCIPALE OUEST (WAFER 6")	PTS-C	02-207	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT PRINCIPALE OUEST	VSR-F 6"	02-179	OUI	
SOUS-SOL MONASTÈRE :				
VALVE #1 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	02-210	OUI	
VALVE #2 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	02-210	OUI	
VALVE PRINCIPALE	PTS-C 4"	02-211	OUI	

Emplacements	Dispositif	Zone	Activation d'alarme confirmée	Observations
SALLE MÉCANIQUE R-15 :				
VALVE #1 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	03-129	OUI	
VALVE #2 DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	GR. 4"	03-129	OUI	
VALVE SYSTÈME BOYAUX EST	PCVS-2 4"	02-214	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 4"	02-213	OUI	20 SEC
VALVE ALIMENTATION CHAUFFERIE	GR. 4"	03-155	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 4"	03-154	OUI	35 SEC
VALVE SYSTÈME SECTEUR EST	GR. 4"	03-157	OUI	
HAUTE PRESSION	PS120-2	03-158	OUI	
BASSE PRESSION	PS120-2	03-159	OUI	
ALARME	PS10-2	03-156	OUI	
VALVE RDC - EST	GR. 3"	03-152	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 3"	03-153	OUI	
VALVE RDC - NORD	GR. 2"	03-161	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-162	OUI	
LOCAL 131 : VALVE 1er ÉTAGE	GR. 2"	03-163	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-164	OUI	
LOCAL 213 : VALVE 2e ÉTAGE	GR. 2"	03-150	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-151	OUI	
LOCAL 315 : VALVE 3e ÉTAGE	GR. 2"	03-403	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-404	OUI	
LOCAL 415 : VALVE 4e ÉTAGE	GR. 2"	03-401	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-402	OUI	
LOCAL 515 : VALVE 5e ÉTAGE	GR. 2"	03-399	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-400	OUI	
LOCAL 613 : VALVE 6e ÉTAGE	GR. 2"	03-395	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2"	03-396	OUI	
VALVE CABANON EST	GR. 2.5"	03-397	OUI	
DÉTECTEUR DE DÉBIT	VSR-F 2.5"	03-398	OUI	
LOCAL R-13 : VALVE GLYCOL DÉBARCADÈRE	FILL 1 1/4"	03-160	OUI	
DÉBIT GICLEUR CHUTE À LINGE EST		02-171	OUI	NON LOCALISÉ
VALVE CHUTE À LINGE R17		02-170		NON LOCALISÉ
RDC EST PRÈS R-31		02-184	OUI	
RDC EST PRÈS R-12		02-183	OUI	
RDC EST PRÈS R-11		02-182	OUI	



C.H. SACRÉ-CŒUR
1 AVE. SACRÉ-CŒUR, QUÉBEC
MICROTECH

DET2

Energie Inspection Anuelle / EPG Annual Inspection Form

PM

● 1 ● 2 ● 100 ● 45

n ° de Inspection	19524550	Adresse e-mail du client	
Numéro de série	2302451	Ordre de travail	QB52842
Marque	KOHLER	Date de fin	2024-10-16 13:02:12
modèle	400REOZVC	Inspecteur	
famille Équipement	ENGINE - GENERATOR SET	PDF généré sur	2024-10-16
SMU	337 Heures	emplacement	Québec, QC
COORDONNÉES	8.48950576782227, 46.8138521204985, - 71.2458876532163		
Technician			

General Info & Comments

● General info/Comments NORMAL

Survol de l'équipement / Walk-Around

● 1.1 Photo de l'équipement / Equipment Picture COMPLÉTER / COMPLETED



● 1.2 Photo de plaque signalétique du numéro de série + heures / Serial Number Plate Picture + Hours COMPLÉTER / COMPLETED





1.3 Commentaires général / General comments

COMPLÉTER /
COMPLETED

Sécurité / Safety

2.1 Propreté et sécurité des lieux (Dégagement, etc.) / Room cleanliness and safety (Clearance, etc.)

BON / GOOD

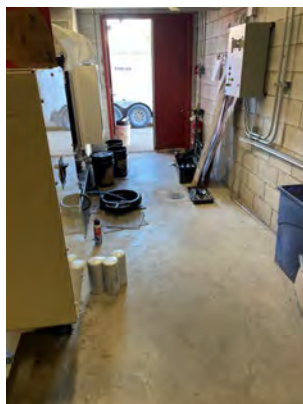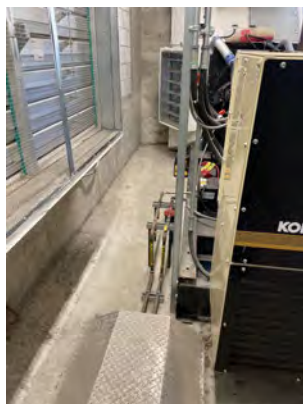

2.2 Extincteur de feu / Fire extinguisher

BON / GOOD

2.3 Équipement de sécurité, Trousse de déversement / Safety equipment, Spill kit

A SURVEILLER / TO
BE MONITORED

Comments: pas de trousse

2.4 Éclairage, éclairage de sécurité / Lighting, security lighting

BON / GOOD

2.5 Mise à la terre des équipements / Procédure de cadenassage compléter / Equipment properly Grounded / Lock-out Procedure completed

BON / GOOD



- **2.6 Température ambiante de la salle (Doit être supérieure à 10°C) / Ambient room temperature (Must be above 10°C)** *BON / GOOD*

2.6.1 Temperature / Température	20 Celsius
--	------------

Circuit de refroidissement / Cooling System

- **3.1 Niveau d'Antigel / Coolant level** *BON / GOOD*



- **3.2 Concentration du liquide réfrigérant / Coolant concentration** *BON / GOOD*

3.2.1 Temperature / Température	-45 Celsius
--	-------------

- **3.3 Dosage de l'antirouille / Rust-inhibitor concentration** *BON / GOOD*

3.3.1 concentration	2000 PPM
----------------------------	----------

- **3.4 Bouchon du radiateur / Radiator cap** *BON / GOOD*



3.4.1 Pressure / Pression

75 KPA

3.5 Faisceaux du radiateur / Radiator core

A SURVEILLER / TO
BE MONITORED

Comments: huileux gasket de pan coule

3.6 Échangeur de chaleur, crépine et conduites d'eau brute / Heat exchanger, strainer and raw water lines

NA

3.7 Anode de Zinc sur circuit d'eau brute (Échangeur de chaleur, refroidisseur) / Zinc rods on raw water system (Heat exchanger, after cooler)

NA

3.8 Fuites réfrigérant **ajouter photos si fuites présent ** / Coolant leaks **Add photo if any leaks**

BON / GOOD

3.9 Chauffe-moteur et raccord électrique / Block heater and electric connection

BON / GOOD

3.10 Boyaux, raccords et flexibles (Serrage des collets) / Hoses, hook-ups and flexibles (Hose clamps tightness)

BON / GOOD

3.11 Pompe à eau (Sans démontage) / Water pump (Visual Inspection only)

BON / GOOD

3.12 Poulie entraînement et ventilateur / Fan Drive Pulley & Fan

BON / GOOD

3.13 Régulateurs de température / Thermostats

BON / GOOD

3.14 État et tension des courroies (Sans démontage des gardes) / Belt condition and tension (Without removing guards)

BON / GOOD

3.15 Circuit de ventilation (Conduits, volets, etc.) / Ventilation system (Duct, louvers, etc.)

BON / GOOD


Système électrique (Vérification moteur à l'arrêt) / Electrical System (Engine Stopped Verification)

- 4.1 Tension du chargeur (Ajustement) / Battery charger voltage (Adjust) *BON / GOOD*

4.1.1 Paramètres / Settings

28/9 Volts / amps

- 4.2 Inspection Batteries: Câbles et raccords des accumulateurs (Serrage et nettoyage) / Battery Inspection: Battery cables and connections (Tightening and cleaning) *BON / GOOD*

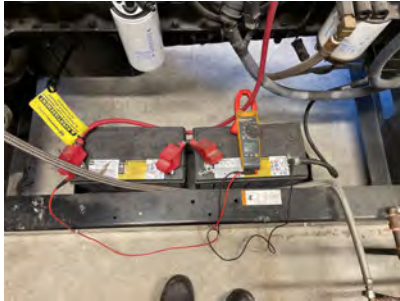

- 4.3 Essai de charge des accumulateurs avec instrument approprié / Battery load test with proper instrument *NA*

4.3.1 Lectures / Readings

- 4.4 Nettoyer tous les isolateurs électriques / Clean electric insulators *BON / GOOD*

- 4.5 Tous les raccords électriques sur le groupe électrogène / All electric connections on the generator set *BON / GOOD*

- 4.6 Relais, interrupteurs et disjoncteurs (Inspection visuelle) / Relays, switches and breaker contacts (Visual inspection) *BON / GOOD*

- 4.7 Fonctionnement du disjoncteur du groupe électrogène / Generator set breaker operation *BON / GOOD*

- 4.8 Position des aiguilles des indicateurs au repos du groupe électrogène / Metering needle at rest of the generator set *BON / GOOD*

- 4.9 Excitatrice de l'alternateur, diodes, éléments chauff., etc. (Insp. visuelle) / Generator exciter, brushes, diodes, space heater, etc. (Visual inspection) *BON / GOOD*

- 4.10 Propreté des bobinages et grilles ventilation génératrice (Insp. visuelle) / Generator windings and ventilation grids cleanliness (Visual inspection) *BON / GOOD*

- 4.11 Accouplement et alignement groupe électrogène (Insp. visuelle) / Generator set coupling and alignment (Visual inspection) BON / GOOD

Moteurs à étincelles / Spark Ignited Engines

- 5.1 Inspection de toutes les composantes du système d'allumage / Inspection of all ignition components NA

Circuit de lubrification / Lubrication System

- 6.1 Niveau d'huile (Arrêt - En Marche) Oil level (Stopped - Running) BON / GOOD

- 6.2 Niveau d'huile du régulateur de vitesse et pompe à carburant / Oil level in speed governor and fuel pump NA

- 6.3 Fuites d'huile **ajouter photos si fuites présent** / Oil leaks **Add photo if any leaks** ÉCHU / FAIL

Comments: gasket de pan coule



- 6.4 Boyaux, raccords et flexibles (Serrage des collets) / Hoses, hook-ups and flexibles (Hose clamps tightness) BON / GOOD

- 6.5 Filtres à huile / Oil Filters BON / GOOD



- 6.6 Présence de contaminants dans l'huile (Inspection visuelle) / Oil contamination (Visual Inspection) BON / GOOD

●	6.7 Pompe de prélubrification / Pre-lube pump	NA
●	6.8 Réchauffeur d'huile / Oil pan heater	NA
●	6.9 Reniflard de carter et drainage de la chambre d'air / Crankcase breather and drain air box	BON / GOOD
●	6.10 Échantillon d'huile SOS (Oui / Non - Si oui, # SOS) / SOS Oil Sample (Yes/ No - If Yes, SOS #)	COMPLÉTER / COMPLETED
Circuit de carburant (Inspection visuelle) / Fuel System (Visual Inspection)		
●	7.1 Niveau du réservoir principal / Main tank level	BON / GOOD
	7.1.1 Level / Niveau	50% E - F
●	7.2 Niveau du réservoir journalier et fonctionnement du système / Day tank level and fuel transfer system	BON / GOOD
	7.2.1 Level / Niveau	80% E - F
●	7.3 Boyaux, raccords et flexibles (Serrage des collets) / Hoses, hook-ups and flexibles (Hose clamps tightness)	BON / GOOD
●	7.4 Présence de contaminants dans le carburant (Limpidité et clarté, eau) / Fuel contaminations (Clarity and cleanliness, water)	BON / GOOD
●	7.5 Drainage d'eau du séparateur et réservoir journalier / Drain water from separators and day tank	COMPLÉTER / COMPLETED
●	7.6 Fuites de carburant **ajouter photos si fuites présent ** / Fuel leaks **Add photo if any leaks**	BON / GOOD
●	7.7 Filtres à carburant - Primaire / Secondaire / Fuel Filters - Prim / Sec	BON / GOOD



●	7.8 Pompe d'armorage carburant / Fuel Priming Pump	BON / GOOD
●	7.9 Pompe d'alimentation de carburant du moteur / Engine fuel transfer pump	BON / GOOD
●	7.10 Moteur et articulations du régulateur de vitesse / Governor linkage and electric motor	NA
Circuit d'admission et d'échappement ((Insp. Visuelle) / Intake and Exhaust System (Visual Insp.))		
●	8.1 Indicateur de colmatage du filtre à air / Air filter & restriction indicator	NA
●	8.2 Volet de coupure de l'air / Air shutdown damper	NA
●	8.3 Conduites d'admission, raccords, flexibles et échangeur(s) / Air Intake System, piping, flex's and exchanger(s)	BON / GOOD
●	8.4 Turbochargeurs / Turbocharger	BON / GOOD
●	8.5 Conduite d'échappement et raccords flexibles (Condition de l'isolation) / Exhaust piping and flex's (Insulation condition)	BON / GOOD
●	8.6 Supports circuit d'échappement / Exhaust manifold and piping supports, muffler	BON / GOOD
●	8.7 Fuites d'échappement **ajouter photos si fuites présent ** / Exhaust leaks **Add photo if any leaks**	BON / GOOD
●	8.8 Vidanger le purgeur de condensation du système d'échappement / Drain exhaust system condensate trap	BON / GOOD
●	8.9 Clapet pare-pluie ou grillage anti-oiseaux / Rain cap or bird screen	BON / GOOD
Moteur en marche sans charge (Vérification) / Engine Running No Load (Verification)		
●	9.1 Bougies de préchauffage (si applicable) / Glow plugs (if applicable)	NA
	9.1.1 Lecture / Reading	
●	9.2 Support de maintien démarreur (Inspection visuelle) / Starter mounts (Visual inspection)	BON / GOOD



●	9.3 Cycles de démarrage / Starting cycles	NA
	9.3.1 Dem./Start Repos/Rest / Cycles	
●	9.4 Courant du démarreur / Starter current	BON / GOOD
	9.4.1 Lecture / Reading	989 Amps.
●	9.5 Chute tension CC au dernier essai de démarrage / DC voltage drop at the last starting attempt	NA
	9.5.1 Lecture / Reading	
●	9.6 Démarreur à air (Pression des réservoirs, valves, compresseur etc) / Air starter (Tanks pressure, valves, compressor etc) (if applicable) *** Note: Toromont décline toutes responsabilités pour la non disponibilité du groupe électrogène après l'essai si la capacité de l'air disponible est inadéquate*** Note Toromont declines all responsibilities if the genset is not available immediately after the test caused by an air volume shortage. ***	NA
	9.6.1 Pression / Pressure	
●	9.7 Drainer les condensats du circuit d'air comprimé / Drain condensation of the compressed air circuit	NA
●	9.8 Bruits anormaux / Unusual noise	COMPLÉTER / COMPLETED
●	9.9 Alternateur de charge / Charging alternator	BON / GOOD
	9.9.1 Puissance / Output	28,4 Volts / Amp
●	9.10 Fonctionnement composantes à distance (radiateur etc.) / Remote equipment operations (radiator, etc.)	NA
●	9.11 Stabilité de la tension CA (Ajustement régulateur) / AC voltage stability (Regulator adjustment)	BON / GOOD

●	9.12 Étalonnage des instruments vs multimètre digital calibré / Instrument calibration vs digital calibrated multimeter	BON / GOOD
●	9.13 Tension CA / AC voltage	BON / GOOD
	9.13.1 Phases	600 A-B
●	9.14 Pression huile / Oil Pressure	BON / GOOD
	9.14.1 Pression / Pressure	75 Psi / kPA
●	9.15 Température réfrigérant / Coolant Temperature	BON / GOOD
	9.15.1 Temp.	100 F
●	9.16 Vibrations anormales (Inspection visuelle) / Abnormal vibrations (Visual inspection)	BON / GOOD
●	9.17 Ouverture des volets / Dampers opening operation	BON / GOOD
●	9.18 Montage de la base, amortisseurs et ancrages (Inspection visuelle) / Base mounting, shock mounts and anchorage (Visual inspection)	BON / GOOD
Essais des alertes / Alarm Test		
●	10.1 Lancement infructueux (Alertes: Lumineux / Sonore/ Arrête) / Over crank (Alarms: Audible / Visual / Shutdown)	NA
●	10.2 Basse température du moteur (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low engine temperature (Alarms: Audible / Visual)	BON / GOOD
●	10.3 Alarme préalable de surchauffe du moteur (Alertes: Lumineux / Sonore) / High engine temperature pre-alarm (Alarms: Audible / Visual)	BON / GOOD
●	10.4 Surchauffe du moteur (Alertes: Lumineux / Sonore / Arrête) / High engine temperature (Alarms: Audible / Visual / Shutdown)	BON / GOOD
●	10.5 Préalarme de basse pression d'huile du moteur (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low lube oil pressure pre-alarm	BON / GOOD
●	10.6 Alarme de basse pression d'huile du moteur (Alertes: Lumineux / Sonore / Arrête) / Low lube oil pressure (Alarms: Audible / Visual / Shutdown)	BON / GOOD

●	10.7 Survitesse (Alertes: Lumineux / Sonore / Arrête) / Overspeed (Alarms: Audible / Visual / Shutdown)	BON / GOOD
●	10.8 Bas niveau de carburant (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low fuel (Alarms: Audible / Visual)	NA
●	10.9 Alim. de secours en circuit avec la charge (Alertes: Lumineux) / Emergency electrical power supply system supplying load (Alarm: Visual)	NA
●	10.10 Interrupteur de contrôle non en position auto. (Alertes: Lumineux) / Control switch not in automatic position (Alarm: Visual)	BON / GOOD
●	10.11 Tension des accumulateurs faible (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low voltage in battery (Alarms: Visual / Audible)	BON / GOOD
●	10.12 Essai des lampes témoins (Alertes: Lumineux) / Lamp test (Alarm: Visual)	BON / GOOD
●	10.13 Contacts pour alarme commune (loc. & dist.) (Alertes: Lumineux / Sonore) / Contacts for local and remote common alarm (Alarms: Audible / Visual)	NA
●	10.14 Interrupteur d'arrêt de l'alarme sonore / Audible alarm silencing switch	BON / GOOD
●	10.15 Pression d'air de démarrage faible (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low starting air pressure (Alarms: Visual / Audible)	NA
●	10.16 Pression hydraulique de démarrage faible (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low starting hydraulic pressure (Alarms: Visual / Audible)	NA
●	10.17 Volet de coupure d'air (Alertes: Lumineux / Sonore) / Air shutdown damper (Alarms: Visual / Audible)	NA
●	10.18 Arrêt d'urgence à distance (Alertes: Sonore / Arrête) / Remote emergency stop (Alarms: Audible / Shutdown)	BON / GOOD
●	10.19 Bas niveau du liquide de refroidissement (Alertes: Lumineux / Sonore) / Low coolant level (alarms: Audible / Visual)	BON / GOOD
●	10.20 Registres de ventilation fermés (Alertes: Lumineux / Sonore) / Ventilation damper not open (Alarms: Visual / Audible)	NA

●	10.21 Fuite de l'enceinte du réservoir journalier (Alertes: Lumineux / Sonore) / Daytank containment leak sensing (Alarms: Visual / Audible)	BON / GOOD
●	10.22 Commutateur automatique en mode dérivation (Alertes: Lumineux) / Automatic transfer switch in bypass mode (Alarm: Visual)	NA
●	10.23 Sous fréquence ou sous vitesse (Alertes: Lumineux) / Under-frequency / under-speed (Alarm: Visual)	BON / GOOD
●	10.24 Surintensité (Alertes: Lumineux) / Overcurrent (Alarm: Visual)	BON / GOOD
●	10.25 Sous tension (C.A.) (Alertes: Lumineux) / Under-voltage (A.C.) (Alarm: Visual)	COMPLÉTER / COMPLETED
●	10.26 Sur tension (Alertes: Lumineux) / Overvoltage (Alarm: Visual)	BON / GOOD
●	10.27 Disjoncteur principal ouvert (Alertes: Lumineux / Sonore) / Main disconnect open (Alarms: Visual / Audible)	NA
Moteurs à gaz – Inspection visuelle / Gas Engines - Visual Inspection		
●	11.1 Lignes de carburant et connexions / Gas Lines & Connections	NA
●	11.2 Carburateur et accessoires / Carburetor & Linkages	NA
●	11.3 Magnéto / Distributeur / Magneto / Distributor	NA
●	11.4 Système de démarrage / Ignition System	N/A
●	11.5 Bougies / Spark Plugs	NA
Alternateur (Inspection visuelle) / Alternator - Visual Inspection		
●	12.1 Roulements / Bearings	BON / GOOD
●	12.2 Commutateurs et Brosses / Slip Rings & Brushes	NA
●	12.3 Isolateurs de vibration / Vibration Isolators	BON / GOOD

Moteur en marche avec charge (Vérification) / Engine Running On Load (Verification)		
● 13.1 Essai en charge @ 100%. (Si banc de charge requis, prix en sus) / Load test @ 100%. (If load bank required, price in extra)		COMPLÉTER / COMPLETED
13.1.1 durée / Time		
● 13.2 Temporisation du démarrage en mode automatique / Time Delay Engine Start-up in automatic mode (TDES)		NA
13.2.1 Temps / Time		
● 13.3 Établissement de la tension / Voltage build-up		NA
13.3.1 Temps / Time		
● 13.4 Vérification de la Synchronisation (si applicable) / Synchronization check (If applicable)		NA
● 13.5 Temporisation de transfert / Time Delay Normal to Emergency (TDNE)		NA
13.5.1 Temps / Time		
● 13.6 Temporisation de repos position neutre / Time Delay in Neutral position (TDN)		NA
13.6.1 Temps / Time		
● 13.7 Tension CA & Fréquence / AC Voltage & Frequency		NA
13.7.1 Phases (A-B / B-C / C-A / A-N / B-N / C-N)		
● 13.8 Courant CA / AC current		NA
13.8.1 Amp.		
● 13.9 Température réfrigérant / Coolant temperature		NA
13.9.1 Temp.		
● 13.10 Vérification de la soupape à 3 voies / 3 way valve verification		NA
● 13.11 Retour à la source normale /Switch back to normal power		NA

●

13.12 Temporisation de transfert d'urgence à normale /Time Delay Emergency to Normal (TDEN)

NA

13.12.1 Temps / Time

●

13.13 Temporisation de refroidissement (5 minutes minimum) / Time Delay Engine Cool-down (Minimum 5 minutes) (TDEC)

NA

13.13.1 Temps / Time

●

13.14 Tous les panneaux sont fermés et les gardes protecteurs existants installés. / All panels are closed and all existing guards are installed

COMPLÉTER / COMPLETED



●

13.15 Fermeture des volets / Dampers closing operation

BON / GOOD



●

13.16 Tous les contrôles sont en position d'opération automatique / All controls are in automatic operation position

COMPLÉTER / COMPLETED



13.17 Chargeur de batteries alimenter et fonctionne / Battery charger on

COMPLÉTER /
COMPLETED



13.18 Chauffe bloc alimenter et fonctionne / Block heater on

COMPLÉTER /
COMPLETED



13.19 Disjoncteur en position Auto / Breaker position

COMPLÉTER /
COMPLETED



13.20 Inscription des travaux au journal d'entretien / Inscription of the work in the logbook

COMPLÉTER / COMPLETED



Travaux d'entretiens additionels / Additional Requirements

14.1 Inspection annuelle de l'inverseur selon formulaire / Yearly inspection of transfer switch as per form

COMPLÉTER / COMPLETED

14.2 Remplacement des batteries (3 ans) "PLC, HMI, Exerciseur, etc." / Battery replacement (3 years) "PLC, HMI, Exerciser, etc."

COMPLÉTER / COMPLETED

14.3 Remplacement du réfrigérant, thermostats et boyaux (3 ans) / Coolant replacement, thermostats and hoses (3 years)

COMPLÉTER / COMPLETED

14.4 Remplacement des courroies (3 ans) / Belt replacement (3 years)

COMPLÉTER / COMPLETED

14.5 Nettoyer les faisceaux du radiateur (5 ans) / Clean radiator core (5 years)

COMPLÉTER / COMPLETED

14.6 Mégohmmètre enroulements et vérification diodes et supresseurs (5 ans) / Megger test winding, and check-up diodes and suppressors (5 years)

COMPLÉTER / COMPLETED

14.8 Vérifiez l'équipement pour détecter tout composant suspecté d'être à risque d'obsolescence. Les composants tels que les contrôleurs, les régulateurs/gouverneurs, les appareillages de commutation et les automates sont généralement des composants à risque plus élevé. Après examen, y compris des photos des composants suspects, une alerte déclenchera une enquête de suivi de la part de notre groupe de services électriques. / Check the equipment for any components suspected to be at risk of obsolescence. Components such as controllers, governor/regulator, switchgear and PLCs are typically higher risk components. Upon review, including pictures of suspected components, an alert will prompt a follow up investigation from our Electrical Services group.



765, Gabrielle-D'Anneville
Québec, Qc G1C 7E3
(581) 446-1911
www.securigaz.com

R24-632

RAPPORT D'INSPECTION

Art. 53 54 et 56 LADOP

DATE : 14 JUIN 2024.
CLIENT : Édifice Sacré-cœur
LIEUX: 1, avenue du Sacré-Cœur
Québec (Qc), G1N 2W1
CONTACT: Mme. Myra Gagnon
NO. TEL. :

TECHNICIEN :

EMPLACEMENT	NO. SÉRIE	ÉQUIPEMENT	GAZ	VALEUR GAZ ÉTALON	CORRIGÉE OUI NON	COMMENTAIRE
CHAUFFERIE	12034	AMC - 1AD1				
	125-12014	AMC - 1225	CH4	50 % LEL	X	RÉACTION TARDIVE
CUISINE	12033	AMC - 1AD1				
	125-14014	AMC - 1225	CH4	50 % LEL	X	Valeur avant 46 % LEL
	125-13003	AMC - 1225	CH4	50 % LEL	X	Valeur avant 48 % LEL

CALIBRATION : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
VENTILATION : ☐ OUI ☐ NON ☒ N/A
ALARME SONORE : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
ALARME VISUELLE : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
RELAIS : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
CENTRALE D'ALARME : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
CORROSION : ☐ OUI ☒ NON ☐ N/A

SEQUENCE				
Niveau 1	Action	GAZ	Niveau 2	Action
25 % LEL	RELAIS # 1	CH4	50 % LEL	PANNEAU INCENDIE + ALARME SONORE
Niveau 1	Action	GAZ	Niveau 2	Action
Niveau 1	Action	GAZ	Niveau 2	Action

CYLINDRES			REMARQUES
GAZ	CONCENTRATION	NO. LOT	*** PRÉVOIR LE REMPLACEMENT D'ICI 6 MOIS
CH4	50 % LEL	304-402725775-1	



Art. 53, 54
et 56
LADOP



765, Gabrielle-D'Anneville
Québec, Qc G1C 7E3
(581) 446-1911
www.securigaz.com

R24-878

RAPPORT D'INSPECTION

Art. 53 54 et 56 LADOP

DATE : 9 DÉCEMBRE 2024.
CLIENT : Édifice Sacré-cœur
LIEUX: 1, avenue du Sacré-Cœur
Québec (Qc), G1N 2W1
CONTACT: Mme. Myra Gagnon
NO. TEL :

COSS #1 : (418) 529-0931 # 26480
TECHNICIEN :

EMPLACEMENT	NO. SÉRIE	ÉQUIPEMENT	GAZ	VALEUR	CORRIGÉE		COMMENTAIRE
				GAZ ÉTALON	OUI	NON	
CHAUFFERIE							
	2606683 - 0031	22G02 - 5B	CO	51 PPM	X		
		22G05 - 5B	CH4	20% LEL	X		
CUISINE							
	12033	AMC - 1AD1					
	125-14014	AMC - 1225	CH4	20 % LEL	X		
	125-13003	AMC - 1225	CH4	20 % LEL	X		

CALIBRATION : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
VENTILATION : ☐ OUI ☐ NON ☒ N/A
ALARME SONORE : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
ALARME VISUELLE : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
RELAIS : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
CENTRALE D'ALARME : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
CORROSION : ☐ OUI ☒ NON ☐ N/A

SEQUENCE					
Niveau 1	Action	GAZ	Niveau 2	Action	
20 % LEL	VISUELLE / SONORE " APPAREIL "	CH4	40 % LEL	PANNEAU INCENDIE " SUPERVISION "	
Niveau 1	Action	GAZ	Niveau 2	Action	
25 PPM	VISUELLE / SONORE " APPAREIL "	CO	100 PPM	PANNEAU INCENDIE " SUPERVISION "	
Niveau 1	Action	GAZ	Niveau 2	Action	

CYLINDRES			REMARQUES
GAZ	CONCENTRATION	NO. LOT	
CH4	20 % LEL	304-402225929-1	
CO	50 PPM	304-402824589-1	

Art. 53,
54 et 56
LADOP



765, Gabrielle-D'Anneville
Québec, Qc G1C 7E3
(581) 446-1911
www.securigaz.com

R25-273

RAPPORT D'INSPECTION

Art. 53 54 et 56 LADOP

DATE : 10 JUIN 2025.

CLIENT : Édifice Sacré-cœur

LIEUX : 1, avenue du Sacré-Cœur
Québec (Qc), G1N 2W1

CONTACT: Mme. Myra Gagnon

NO. TEL : [REDACTED]

COSS #1 : (418) 529-0931 # 26480

TECHNICIEN : [REDACTED]

EMPLACEMENT	NO. SÉRIE	ÉQUIPEMENT	GAZ	VALEUR	CORRIGÉE		COMMENTAIRE
				GAZ ÉTALON	OUI	NON	
CHAUFFERIE							
	2606683 - 0031	22G02 - 5B	CO	51 PPM	X		
		22G05 - 5B	CH4	49 % LEL	X		
CUISINE							
	12033	AMC - 1AD1					
	125-14014	AMC - 1225	CH4	49 % LEL	X		
	125-13003	AMC - 1225	CH4	49 % LEL	X		

CALIBRATION : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
VENTILATION : ☐ OUI ☐ NON ☒ N/A
ALARME SONORE : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
ALARME VISUELLE : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
RELAIS : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
CENTRALE D'ALARME : ☒ OUI ☐ NON ☐ N/A
CORROSION : ☐ OUI ☒ NON ☐ N/A

SEQUENCE					
Niveau 1	Action " Cuisine "	GAZ	Niveau 2	Action	
20 % LEL	VISUELLE / SONORE " APPAREIL "	CH4	40 % LEL	PANNEAU INCENDIE " SUPERVISION "	
Niveau 1	Action " Chaufferie "	GAZ	Niveau 2	Action	
25 PPM	VISUELLE / SONORE " APPAREIL "	CO	100 PPM	PANNEAU INCENDIE " SUPERVISION "	
Niveau 1	Action " Chaufferie "	GAZ	Niveau 2	Action	
10 % LEL	VISUELLE / SONORE " APPAREIL "	CH4	20 % LEL	PANNEAU INCENDIE " SUPERVISION "	

CYLINDRES			REMARQUES
GAZ	CONCENTRATION	NO. LOT	
CH4	50 % LEL	304-402794661-1	
CO	50 PPM	304-403173934-1	

Art. 53, 54
et 56
LADOP

DATE DE L'INSPECTION

31 octobre 2025

Art. 53, 54 et 56
LADOP**INSPECTEUR**Annuelle ☒ Bi-annuelle ☐**PREVENTCO**
INCENDIE INC.

RAPPORT D'INSPECTION SYSTÈME DE GICLEUR AUTOMATIQUE

A - INFORMATION SUR LE BÂTIMENT

IDENTIFICATION :	Centre Hébergement Sacré-Coeur
ADRESSE :	1, Avenue Sacré-Coeur
	Québec, Qc
REPRÉSENTANT :	Guy Dufour

B - INFORMATION SUR L'ALARME

- | | Oui | Non | N/A |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. L'immeuble est-il occupé? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 2. Le réseau de gicleur est-il relié au panneau d'alarme? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 3. La panneau est-il supervisé par une centrale? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 4. Si oui, l'avez-vous avisé des essais? | ☒ | ☐ | ☐ |
| 5. Alarmes reçues en temps requis au panneau? | ☒ | ☐ | ☐ |

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 6. Nom de la centrale : | Sécuritas |
| 7. Modèle du panneau : | Mircom |
| 8. Localisation du panneau : | Salle serveur niveau 6 |

CERTIFICAT D'INSPECTION

BÂTIMENT :

CENTRE HÉBERGEMENT SACRÉ-COEUR
1, AVENUE SACRÉ-COEUR
QUÉBEC, QC

DESCRIPTION DE
L'INSPECTION :

INSPECTION ANNUELLE DE VOTRE SYSTÈME
D'EXTINCTION DE TYPE FM-200

TYPE

☒ ANNUELLE
☐ BI-ANNUELLE

L'INSPECTION A ÉTÉ ACCOMPLIE SELON LES EXIGENCES DE LA NORME NFPA 2001 RELATIVE AU CONTRÔLE, À L'ESSAI ET À LA
MAINTENANCE DES SYSTÈMES D'EXTINCTION D'INCENDIE À AGENT PROPRE

CONFORME : ☒

FONCTIONNEL AVEC NON-CONFORMITÉS : ☐

(VOIR DÉTAIL SUR LE RAPPORT)

DATE DE L'INSPECTION : 31 OCTOBRE 2025

INSPECTEUR :

SIGNATURE



PREVENTCO
INCENDIE INC.

6-B RUE THOMAS-PAGEAU
QUÉBEC (QC), G2N 1H8
TÉLÉPHONE 1 : (418)-563-0526
TÉLÉPHONE 2 : (418)-563-0350



PREVENTCO
INCENDIE INC.

- ☒ Conforme
☐ Fonctionnel avec non-conformités
☐ Non-fonctionnel

C - NON-CONFORMITÉS

D - RECOMMANDATIONS

E- INFORMATION SUR LE SYSTÈME

1. Endroit protégé :	Salle des serveurs niveau 6
2. Type d'agent extincteur :	FM-200
3. Type de protection :	Salle complet
4. Nombre de buse :	3
5. Composante(s) bien fixée(s) :	Oui
6. Étanchéité de la pièce :	Oui

Mécanisme d'éjection

7. Mécanisme à distance :	Type Fusible ☐	Type manuel ☒
8. Mécanisme électrique :	oui ☐	
9. Type de zone(s) :	Zone simple ☐	Zone croisées ☒

Inspection selon NFPA :	NFPA-2001
-------------------------	-----------

F- PANNEAU INCENDIE

Marque :	Mircom	Modèle :	RP-1002
----------	--------	----------	---------

Bon fonctionnement :	OUI	NON		OUI	NON
1- Indicateur de mise sous tension	☒	☐	13- Dommages aux batteries	☒	☐
2- Lampe témoin de dérangement ordinaire	☒	☐	14- Lampe témoin du débranchement batterie	☒	☐
3- Signal de dérangement ordinaire	☒	☐	15- Nombre de batteries :	2	
4- Interrupteur d'arrêt du signal de dérangement	☒	☐	16- Année des batteries :	2024	
5- Défaut d'alimentation en courant alternatif	☒	☐	17- Type de batteries :	12v. 7amp.	
6- Lampe témoin de détection de fuite à la terre	☒	☐	18- Tension des batteries :	27.5 volts	
7- Arrêt du signal d'alarme sonore incendie	☒	☐	(ali. C.A sous tension)		
8- Lampe témoin d'alarme incendie	☒	☐	19- Tension des batteries :	27.2 volts	
9- Tous les signaux d'alarme sonore incendie	☒	☐	(ali. C.A hors tension)		
10- Lampe témoin de dérangement (détection)	☒	☐	20- Tension des batteries :	25.7 volts	
11- Lampe témoin de dérangement (signalisation)	☒	☐	(Alarme générale)		
12- Le réarmement fonctionne	☒	☐	21- Boitier du panneau d'alarme	☒	☐
			22- Panneau annonciateur	☐	☐
			Localisation :		

Contact auxiliaires:

	OUI	NON	N/A
1- Arrêt de ventilation :	☒	☐	☐
2- Fermeture de volets :	☐	☐	☒
3- Raccordement au panneau d'alarme du bâtiment :	☒	☐	☐
4- Fermeture de porte(s) :	☐	☐	☒
5- Alimentation électrique :	☐	☐	☒
6- Autre :	☐	☐	☐
7- Autre :	☐	☐	☐

G - LISTE DES COMPOSANTES

Composante	Emplacement	Modèle	Signal reçu		Note
			Oui	Non	
1- Panneau de relâche	Salle des serveurs	RP-1002	☐	☐	
2- Station d'avortement	Près du panneau	Safety First	☒	☐	
3- Station manuelle déclanchement	Près du panneau	NMF-950	☒	☐	
4- Détecteur Fumé #1 zone-1	Salle des serveurs secteur #1	PSD-7155	☒	☐	
5- Détecteur Chaleur #1 zone-2	Salle des serveurs secteur #1	CPD-7051	☒	☐	
6- Détecteur Fumé #2 zone-1	Salle des serveurs secteur #2	PSD-7155	☒	☐	
7- Détecteur Chaleur #2 zone-2	Salle des serveurs secteur #2	CPD-7051	☒	☐	
8- Cloche	En haut du panneau d'alarme	Wheelock	☒	☐	
9- Klaxon Stroboscope	Haut porte extérieur s. serveurs	Fire lite	☒	☐	
10- (2x) Détecteur pression cylindre	Cylindre #1 et 2	Kidde	☒	☐	
11- Selenoid (actuateur) cylindre	Cylindre #1 et 2	Kidde	☒	☐	
			☐	☐	

H- INVENTAIRE CYLINDRE(S)

Cylindre(s)	Date de fab.	# de série	Poids	Qté. agent	Pression	Niv liquide	Note
Cylindre #1 (Kidde)	10-2002	AA-185500	258 kg	128	360 psi	13.5"	
Cylindre \2 (Kidde)	09-2000	AA-135981	170 kg	81	360 psi	N/a	

I - NOTE(S)

CERTIFICAT ET RAPPORT DE MAINTENANCE POUR SYSTÈME D'EXTINCTION

NOM : CH Sacré-Cœur

ADRESSE : 1, Avenue du Sacré-Cœur

VILLE : Québec, Qc, G1M 3W1

CONTACT : _____

TÉLÉPHONE : _____

POINT DE VÉRIFICATION

	OUI	NON	N/A
1. Les micro-interrupteurs sont présents	☒	☐	☐
2. Le système est relié au panneau d'alarme incendie	☒	☐	☐
3. Le manomètre indique une pression normale	☒	☐	☐
4. La tuyauterie du réseau est fixée solidement	☒	☐	☐
5. Les gicleurs sont tous orientés adéquatement	☒	☐	☐
6. Les sceaux et capuchons sont tous présents	☒	☐	☐
7. La station d'activation est visible et accessible	☒	☐	☐

FUSIBLE : ML 280F ☐ 360F ☒ 450F ☐ FENWALL ☐
QTÉ : 4
DATE : 2026

CARTOUCHE ACTIVATION

☐ 12 grm	☐ 236.8 grm	Ansul :			
☐ 16 grm	☐ Amerex	101-10	101-20	101-30	Double
☐ N/A	☐ Buckeye	☐	☐	☐	☒

DERNIÈRE INSPECTION

JOUR 05 MOIS 05 ANNÉE 2026

PROCHAINE INSPECTION

JOUR _____ MOIS 11 ANNÉE 2026

SERVICE

☒ Annuel ☐ Modification ☐ Hydrostatique
☐ Semi-Annuel ☐ Installation ☐ Autres

Ansul ☐ 1.5 ☐ 3 ☐ 4.5 ☐ 6 ☒ 9
SF/A ☒

PyroChem 300 ☐ 460 ☐ 600 ☐ Autre ☐
PCL ☐

Protex L 2400 ☐ 3000 ☐ 4600 ☐ 6000 ☐ Autre ☐

Buckeye 5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐
BFR ☐

Amerex KP 275 ☐ 375 ☐ 475 ☐ 600 ☐

Kidde whdr ☐ 125 ☐ 260 ☐ 400 ☐ 600 ☐
SF/P ☐

R-Guard 1.25 ☐ 2.5 ☐ 4C ☐ 4M ☐ 4L ☐ 6 ☐

Perfect Fry ☐

TÊTE DE CONTRÔL

☐ Amerex ☐ Kidde XV
☐ Cab R-102 ☐ Kidde Sentinel
☒ Cab-SF/A ☐ Ansul Piranha
☐ Buckeye SMR ☐ RG Trimpack
☐ RG A+ ☐ Protex
☐ Pyrochem

Arrêt des appareils de cuisson

Électrique ☐ Localisation

Valve à gaz ☒

Points permis : 33 Utilisés : 22


Points permis : _____ Utilisés : _____

Année Fab Cylindre : _____

Test Hydrostatique : 2022

Dû : ☐

LOCALISATION DU SYSTÈME :

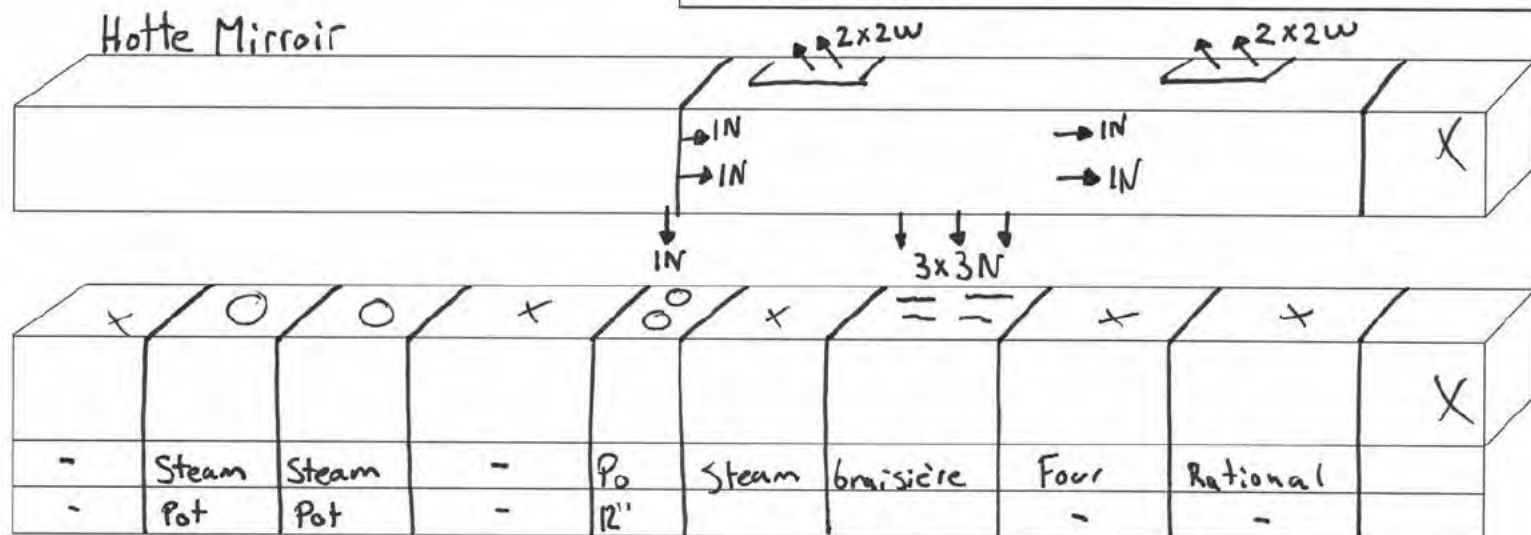

MATÉRIEL PROTÉGÉ :	OUI	NON	MATÉRIEL PROTÉGÉ :	OUI	NON	MATÉRIEL PROTÉGÉ :	OUI	NON	MATÉRIEL PROTÉGÉ :	OUI	NON
Plénum de hotte	☒	☐	Poêle sans tablette	☒	☐	Braisière	☒	☐	Plaque à bouillir	☐	☐
Conduit ventilation	☒	☐	Poêle avec tablette	☐	☐	Shawarma	☐	☐	Plaque à frire	☐	☐
Friteuse à patate	☐	☐	Poêle chinois	☐	☐	Charcoal	☐	☐	Plaque à induction	☐	☐
Friteuse à poulet	☐	☐	Wok	☐	☐	Four rotatif pizza	☐	☐	Salamandre	☐	☐
Friteuse à beigne	☐	☐	Stock Pot	☐	☐	Tandori	☐	☐	Giro	☐	☐

Longueur de la hotte : 1 20' 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____
Dimension conduit : 1 23x23 2 23x23 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____

Dernière inspection de Coupe-Feu Qc : Extincteurs portatifs _____ Éclairages d'urgence _____

Commentaires : _____

À cette date, le système ci-haut mentionné a été vérifié et inspecté selon les normes et les standards des éditions adoptées par NFPA-96-17A et selon les manuels d'entretiens du fabricant

☒ Le système est conforme aux recommandations et aux standards des éditions adoptées par NFPA-96-17A et selon les manuels d'entretien du fabricant
☐ Le système est non-conforme et nécessite des modifications aux recommandations et aux standards des éditions adoptées par NFPA-96-17A et selon les manuels d'entretien du fabricant.

Nom du technicien

Art. 53, 54 et 56
LADOP

31868

Rapport d inspection Génératrices



numéro de rapport
d'inspection

RIG-01851

de contrat et détail de l'équipement


131250 - CIUSSS

03 - Capitale-Nationale

1, avenue du Sacré-Cœur, Québec, G1N2W1 - CIUSSS
DE LA CAPITALE-NATIONALE - SIEGE SOCIAL -
CENTRE D'HEBER. DU SACRE-CŒUR

génératrice - KOHLER/400REOZVC/2302461

Nom du technicien



Art. 53, 54 et 56 LADOP

Date de début

vendredi, mars 28, 2025

Heure de début

06:00

Heure de fin

09:30

Compteur (hr)

391

Type d'entretien

Semestriel

Fonctionnement des protections (= TABLEAU 1 CSA 282)

	Voyant Lumineux	Alarme à distance	Arret du groupe	Notes / observations
Lancement infructueux CSA 282-19 pour 1-2 -3	C			
Température de moteur basse CSA 282-19 pour 1-2	C			
Alarme préalable de surchauffe moteur CSA 282-19 pour 1-2	C			

	Voyant Lumineux	Alarme à distance	Arret du groupe	Notes / observations
Surchauffe Moteur CSA 282-19 pour 1-2-3	C			
Alarme préalable de basse pression d'huile	C			
Basse pression d'huile CSA 282-19 pour 1-2-3	C			
Survitesse CSA 282-19 pour 1-2-3	C			
Épuisement prochain de la réserve de carburant CSA 282-19 pour 1-2	C			
Alimentation de secours en circuit avec la charge	C			
Interrupteur de contrôle N'EST PAS en position Automatique CSA 282-19 pour 1	C			
Tension des accumulateurs faible CSA 282-19 pour 1-2	C			
Essai des lampes témoin CSA 282-19 pour 1	C			
Contacts pour Alarmes communes CSA 282-19 pour 1-2-3	C			
Interrupteur d'arrêt de l'alarme sonore CSA 282-19 pour 2	C			
Volet de coupure d'air CSA 282-19 pour 1-2	C			
Arrêt d'urgence à distance	C			

	Voyant Lumineux	Alarme à distance	Arret du groupe	Notes / observations
Bas niveau de liquide de refroidissement CSA 282-19 pour 1-2	C			
Registre de ventilation fermés	C			
Détection de fuite de l'enceinte du réservoir journalier CSA 282-19 pour 1-2	C			
Commutateur automatique en mode dérivation CSA 282-19 pour 1-2	C			
sous fréquence et sous vitesse	C			
Surintensité	C			
Sous-tension	C			
Disjoncteur principal ouvert CSA 282-19 pour 1-2	C			
Tension normale présente sur le commutateur	C			
tension d'urgence présente sur le commutateur	C			

Entretien Hebdomadaire

NIVEAU DE CARBURANT (%) 100

NIVEAU LUBRIFIANT MOTEUR (%) 100

NIVEAU DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT (%) 90

Commentaires Rajouter 1galon de prestone rouge

2.1 - Produits non durables

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Vérifier le moteur, la génératrice, les réservoirs de carburant et les circuits de refroidissement à la recherche de fuites.				
Vérifier le fonctionnement de la pompe à carburant (s'il y a lieu)				
Vérifier si le filtre à carburant est contaminé, s'il est muni d'une cuve transparente.				

2.2 - Système de démarrage

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Démarrreur électrique: Examiner le démarrreur pour en vérifier la propreté, la solidité du montage et le serrage des connexions.				
Démarrreur à air comprimé				
(i) Vérifier la pression des réservoirs d'air.				

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
(ii) Vérifier l'étanchéité des soupapes.			✓	
(iii) Vérifier le fonctionnement du moteur et du compresseur auxiliaire.			✓	
(iv) Évacuer les condensats.			✓	

2.3 - Batteries et dispositifs de charge.

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Vérifier le niveau d'électrolyte de tous les éléments de batterie s'applique uniquement aux batteries au plomb-acide ouvertes ou noyées			✓	
Vérifier la densité de l'électrolyte de tous les éléments de batterie (s'applique uniquement aux batteries au plomb-acide ouvertes ou noyées.			✓	
Examiner les connexions électriques pour en vérifier le serrage et l'absence de corrosion.	✓			
Vérifier la propreté et l'absence de dépôts liquides entre les bornes de batterie.	✓			
Vérifier la propreté et le serrage des connexions du chargeur.	✓			
Vérifier le fonctionnement des modes de maintien et de compensation du chargeur.	✓			

Vérification des batteries

	#1	#2	#3	#4
Niveau d'électrolytes				
Densité d'électrolytes				
Voltage (Volt DC)	13.05	13.03		

2.4 - Moteur

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Vérifier le fonctionnement des réchauffeurs de lubrifiant et (ou) de liquide de refroidissement.	✓			
Vérifier la tringlerie de commande du régulateur et le niveau d'huile	✓			
Vérifier le fond du carter de la pompe à carburant (s'il y a lieu).	✓			
Vérifier la tension et l'usure des courroies du ventilateur.	✓			

2.5 - Tableau des commandes

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Vérifier si les couvercles du tableau sont bien refermés.	✓			
Vérifier le fonctionnement des lampes témoins.	✓			
Vérifier les réglages du tableau de commande (s'assurer que l'appareil est prêt pour le démarrage automatique).	✓			

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Vérifier les signaux d'alarme visuels et sonores éloignés, sur le panneau d'alarme d'incendie du bâtiment.	✓			
Vérifier le réglage des volets de régulation d'air.	✓			
Vérifier les appareils d'éclairage de secours.	✓			
S'assurer que la température ambiante est supérieure à 10 °C.	✓			
Vérifier la propreté des locaux de la génératrice et des commutateurs et l'accessibilité à tous les composants du système de secours.	✓			
Corriger tous les défauts trouvés durant les vérifications et les essais.	✓			

Les détails des tableaux 2, les inspections, les essais sont notées dans le journal de bord :

non

Entretien Mensuel

3.2 - Essai du système complet

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
Simuler une panne de l'alimentation électrique normale du bâtiment.	✓			
Vérifier que la puissance du courant de sortie du chargeur d'accumulateurs augmente lors du lancement.	✓			
Faire fonctionner le système à au moins 40 % de la charge nominale pendant 60 minutes.	✓			
Manoeuvrer tous les commutateurs automatiques sous charge.	✓			
Vérifier le fonctionnement des balais et l'absence d'étincelles, le cas échéant.	✓			
Vérifier l'étanchéité des paliers.	✓			
Vérifier le fonctionnement de tout le matériel auxiliaire : commande des volets de radiateur, pompes à liquide de refroidissement, pompes à carburant, refroidisseurs d'huile et commandes de ventilation du local du moteur.	✓			
Vidanger le purgeur de condensats du système d'échappement.	✓			

Inscrire les lectures de tous les instruments dans le journal d’entretien (voir l’article 11.5.3) et s’assurer qu’elles sont normales.

	15 min	30 min	45 min	60 min	Autre
RPM	1800	1800	1800	1800	
TEMP AMB °C	13.2	12.9	12.1	11.1	
TEMP EAU °C	175	175	175	175	
TEMP ECHAP °C	180	171	166	172	
TEMP STATOR °C	19.2	17.9	19.9	17.7	
Température Huile °C	81.0	80.7	78.1	79.8	
PSI HUILE	N/F	N/F	N/F	N/F	
VOLT 1-2 (Vac)	600	600	600	600	
VOLT 1-3 (Vac)	600	600	600	600	
VOLT 2-3 (Vac)	600	600	600	600	
AMP 1 (Amp)	100	120	120	120	
AMP 2 (Amp)	100	120	120	120	
AMP 3 (Amp)	100	120	120	120	
Fréquence (Hz)	60.1	60.1	60.1	60.1	
BATTERIE (VOLT DC)	28.5	28.5	28.5	28.5	

3.3 - 3.6 VÉRIFICATION, CORRECTION ET INSPECTION

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
3.3 - Vérifier les tuyaux et les fils du chauffe-bloc.	✓			
3.4 - Corriger tous les défauts trouvés durant les inspections et les essais.	✓			
3.5 - Prendre note de toutes les inspections, les mises à l’essai et les mesures correctives dans le journal d’entretien (voir l’article 11.5.3).	✓			

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
3.6 - Inspecter tous les composants électriques pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement.	✓			

Les détails des tableaux 3, les inspections, les essais sont notées dans le journal de bord :

non

Entretien semestriel

4.2 - 4.5 VÉRIFICATION, CORRECTION ET INSPECTION

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
4.2 - Vérifier et nettoyer les reniflards du carter.	✓			
4.3 - Vérifier et nettoyer toute la tringlerie du moteur.	✓			
4.4 - Lubrifier le régulateur et le système de ventilation du moteur.	✓			
4.5 - Vérifier le fonctionnement des dispositifs de protection.	✓			

4.6 - Avant le démarrage, exécuter deux cycles complets de lancement (tel que spécifiés aux articles 10.4.1 et 10.4.2). Immédiatement avant la fin de chaque cycle (et pendant que le lancement est encore en cours), mesurer et consigner la tension d'accumulateur la plus faible. Si la tension mesurée est inférieure à 80 % de la tension nominale de l'accumulateur, remplacer l'accumulateur. Par ailleurs, effectuer un essai de charge de l'accumulateur à l'aide d'un testeur de charge approprié.

	#1	#2	#3	#4
TENSION NOMINAL DE LA BATTERIE (Volt DC)	13.05	13.03		
TENSION MESURÉE CYCLE 1 (Volt DC)	10.80	9.91		
TENSION MESURÉE CYCLE 2 (Volt DC)	10.76	10.37		
CCA NOMINAL DE LA BATTERIE (Amp)	1000	1000		
CCA MESURÉE (Amp)	855	908		
ESSAI DE CHARGE DE L'ACCUMULATEUR (Amp)	9	9		
A REMPLACER (COCHER 'R' SI DOIT ÊTRE REMPLACÉ)				

4.7 - 4.9 VÉRIFICATION, CORRECTION ET INSPECTION

	Conforme	Non conforme	N/A	Commentaires / Lectures
4.7 - Inspecter les courroies du système de ventilation.	✓			
4.8 - Corriger tous les défauts trouvés durant les inspections et les essais.	✓			
4.9 - Prendre note de toutes les inspections, les mises à l'essai et les mesures correctives dans le journal d'entretien (voir l'article 11.5.3).	✓			

Les détails des tableaux 4, les inspections, les essais sont notées dans le journal de bord :

non

Entretien annuel

Entretien Quinquennal

Informations supplémentaires

le client souhaite-t-il une soumission ?

non

Recommandations

Y a-t-il des recommandations

oui

description recommandations

Remplacer le filtre a air moteur au prochain entretien annuel

prendre une Photo



Galaxy A34 5G

Déficiences

Y a-t-il des déficiences

oui

description déficience

Sensor de pression d'huile défectueux.

Aucune lecture de pression d'huile sur le cadran et apres 20min il fait des up an down.

J'ai echanger les fils de pression d'huile et température pour valider que le cadran est bon.

Mit la sonde sur le multmetre et il est instable.

prendre une Photo



Informations supplémentaires

courriel au client	myra.gagnon.ciussscn@sss.gouv.qc.ca	
courriel du technicien		Art. 53 54 et 56 LADOP



765, Gabrielle-D'Anneville
Québec, Qc G1C 7E3
(581) 446-1911
WWW.SECURIGAZ.COM

Adresse de facturation :

CIUSSSCN - IUSMQ
2601, Ch. De la Canardière # M-5523
Québec (Qc), G1J 2G3

drf.comptesapayer.ciuussscn@ssss.gouv.qc.ca

SOUMISSION

N° SOUMISSION : S24 - 114

DATE : 14 JUIN 2024.

Adresse des travaux :

Édifice Sacré-Cœur
1, avenue du Sacré-Cœur
Québec (Qc), G1N 2W1
Mme. Myra Gagnon

DESCRIPTION	UNITÉ	MONTANT
MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DÉTECTION DE GAZ NATUREL ET RAJOUT DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE ' SALLE MÉCANIQUE ''		
DÉTECTEUR DE GAZ NATUREL '' CH4 '' MODÈLE : 22G05 - 5B	1	655,00 \$
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE MODÈLE : 22G02 - 5B	1	675,00 \$
TRANSFORMATEUR 120/24 VAC MODÈLE : MC50B	1	95,00 \$
MATÉRIELS ET ÉLECTRICIEN	1	295,00 \$
MISE EN MARCHÉ	1	95,00 \$
	SOUS-TOTAL	1 815,00 \$
	TPS	
	TVQ	
	TOTAL	

TPS : 780373106RT0001

TVQ : 1228755211TQ001

** Tous les prix indiqués dans la soumission est valide pour 30 jours **

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE !

Fiche d'inspection et d'essai annuel du réseau avertisseur d'incendie

Nom et Adresse **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**
du Bâtiment : 2, AVENUE DU SACRE-COEUR, QUEBEC

Date : 19 août 2024

Séquence d'alarme : 2 Étapes

Fabricant : E.S.T.

Modèle : EST-3

No de l'édifice :

No Proposition : 21-980-1017

La présente certifie que les renseignements contenus dans le rapport du réseau avertisseur d'incendie sont corrects et complets.

Les essais indiqués sur ce formulaire ne comprennent pas l'essai de fonctionnement des dispositifs auxiliaires.

E1. RAPPORT ANNUEL DE MISE À L'ESSAI ET D'INSPECTION

(Ref: 5.1.2)

- C. Inspection et mise à l'essai de tout le réseau avertisseur d'incendie conformément à la norme CAN/ULC-S536: Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie.
- D. La documentation du réseau avertisseur d'incendie est sur place et comporte une description du réseau avertisseur d'incendie.
- E. Le réseau surveillé est complètement en état de fonctionner.
- F. Le réseau avertisseur d'incendie ne présente aucune déficience décrite sur les pages ci-jointes.
- H. Une copie du présent rapport sera remise à la personne suivante, propriétaire ou représentant du propriétaire de ce bâtiment.



S/O



S/O

(Commentaire)

Art. 53, 54 et 56 LADOP

Nom du technicien principal qui effectue l'inspection et la mise à l'essai

Chubb

Compagnie

Numéro d'identification A.C.A.I. du technicien

418-681-0534

Téléphone

E2.1 MISE À L'ESSAI DU POSTE DE CONTRÔLE OU DU RÉPONDEUR

(Ref: 5.1.3, 5.2.2.1)

(Commentaire)

A. Fonctionnement de l'indicateur visuel de mise sous tension.	✓	
B. Fonctionnement du signal de défectuosité visuel commun.	✓	
C. Fonctionnement du signal de défectuosité sonore commun.	✓	
D. Fonctionnement de l'interrupteur de signalisation sonore de défectuosité.	✓	
E. Fonctionnement du signal de défectuosité de l'alimentation principale.	✓	
F. Fuite à la terre sur le signal de défectuosité positif et négatif.	✓	
G. Fonctionnement du signal d'alerte.	✓	20 cpm
H. Fonctionnement du signal d'alarme.	✓	Cadence : 120 cpm
I. Fonctionnement du passage automatique de signal d'alerte à signal d'alarme.	✓	Temps : 5 Min.
J. Fonctionnement du passage manuel de signal d'alerte à signal d'alarme.	✓	
K. Caractéristique (accusé de réception) d'annulation du passage automatique de signal d'alerte à signal d'alarme fonctionnant sur un réseau à deux étapes.	✓	
L. Fonctionnement de la désactivation de l'interruption du signal d'alarme sonore.	S/O	
M. Fonctionnement de l'interruption manuelle du signal d'alarme sonore.	✓	
N. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.	✓	
O. Déclenchement automatique du signal d'alarme sonore, après interruption, en cas de réception d'alarme subséquente.	✓	
P. Temporisation automatique d'annulation du signal d'alarme sonore.	S/O	
Q. Signaux d'alerte et d'alarme sonores et visuels programmés et fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C : Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.	✓	
R. Fonctionnement d'alarme et de surveillance du circuit d'entrée, y compris les indications sonores et visuelles.	✓	
S. La surveillance des défauts sur un circuit d'entrée entraîne une indication de défectuosité.	✓	
T. Fonctionnement des indicateurs d'alarme du circuit de sortie.	✓	
U. La surveillance des défauts sur un circuit de sortie entraîne une indication de défectuosité.	✓	
V. Essai d'indicateur visuel (essai des lampes).	✓	
W. Séquences de signal codé fonctionnant au moins le nombre de fois nécessaire et suivies d'un déclenchement de signal d'alarme approprié.	S/O	
X. Séquences de signal codé non interrompues par une alarme subséquente.	S/O	
Y. Une dérivation du circuit du dispositif auxiliaire provoque un signal de défectuosité.	✓	
Z. Fonctionnement du circuit d'entrée vers le circuit de sortie, y compris les circuits des dispositifs auxiliaires pour assurer le bon fonctionnement du programme, selon la conception et les spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur incendie.	✓	
AA. Fonctionnement du réarmement du réseau avertisseur d'incendie.	✓	
BB. Fonctionnement de la commutation de l'alimentation principale à l'alimentation de secours.	✓	
CC. Vérification de la confirmation du changement d'état (détecteurs de fumée seulement) (se reporter au paragraphe 5.7.4.3, Confirmation de changement d'état. Fonction de vérification d'alarme).	S/O	
DD. Réception de la transmission d'un signal d'alarme à la centrale de réception d'alarme incendie.	✓	
EE. Réception de la transmission d'un signal de surveillance à la centrale de réception d'alarme incendie.	✓	
FF. Réception de la transmission d'un signal de défectuosité à la centrale de réception d'alarme incendie.	✓	
GG. Nom de la centrale de réception d'alarme incendie.	✓	Microtec
Numéro de téléphone de la centrale de réception d'alarme incendie.		Aviser l'agent sécurité de l'Hopital Général : (418) 529-0931 poste [REDACTED]

HH. Le déclenchement du sectionneur de la centrale de réception d'alarme incendie produit une indication de défectuosité précise au poste de contrôle ou au répondeur et achemine un signal de défectuosité à la centrale de réception d'alarme incendie.

E2.2 ESSAI DE COMMUNICATION PHONIQUE

(Ref: 5.1.3, 5.2.3.1)

(NON APPLICABLE)

E2.3 INSPECTION DU POSTE DE CONTRÔLE OU DU RÉPONDEUR

(Ref: 5.1.3, 5.2.4.1)

(Commentaire)

- A. Désignations des circuits d'entrée correctement indiquées et correspondant aux dispositifs raccordés.
- B. Désignations des circuits de sortie correctement repérées et correspondant aux dispositifs raccordés.
- C. Désignations des fonctions de contrôle communes et des indicateurs communs correctes.
- D. Composants enfichables et modules solidement en place.
- E. Câbles enfichables solidement en place.
- F. Date, révision et version des microprogrammes et du programme logiciel consignés.
- G. Propre et exempt de poussière et de saleté.
- H. Fusibles conformes aux spécifications du fabricant.
- I. Verrouillage du poste de contrôle ou du répondeur.
- J. Solidité des connexions du câblage aux dispositifs.



05.30.00

E2.4 INSPECTION DE L'ALIMENTATION

(Ref: 5.1.3, 5.3.1)

(Commentaire)

- A. Protection fusible correspondant aux caractéristiques nominales affichées par le fabricant.
- B. Alimentation suffisante pour les besoins du réseau.



Corridor près de 114
Panneau 0114B-U/OR17-U1
Disj. #10 (PAI 01-02)

E2.4 INSPECTION DE L'ALIMENTATION

(Ref: 5.1.3, 5.3.1)

(Commentaire)

- A. Protection fusible correspondant aux caractéristiques nominales affichées par le fabricant.
- B. Alimentation suffisante pour les besoins du réseau.



Corridor face R-18
Panneau OR29U
Disj. #4 (BPS)

E2.5 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ALIMENTATION DE SECOURS

(Ref: 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3)

Emplacement des batteries :		(Commentaire)
Type de batteries :		Dans NODE 01 (PAI 01)
		2 X 12V 18Ah
A. Type de batterie recommandé par le fabricant.	☒	
B. Caractéristiques nominales suffisantes d'après les calculs fondés sur la pleine charge du réseau.	☒	
C. Tension de batteries lorsque la source d'alimentation principale est sous tension.	☒	27 Vcc
D. Tension de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en mode surveillance.	☒	26 Vcc
Courant de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en mode surveillance.		1 Amp
E. Tension de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en pleine charge d'alarme.	☒	25 Vcc
Courant de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en pleine charge d'alarme.		2 Amp
F. Courant de charge.	☒	3 Amp
G. Recherche de dommages matériels.	☒	
H. Bornes nettoyées et lubrifiées.	☒	
I. Bornes serrées.	☒	
J. Niveau d'électrolyte correct.	S/O	
K. Densité de l'électrolyte conforme aux spécifications du fabricant.	S/O	
L. Aucune fuite d'électrolyte.	S/O	
M. Ventilation adéquate.	☒	
N. Code dateur du fabricant ou la date de mise en service.	☒	Date : 11-2021
O. Débranchement provoquant un signal de défectuosité.	☒	
P. Indiquer le type d'essai de batterie exécuté. (A = Test 24 heures, B = Résistance de charge, C = Essai accéléré, D = Avec Capacimètre, E = Remplacer les batteries)	☒	D (70% - 60%)
Q. Consigner la capacité de la batterie calculée (voir l'article F4.1-C)	☒	53,2 Ah
R. Après la fin des essais, consigner la tension aux bornes de la batterie.	☒	23,88 Vcc
S. Après les essais, la tension de batteries n'est pas inférieure à 85% de la tension nominale.	☒	
T. Le générateur fournit l'alimentation au circuit c.a. qui dessert le réseau avertisseur d'incendie.	☒	
U. Une situation de défectuosité au générateur d'urgence doit provoquer un signal de défectuosité sonore commun ainsi qu'une indication visuelle sur l'annonceur correspondant.	☒	

E2.5 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ALIMENTATION DE SECOURS

(Ref: 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3)

Emplacement des batteries :		(Commentaire)
Type de batteries :		Dans NODE 01 (PAI 02)
		2 X 12V 18Ah
A. Type de batterie recommandé par le fabricant.		
B. Caractéristiques nominales suffisantes d'après les calculs fondés sur la pleine charge du réseau.		
C. Tension de batteries lorsque la source d'alimentation principale est sous tension.		27 Vcc
D. Tension de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en mode surveillance.		26 Vcc
Courant de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en mode surveillance.		0,4 Amp
E. Tension de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en pleine charge d'alarme.		25 Vcc
Courant de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en pleine charge d'alarme.		11 Amp
F. Courant de charge.		2 Amp
G. Recherche de dommages matériels.		
H. Bornes nettoyées et lubrifiées.		
I. Bornes serrées.		
J. Niveau d'électrolyte correct.	S/O	
K. Densité de l'électrolyte conforme aux spécifications du fabricant.	S/O	
L. Aucune fuite d'électrolyte.	S/O	
M. Ventilation adéquate.		
N. Code dateur du fabricant ou la date de mise en service.		Date : 11-2021
O. Débranchement provoquant un signal de défectuosité.		
P. Indiquer le type d'essai de batterie exécuté. (A = Test 24 heures, B = Résistance de charge, C = Essai accéléré, D = Avec Capacimètre, E = Remplacer les batteries)		D
Q. Consigner la capacité de la batterie calculée (voir l'article F4.1-C)		26,2 Ah
R. Après la fin des essais, consigner la tension aux bornes de la batterie.		25,07 Vcc
S. Après les essais, la tension de batteries n'est pas inférieure à 85% de la tension nominale.		
T. Le générateur fournit l'alimentation au circuit c.a. qui dessert le réseau avertisseur d'incendie.		
U. Une situation de défectuosité au générateur d'urgence doit provoquer un signal de défectuosité sonore commun ainsi qu'une indication visuelle sur l'annonceur correspondant.		

(Ref: 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3)

(Commentaire)

Dans BPS
Salle m c. R27F
Via R27C/D)
2 X 12V 7.5Ah

- | | | |
|---|-----|----------------|
| A. Type de batterie recommandé par le fabricant. | | |
| B. Caractéristiques nominales suffisantes d'après les calculs fondés sur la pleine charge du réseau. | | |
| C. Tension de batteries lorsque la source d'alimentation principale est sous tension. | | 26 Vcc |
| D. Tension de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en mode surveillance. | | 25 Vcc |
| Courant de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en mode surveillance. | | 0,1 Amp |
| E. Tension de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en pleine charge d'alarme. | | 25 Vcc |
| Courant de batteries, alimentation principale coupée et réseau avertisseur d'incendie en pleine charge d'alarme. | | 0,5 Amp |
| F. Courant de charge. | | 0,4 Amp |
| G. Recherche de dommages matériels. | | |
| H. Bornes nettoyées et lubrifiées. | | |
| I. Bornes serrées. | | |
| J. Niveau d'électrolyte correct. | S/O | |
| K. Densité de l'électrolyte conforme aux spécifications du fabricant. | S/O | |
| L. Aucune fuite d'électrolyte. | S/O | |
| M. Ventilation adéquate. | | |
| N. Code dateur du fabricant ou la date de mise en service. | | Date : 11-2022 |
| O. Débranchement provoquant un signal de défectuosité. | | |
| P. Indiquer le type d'essai de batterie exécuté. (A = Test 24 heures, B = Résistance de charge, C = Essai accéléré, D = Avec Capacimètre, E = Remplacer les batteries) | | D (80% - 80%) |
| Q. Consigner la capacité de la batterie calculée (voir l'article F4.1-C) | | 4,1 Ah |
| R. Après la fin des essais, consigner la tension aux bornes de la batterie. | | 25,73 Vcc |
| S. Après les essais, la tension de batteries n'est pas inférieure à 85% de la tension nominale. | | |
| T. Le générateur fournit l'alimentation au circuit c.a. qui dessert le réseau avertisseur d'incendie. | | |
| U. Une situation de défectuosité au générateur d'urgence doit provoquer un signal de défectuosité sonore commun ainsi qu'une indication visuelle sur l'annonceur correspondant. | | |

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Corridor 200 Est

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Corridor 300 Est

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Corridor 200 Ouest

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Corridor 300 Ouest

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Corridor 500 Ouest

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Communauté
Entrée principale 1A

E2.6 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'ANNONCIATEUR ET DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À

DISTANCE (Ref: 5.1.4, 5.4.1)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Zones d'entrées individuelles d'alarme et de surveillance indiquées clairement, de manière distincte.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquées.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel. (essai de lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnant conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.
- L. Fonctionnement sur l'alimentation de secours.



Accueil 134 Ouest

E2.7 ANNONCIATEURS OU AFFICHAGES SÉQUENTIELS

(Ref: 5.1.4, 5.4.2)

(Commentaire)

- A. Fonctionnement de l'indicateur de mise sous tension.
- B. Fonctionnement de l'indication de zone individuelle d'alarme et de surveillance.
Exception : L'indication de zone individuelle d'alarme et de surveillance donnera la même indication ou allumera les mêmes indicateurs sur le ou les autres annonceurs et affichages séquentiels.
Pour confirmer le bon fonctionnement des zones d'alarme et de surveillance, il faut mettre à l'essai au moins une zone d'alarme et de surveillance par annonceur ou affichage séquentiel.
- C. Étiquettes de désignation des zones individuelles d'alarme et de surveillance correctement marquée.
- D. Fonctionnement du signal de défectuosité commun.
- E. Fonctionnement de l'essai d'indicateur visuel (essai des lampes)
- F. Surveillance du câblage d'entrée du poste de contrôle ou du répondeur.
- G. Fonctionnement de l'indicateur visuel d'interruption du signal d'alarme sonore.
- H. Contacts de fonctions auxiliaires fonctionnent conformément à la conception et aux spécifications; documentation décrite à l'annexe C: Description du mode opératoire d'inspection et de mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie.
- I. Fonctionnement des autres indicateurs visuels des fonctions auxiliaires.
- J. Actionnement manuel du signal d'alarme et indication.
- K. Affichages visibles dans le lieu de l'installation.



Afficheur du PCAI

E2.8 MISE À L'ESSAI ET INSPECTION DE L'INDICATEUR DE DÉFECTUOSITÉ À DISTANCE

(Ref: 5.1.4, 5.4.3)

(NON APPLICABLE)

E2.9 MISE À L'ESSAI DE L'IMPRIMANTE

(Ref: 5.1.4, 5.5.1)

(NON APPLICABLE)

E2.10 MISE À L'ESSAI DE LA LIAISON DE DONNÉES

(Ref: 5.1.5, 5.6-Note)

- A. Confirmer la réception d'un signal de défectuosité par le poste de contrôle ou le répondeur en cas de boucle ouverte pour chaque liaison de données.
- B. Si des modules d'isolation en cas de défaut font partie de liaisons de données desservant des dispositifs, court-circuiter le câblage du côté isolé et confirmer l'annonce de la défectuosité; faire ensuite fonctionner un dispositif du côté source et confirmer l'activation au poste de contrôle ou au répondeur.
- C. Si l'isolation en cas de défaut des liaisons de données est assurée entre les postes de contrôle ou les répondeurs, court-circuiter le câblage entre chaque paire de postes de contrôle ou répondeurs, confirmer l'annonce de la défectuosité et confirmer le fonctionnement à l'extérieur de la zone court-circuitée.

(Commentaire)



Boucles adressables



Modules isolateurs



Liaisons PAI - Annonceurs

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 1 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Marquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 1 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
											12
PANNEAUX DE CONTRÔLE											
LOCAL 135	PAI	EST-3	1		A			A	A	A	1
LOCAL 135	PAI	EST-3	2		A			A	A	A	
PANNEAUX ANNONCIATEURS											
CORRIDOR 200 EST	ANN	3-LCDANN	3		A			A	A		
CORRIDOR 300 EST	ANN	3-LCDANN	4		A			A	A		
POSTE GARDE 200 OUEST	ANN	3-LCDANN	5		A			A	A		
POSTE GARDE 300 OUEST	ANN	3-LCDANN	6		A			A	A		
CORRIDOR 500 OUEST	ANN	3-LCDANN	7		A			A	A		
COMMUNAUTÉ ENTRÉE PRINC. 1A	ANN	3-LCDANN	8		A			A	A		
ACCUEIL 134 OUEST	ANN	3-LCDANN	9		A			A	A		
ALIMENTATION AUXILIAIRE											
SALLE MÉC. R27F VIA LOCAL CHARIOTS LINGE SOUILLÉ	BPS	BPS6A	01 05 0149		A			A	A	A	
MODULES ISOLATEURS											
MUR CHAUFFERIE DESSUS ESC. PASSERELLE VERS TUNNELS											
CHAUFFERIE R.-C. ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 05 0001		A						
EN HAUTEUR MUR CHAUFFERIE PRES ENTREE GICLEURS PRINCIPALE											
CHAUFFERIE ÉTAGE ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 05 0002		A						
DANS PANNEAU 01											
ISOLATEUR 3e & 4e NORD	EM	SIGA-IM	01 04 0052		A						
ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 03 0077		A						
ISOLATEUR 5e ÉTAGE	EM	SIGA-IM	01 03 0327		A						
ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 03 0326		A						
ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 03 0325		A						
ISOLATEUR 3e NORD	EM	SIGA-IM	01 04 0051		A						
ISOLATEUR 2e & 3e NORD	EM	SIGA-IM	01 04 0050		A						
ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 04 0049		A						

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 2 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation /	Note
ISOLATEUR AILE 1	EM	SIGA-IM	01 02 0020	A							
ISOLATEUR AILE 1	EM	SIGA-IM	01 02 0019	A							
ISOLATEUR BOUCLE 0102	EM	SIGA-IM	01 02 0276	A							
ISOLATEUR	EM	SIGA-IM	01 03 0076	A							
ISOLATEUR BOUCLE 0102	EM	SIGA-IM	01 02 0275	A							
COMMUNAUTE NIV. 0 CAVE ST-AMABLE - GICLEURS	EM	SIGA-IM	01 02 0035	A							
ISOLATEUR RDC SALLE MECANIQUE LAVERIE	EM	SIGA-IM	01 05 0006	A							
ISOLATEUR SYSTEME VENTILATION LAVERIE	EM	SIGA-IM	01 05 0007	A							
ISOLATEUR ESCALIER LOCAL SS7	EM	SIGA-IM2	01 05 0009	A							
ISOLATEUR LOCAL SS7	EM	SIGA-IM2	01 05 0010	A							
DÉTECTION											3,23,24,25,26,27
PUITS ASC. #5 - AILE NORD	S	SIGA-PS	01 04 0053								15
PUITS ASC. #4 - AILE EST	S	SIGA-PS	01 03 0329								16
PUITS ASC. #3 - AILE EST	S	SIGA-PS	01 03 0328								16
PUITS MONTE-CHARGE - AILE EST	S	SIGA-PS	01 03 0330								16
PUITS ASCENSEUR 1 - AILE OUEST	S	SIGA-PD	01 02 0277								16,31
PUITS ASCENSEUR 2 - AILE OUEST	S	SIGA-PS	01 02 0269								16
AILE NORD 5e ETAGE											
CABANON ASCENSEUR #5	S	SIGA-PS	01 04 0048	A		A	A				
CABANON ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 04 0148	A		A	A				
CABANON ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 04 0149	A		A	A				
PUITS ESCALIER 401	S	SIGA-PS	01 04 0041	A		A	A				
AILE NORD - 4e ETAGE											
PUITS ESCALIER 421	S	SIGA-PS	01 04 0047	A		A	A				
CORRRIDOR PRÈS 421 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0146	A		A	A				
CORRRIDOR PRÈS 421 AG	AG	CLE	01 04 0147	A		A	A				
CORRRIDOR FACE À 420	S	SIGA-PS	01 04 0046	A		A	A				
CORRRIDOR FACE À 411	S	SIGA-PS	01 04 0045	A		A	A				
LOCAL 403	S	SIGA-PS	01 04 0044	A		A	A				
CORRRIDOR FACE À 403	S	SIGA-PS	01 04 0043	A		A	A				
LOCAL TELEPHONE PRÈS 403	S	SIGA-PS	01 04 0042	A		A	A				

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 3 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
CORRRIDOR PRÈS 401 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0144		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 401 AG	AG	CLE	01 04 0145		A			A	A		
AILE NORD - 3e ÉTAGE											
CORRRIDOR PRÈS 325 PS	M	SIGC-270PB C	01 04 0142		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 325 AG	AG	CLE	01 04 0143		A			A	A		
E-AIMANT PORTE 325	AD	CONT. N/F			A			A	A		
RANGEMENT 323	S	SIGA-PS	01 04 0004		A			A	A		
CORRRIDOR FACE 315	S	SIGA-PS	01 04 0039		A			A	A		
CORRRIDOR FACE 308	S	SIGA-PS	01 04 0040		A			A	A		
CORRRIDOR FACE 301	S	SIGA-PS	01 04 0036		A			A	A		
LOCAL 302	S	SIGA-PS	01 04 0038		A			A	A		
LOCAL 303	S	SIGA-PS	01 04 0037		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 301 PS	M	SIGC-270PB C	01 04 0140		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 301 AG	AG	CLE	01 04 0141		A			A	A		
E-AIMANT PORTE 301	AD	CONT. N/F			A			A	A		
AILE NORD - 2e ÉTAGE											
CORRRIDOR PRÈS 221 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0138		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 221 AG	AG	CLE	01 04 0139		A			A	A		
CORRIDOR FACE 214	S	SIGA-PS	01 04 0035		A			A	A		
LOCAL 204 (clé medeco) (accès en arrière)	S	SIGA-PS	01 04 0033		A			A	A		
CORRIDOR FACE 211	S	SIGA-PS	01 04 0034		A			A	A		
LOCAL 203	S	SIGA-PS	01 04 0032		A			A	A		
LOCAL 202A	S	SIGA-PS	01 04 0056		A			A	A		
CORRIDOR FACE A 201	S	SIGA-PS	01 04 0030		A			A	A		
LOCAL 201 (PAR ESCALIER)	S	SIGA-PS	01 04 0031		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 201 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0136		A			A	A		
CORRRIDOR PRÈS 201 AG	AG	CLE	01 04 0137		A			A	A		
AILE NORD - 1er ÉTAGE											
AILE NORD 1ER ETAGE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PD	01 04 0016		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PD	01 04 0017		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PD	01 04 0018		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 4 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
AILE NORD 1ER ETAGE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PD	01 04 0019		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PD	01 04 0020		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PD	01 04 0021		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE SCENE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PS	01 04 0022		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE SCENE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PS	01 04 0023		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE SCENE BIBLIOTHEQUE	S	SIGA-PS	01 04 0024		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE LOCAL 110 (BIBLIOTHEQUE)	S	SIGA-PD	01 04 0027		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE LOCAL 109 (BIBLIOTHEQUE)	S	SIGA-PD	01 04 0026		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE LOCAL 108 (BIBLIOTHEQUE)	S	SIGA-PD	01 04 0025		A			A	A		
AILE NORD 1ER BIBLIOTHEQUE (PS)	M	SIGC-270B	01 04 0132		A			A	A		
AILE NORD 1ER BIBLIOTHEQUE(AG)	AG	CLE	01 04 0133		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE SCENE BIBLIOTHEQUE PRES 107 (PS)	M	SIGC-270B	01 04 0134		A			A	A		
AILE NORD 1ER ETAGE SCENE BIBLIOTHEQUE PRES 107 (AG)	AG	CLE	01 04 0135		A			A	A		
FACE À 102 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0130		A			A	A		
FACE À 102 AG	AG	CLE	01 04 0131		A			A	A		
LOCAL 103 FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 04 0012		A			A	A		
LOCAL 105	S	SIGA-PS	01 04 0013		A			A	A		
CORRIDOR FACE A 105	S	SIGA-PS	01 04 0014		A			A	A		
LOCAL 106 VIA TOILETTE 104 (43512)	S	SIGA-PS	01 04 0015		A			A	A		
AILE NORD - REZ-DE-CHAUSSEE											
CORRIDOR R-11 (EST)	S	SIGA-PS	01 04 0001		A			A	A		
HALL R-2 VIA R-1	SFD	SIGA-CT1	01 04 0154		A			A	A		
SORTIE 8	RHT	CR135	01 04 0154		A			A	A		
HALL R-2	S	SIGA-PS	01 04 0003		A			A	A		
LOCAL R-4 VIA R-1	S	SIGA-PS	01 04 0005		A			A	A		
HALL ASCENSEUR R-3	S	SIGA-PS	01 04 0002		A			A	A		
FACE À R-1 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0126		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 5 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives	Installé	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indicateurs	Surveillance	Observations / Recommandations / Notes
FACE À R-1 AG	AG	CLE	01 04 0127		A			A	A		
LOCAL R-5 VIA INFIRMERIE R-7	S	SIGA-PS	01 04 0006		A			A	A		
CORRIDOR FACE A R-8	S	SIGA-PS	01 04 0007		A			A	A		
CORRIDOR FACE A R-12	S	SIGA-PS	01 04 0008		A			A	A		
CORRIDOR FACE A R-15	S	SIGA-PS	01 04 0009		A			A	A		
CORRIDOR FACE A R-16 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0128		A			A	A		
CORRIDOR FACE A R-16 AG	AG	CLE	01 04 0129		A			A	A		
HALL SORTIE 10 PRÈS R-17	S	SIGA-PS	01 04 0010		A			A	A		
PUITS ESC. SOUS-SOL PORTE R-19	S	SIGA-PS	01 04 0011		A			A	A		
AILE NORD - SOUS-SOL											
SALLE MÉCANIQUE PS	M	SIGC-270PB	01 04 0150		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE AG	AG	CLE	01 04 0151		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE R-15	S	SIGA-PS	01 04 0028		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE R-15	S	SIGA-PS	01 04 0029		A			A	A		
SYSTÈME VENTILATION 6ER	DS	SIGA-PS/DH	01 04 0055		A			A	A		
AILE EST - 7 ^e ÉTAGE S.MÉC. (CABANON ASCENSEUR)											
SALLE MÉCANIQUE via 600-A	S	SIGA-PS	01 03 0321		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE via 600-A	S	SIGA-PS	01 03 0320		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE via 600-A	S	SIGA-PS	01 03 0322		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE via 600-A	S	SIGA-PS	01 03 0323		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE via 600-A (bas escalier)	M	SIGC-270PB	01 03 0392		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE via 600-A (bas escalier)	AG	CLE	01 03 0393		A			A	A		
AILE EST - 6 ^e ÉTAGE											
FACE ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 03 0376		A			A	A		
FACE ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 03 0377		A			A	A		
PUITS ESCALIER 602	S	SIGA-PS	01 03 0302		A			A	A		
FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 03 0303		A			A	A		
LOCAL 604	S	SIGA-PS	01 03 0324		A			A	A		18
CORRIDOR FACE 607	S	SIGA-PS	01 03 0306		A			A	A		
LOCAL 605	S	SIGA-PS	01 03 0307		A			A	A		
CHUTE À LINGE 613A	S	SIGA-PS	01 03 0309		A			A	A		
LOCAL 617 TOILETTE HOMME	S	SIGA-PS	01 03 0311		A			A	A		
CORRIDOR FACE 619	S	SIGA-PS	01 03 0312		A			A	A		
CORRIDOR FACE 627	S	SIGA-PS	01 03 0313		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 6 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
LOCAL 631 (ENTRÉE)	S	SIGA-PS	01 03 0315		A			A	A		
LOCAL 631-A (MILIEU)	S	SIGA-PS	01 03 0314		A			A	A		
LOCAL 631-B (FOND)	S	SIGA-PS	01 03 0333		A			A	A		
LOCAL 637	S	SIGA-PS	01 03 0332		A			A	A		
CORRIDOR FACE 637	S	SIGA-PS	01 03 0317		A			A	A		
LOCAL 639	S	SIGA-PS	01 03 0318		A			A	A		
CORRIDOR PRES 339 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0378		A			A	A		
CORRIDOR PRES 339 AG	AG	CLE	01 03 0379		A			A	A		
PUITS ESCALIER 641	S	SIGA-PS	01 03 0319		A			A	A		
MÉC. MONTE-CHARGE 620 VIA 618	S	SIGA-PS	01 03 0336		A			A	A		
ENTRE-PLAFOND CORR. FACE 639	SFD	SIGA-CT1	01 03 0405		A			A	A		7
ALARME FM-200 PANNEAU MIRCOM SALLE INFORMATIQUE	EOL	CONT. N/O RFL 47kΩ	01 03 0405		A			A	A		7
AILE EST - 5e ÉTAGE											
FACE ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 03 0382		A			A	A		
FACE ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 03 0383		A			A	A		
CORRIDOR FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 03 0292		A			A	A		
SALLE D'ATTENTE 501	S	SIGA-PS	01 03 0294		A			A	A		
LOCAL 501-A (clef CHU)	S	SIGA-PS	01 03 0293		A			A	A		
CORRIDOR FACE 509	S	SIGA-PS	01 03 0296		A			A	A		
LOCAL 515	S	SIGA-PS	01 03 0297		A			A	A		
CORRIDOR FACE 517	S	SIGA-PS	01 03 0298		A			A	A		
CORRIDOR FACE 525	S	SIGA-PS	01 03 0299		A			A	A		
LOCAL 533 SERVEUR	S	SIGA-PS	01 03 0300		A			A	A		
CORRIDOR FACE 537	S	SIGA-PS	01 03 0301		A			A	A		
FACE À 546 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0380		A			A	A		
FACE À 546 AG	AG	CLE	01 03 0381		A			A	A		
AILE EST - 4e ÉTAGE											
CORRIDOR FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 03 0281		A			A	A		
CORRIDOR FACE ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 03 0384		A			A	A		
CORRIDOR FACE ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 03 0385		A			A	A		
CORRIDOR FACE 405	S	SIGA-PS	01 03 0282		A			A	A		
CORRIDOR 401	S	SIGA-PS	01 03 0280		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 7 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
LOCAL 401-A (REPROGRAPHIE)	S	SIGA-PS	01 03 0279		A			A	A		
GARDE-ROBE PRÈS LOCAL 410	S	SIGA-PS	01 03 0283		A			A	A		
LOCAL 409 GARDE-ROBE	S	SIGA-PS	01 03 0284		A			A	A		
LOCAL 413 GARDE-ROBE	S	SIGA-PS	01 03 0285		A			A	A		
LOCAL 416	S	SIGA-PS	01 03 0286		A			A	A		
LOCAL 415	S	SIGA-PS	01 03 0287		A			A	A		
CORRIDOR FACE 415	S	SIGA-PS	01 03 0288		A			A	A		
CORRIDOR FACE 423	S	SIGA-PS	01 03 0289		A			A	A		
CORRIDOR FACE 433	S	SIGA-PS	01 03 0291		A			A	A		
LOCAL 431	S	SIGA-PS	01 03 0290		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 439 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0386		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 439 AG	AG	CLE	01 03 0387		A			A	A		
AILE EST - 3e ÉTAGE											
FACE ASCENSEUR	M	SIGC-270PB	01 03 0388		A			A	A		
FACE ASCENSEUR	AG	CLE	01 03 0389		A			A	A		
CORR. FACE ASCENSEUR 3	S	SIGA-PS	01 03 0251		A			A	A		
VESTIAIRE 304	S	SIGA-PS	01 03 0254		A			A	A		
UNITÉ INTENSIVE PRÈS 303	M	1534-2D-F	01 03 0421		A			A	A		
UNITÉ INTENSIVE PRÈS 303	AG	CLE	01 03 0420		A			A	A		
SALLE À MANGER 303	S	SIGA-PS	01 03 0252		A			A	A		
CUISINETTE 305 (switch fan derrière porte)	S	SIGA-PD	01 03 0253		A			A	A		
LOCAL 307	S	SIGA-PS	01 03 0255		A			A	A		
GARDE-ROBE 310 PRÈS DE 312	S	SIGA-PS	02 03 0257		A			A	A		
CORRIDOR FACE 312	S	SIGA-PS	01 03 0256		A			A	A		
CORRIDOR FACE 313	S	SIGA-PS	01 03 0258		A			A	A		
LOCAL 315	S	SIGA-PS	01 03 0259		A			A	A		
CHUTE À LINGE PAR 315	S	SIGA-PS	01 03 0260		A			A	A		
CHAMBRE 320	S	SIGA-PS	01 03 0331		A			A	A		
CORRIDOR FACE 321	S	SIGA-PS	01 03 0261		A			A	A		
CHAMBRE 321	S	SIGA-PS	01 03 0269		A			A	A		
CHAMBRE 323	S	SIGA-PS	01 03 0262		A			A	A		
CHAMBRE 325	S	SIGA-PS	01 03 0263		A			A	A		
CHAMBRE 330	S	SIGA-PS	01 03 0266		A			A	A		
CHAMBRE 332	S	SIGA-PS	01 03 0267		A			A	A		
CORRIDOR FACE 327	S	SIGA-PS	01 03 0265		A			A	A		
CHAMBRE 327	S	SIGA-PS	01 03 0264		A			A	A		
CHAMBRE 336	S	SIGA-PS	01 03 0268		A			A	A		
CHAMBRE 338	S	SIGA-PS	01 03 0271		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 8 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives	Installé	Manquant	Requis	Activé	Indice	Surveillance	Catégorie	Recommandation
UNITÉ INTENSIF FACE POSTE DE GARDE	S	SIGA-PS	01 03 0272		A			A	A			
PASSERELLE EXTRÊME EST	S	SIGA-PS	01 03 0275		A			A	A			
CHAMBRE 329	S	SIGA-PS	01 03 0277		A			A	A			
CHAMBRE 335	S	SIGA-PS	01 03 0276		A			A	A			
CHAMBRE 331	S	SIGA-PS	01 03 0270		A			A	A			
CHAMBRE 333	S	SIGA-PS	01 03 0273		A			A	A			
CORR PRÈS ESC PS FACE POSTE DE GARDE	M	1534-2D-F	01 03 0390		A			A	A			
CORR PRÈS ESC AG FACE POSTE DE GARDE	AG	CLE	01 03 0391		A			A	A			
UNITÉ INTENSIVE VERS PSYCHIATRIE	M	1534-2D-F	01 03 0406		A			A	A			
UNITÉ INTENSIVE VERS PSYCHIATRIE	AG	CLE	01 03 0407		A			A	A			
PSYCHIATRIE VERS UNITÉ INTENSIVE	M	1534-2D-F	01 03 0408		A			A	A			
PSYCHIATRIE VERS UNITÉ INTENSIVE	AG	CLE	01 03 0409		A			A	A			
AILE EST - 2e ÉTAGE											30	
FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 03 0051		A			A	A			
FACE ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 03 0126		A			A	A			
FACE ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 03 0127		A			A	A			
LOCAL 204-A	S	SIGA-PS	01 03 0055		A			A	A			
CORRIDOR FACE LOCAL 206	S	SIGA-PS	01 03 0053		A			A	A			
CHAMBRE 207 EST	S	SIGA-PS	01 03 0085		A			A	A			
CUISINETTE 203	S	SIGA-PS	01 03 0052		A			A	A			
CORRIDOR FACE 203	S	SIGA-PS	01 03 0054		A			A	A			
LOCAL 213	S	SIGA-PS	01 03 0057		A			A	A			
DÉPÔT 213-A	S	SIGA-PS	01 03 0059		A			A	A			
ARMOIRE DE RANGEMENT DANS 217	S	SIGA-PS	01 03 0058		A			A	A			
LINGERIE 217-A	S	SIGA-PS	01 03 0081		A			A	A			
CHAMBRE 216	S	SIGA-PS	01 03 0056		A			A	A			
LOCAL 221	S	SIGA-PS	01 03 0060		A			A	A			
ARMOIRE DANS LOCAL 219	S	SIGA-PS	01 03 0080		A			A	A			
PETIT CORRIDOR 222	S	SIGA-PS	01 03 0086		A			A	A			
CORRIDOR FACE LOCAL 221	S	SIGA-PS	01 03 0087		A			A	A			
CHAMBRE 222 C-D	S	SIGA-PS	01 03 0084		A			A	A			
CHAMBRE 224 A-B	S	SIGA-PS	01 03 0083		A			A	A			
CHAMBRE 224 C-D	S	SIGA-PS	01 03 0082		A			A	A			
LOCAL 226	S	SIGA-PS	01 03 0088		A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 9 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installé	Marqué	Requis	Activé	Indiqué	Surveillant	Catégorie Recommandée
CHAMBRE 223	S	SIGA-PS	01 03 0061		A			A	A		
CHAMBRE 225	S	SIGA-PS	01 03 0062		A			A	A		
CORRIDOR FACE 224A	S	SIGA-PS	01 03 0075		A			A	A		
LOCAL 227	S	SIGA-PS	01 03 0063		A			A	A		
LOCAL 227	S	SIGA-PS	01 03 0064		A			A	A		
CORRIDOR FACE 211	S	SIGA-PS	01 03 0066		A			A	A		
LOCAL 231	S	SIGA-PS	01 03 0065		A			A	A		
DÉPÔT 233	S	SIGA-PS	01 03 0070		A			A	A		
LOCAL 228	S	SIGA-PS	01 03 0067		A			A	A		
LOCAL 235	S	SIGA-PS	01 03 0072		A			A	A		
LOCAL 241 (VIA 235)	S	SIGA-PS	01 03 0089		A			A	A		
LOCAL 239 (VIA 235)	S	SIGA-PS	01 03 0071		A			A	A		18
LOCAL 230	S	SIGA-PS	01 03 0068		A			A	A		
LOCAL 232	S	SIGA-PS	01 03 0069		A			A	A		
CORRIDOR FACE DÉPÔT 243	S	SIGA-PS	01 03 0074		A			A	A		
SORTIE ESCALIER 200 EST PS	M	1534-2D-F	01 03 0167		A			A	A		
SORTIE ESCALIER 200 EST AG	AG	CLE	01 03 0168		A			A	A		
DÉPÔT 243	S	SIGA-PS	01 03 0073		A			A	A		
LOCAL 234 EST	S	SIGA-PS	01 03 0090		A			A	A		
S.M. PRÈS ASCENSEUR PRÈS 203	M	1534-2D-F	01 03 0423		A			A	A		
S.M. PRÈS ASCENSEUR PRÈS 203 A/G	AG	CLE	01 03 0422		A			A	A		
S.M. AILE EST PRÈS 225 P/S	M	1534-2D-F	01 03 0169		A			A	A		
S.M. AILE EST PRÈS 225 A/G	AG	CLE	01 03 0170		A			A	A		
S.M. AILE EST PRÈS 226 P/S	M	1534-2D-F	01 03 0171		A			A	A		
S.M. AILE EST PRÈS 226 A/G	AG	CLE	01 03 0172		A			A	A		
AILE EST - 1er ÉTAGE											
ARCHIVES 101	S	SIGA-PS	01 03 0048		A			A	A		
CORRIDOR FACE à 106	S	SIGA-PS	01 03 0028		A			A	A		
CORR. FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 03 0029		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 116 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0132		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 116 AG	AG	CLE	01 03 0133		A			A	A		
HALL ENTRÉE	S	SIGA-PS	01 03 0046		A			A	A		
ENTRÉE PRINCIPALE PS	M	SIGC-270PB	01 03 0130		A			A	A		
ENTRÉE PRINCIPALE AG	AG	CLE	01 03 0131		A			A	A		
CORRIDOR FACE À 107	S	SIGA-PS	01 03 0042		A			A	A		
LOCAL 107 (ARCHIVES)	S	SIGA-PS	01 03 0043		A			A	A		
LOCAL 108-A (VIA 108)	S	SIGA-PS	01 03 0045		A			A	A		
LOCAL 109 ARCHIVE	S	SIGA-PS	01 03 0044		A			A	A		
PASSAGE FACE 122	S	SIGA-PS	01 03 0041		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 10 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
LOCAL 129 ENTRETIEN SANITAIRE	S	SIGA-PS	01 03 0040		A			A	A		
CORRIDOR FACE À 126	S	SIGA-PS	01 03 0030		A			A	A		
CORRIDOR FACE 131	S	SIGA-PS	01 03 0039		A			A	A		
CORRIDOR FACE 135	S	SIGA-PS	01 03 0031		A			A	A		
LOCAL 149	RHT	SIGA-HRS	01 03 0037		A			A	A		
CORRIDOR PRES 151	S	SIGA-PS	01 03 0032		A			A	A		
LOCAL 151	RHT	SIGA-HRS	01 03 0034		A			A	A		
LOCAL 153	RHT	SIGA-HRS	01 03 0035		A			A	A		
LOCAL 155	RHT	SIGA-HRS	01 03 0038		A			A	A		
CORRIDOR FACE À 157	S	SIGA-PS	01 03 0033		A			A	A		
SORTIE 164 VIA 158	S	SIGA-PS	01 03 0036		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 163 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0134		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 163 AG	AG	CLE	01 03 0135		A			A	A		
CABANON TELUS	Zin	3-IDC8/4	02 03 0001		A			A	A		
CABANON EXT. PRES RÉCEPTION MARCHANDISES	RHT	281C			A			A	A		
AILE EST - REZ-DE-CHAUSSEE											
CORRIDOR FACE À R-5	S	SIGA-PS	01 03 0001		A			A	A		
SORTIE R-7-A PS	M	SIGC-270PB	01 03 0136		A			A	A		
SORTIE R-7-A AG	AG	CLE	01 03 0137		A			A	A		
CORRIDOR FACE À R-9	S	SIGA-PS	01 03 0003		A			A	A		
R-2-1 (FACE BUREAU R2-B)	S	SIGA-PS	01 03 0005		A			A	A		
R-2-2 (FACE BUREAU R2-C)	S	SIGA-PS	01 03 0004		A			A	A		
RANGEMENT DU CORR. R-11	S	SIGA-PS	01 03 0079		A			A	A		
LOCAL R-8	S	SIGA-PS	01 03 0007		A			A	A		
LOCAL R-6 VIA R-8	S	SIGA-PS	01 03 0008		A			A	A		
LOCAL R-2A VIA R-8	S	SIGA-PS	01 03 0006		A			A	A		
CORRIDOR FACE À R-4 (ASC.)	S	SIGA-PS	01 03 0002		A			A	A		
PRÈS LOCAL R-4 PS (ASC.)	M	SIGC-270PB	01 03 0138		A			A	A		
PRÈS LOCAL R-4 AG	AG	CLE	01 03 0139		A			A	A		
LOCAL R-13 (clé Medeco)	RHT	SIGA-HFS	01 03 0009		A			A	A		
CORRIDOR FACE À R-15	S	SIGA-PS	01 03 0010		A			A	A		
LOCAL R-15	S	SIGA-PS	01 03 0018		A			A	A		
LOCAL R-15	S	SIGA-PS	01 03 0019		A			A	A		
LOCAL R-15	S	SIGA-PS	01 03 0020		A			A	A		
R-15 PRÈS ENTRÉE TUNNEL PS	M	SIGC-270PB	01 03 0144		A			A	A		
R-15 PRÈS ENTRÉE TUNNEL AG	AG	CLE	01 03 0145		A			A	A		
LOCAL R-10A VIA R-10	S	SIGA-PS	01 03 0016		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 11 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 11 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
CORRIDOR FACE À R-17	S	SIGA-PS	01 03 0011		A			A	A		
LOCAL R-17	S	SIGA-PS	01 03 0012		A			A	A		13
LOCAL R-19	S	SIGA-PS	01 03 0013		A			A	A		
LOCAL R-21 (requiert carte d'accès)	S	SIGA-PS	01 03 0021		A			A	A		
LOCAL R-24	S	SIGA-PS	01 03 0014		A			A	A		
CORRIDOR FACE À R-23	S	SIGA-PS	01 03 0015		A			A	A		
CORRIDOR FACE À R-27	S	SIGA-PS	01 03 0017		A			A	A		
LOCAL R-34	S	SIGA-PS	01 03 0022		A			A	A		18
LOCAL R-33	S	SIGA-PS	01 03 0024		A			A	A		
CORRIDOR FACE À R-33	S	SIGA-PS	01 03 0023		A			A	A		
PRÈS R-38 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0140		A			A	A		
PRÈS R-38 AG	AG	CLE	01 03 0141		A			A	A		
DÉPÔT SOUS ESC. R-35	S	SIGA-PS	01 03 0025		A			A	A		
SORTIE 6 PRÈS R-35 PS	M	SIGC-270PB	01 03 0142		A			A	A		
SORTIE 6 PRÈS R-35 AG	AG	CLE	01 03 0143		A			A	A		
PORTE P7 EXTERIEURE - R15-OX (code 2-5-1)											
LOCAL GÉNÉRATRICES PORTATIVES PAR EXT. (PORTE P7)	S	SIGA-PS	01 03 0026		A			A	A		
LOCAL GÉNÉRATRICES PORTATIVES PAR EXT. (PORTE P7)	S	SIGA-PS	01 03 0027		A			A	A		
LOCAL GÉNÉRATRICES PORTATIVES PAR EXT. (PORTE P7)	M	SIGC-270PB	01 03 0146		A			A	A		
LOCAL GÉNÉRATRICES PORTATIVES PAR EXT. (PORTE P7)	AG	CLE	01 03 0147		A			A	A		
AILE OUEST MÉC. ASC. 523 (VIA SALLE REPOS J. LAPOINTE 521)											
MÉCANIQUE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 02 0273		A			A	A		
MÉCANIQUE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 02 0274		A			A	A		
AILE OUEST - 5e ÉTAGE (JEAN LAPOINTE)											
CORRIDOR 502 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0382		A			A	A		
CORRIDRO 502 AG	AG	CLE	01 02 0383		A			A	A		
CLASSE 504	S	SIGA-PS	01 02 0268		A			A	A		
CUISINETTE 508	S	SIGA PD	01 02 0272		A			A	A		
CORRIDOR 500 CENTRE	S	SIGA-PS	01 02 0271		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 12 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Me relative	Installé	Manq	Requis	Activer	Indica	Surveillance	C Recon	N
CORRIDOR 514 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0380		A			A	A		5	
CORRIDOR 514 AG	AG	CLE	01 02 0381		A			A	A		5	
LOCAL 518	S	SIGA-PS	01 02 0296		A			A	A			
LOCAL 520	S	SIGA-PS	01 02 0297		A			A	A			
PASSAGE PRES 520	S	SIGA-OSD	01 02 0320		A			A	A			
PASSAGE PRES 521	S	SIGA-OSD	01 02 0278		A			A	A			
LOCAL 522	S	SIGA-PS	01 02 0298		A			A	A			
CHAMBRE 524	S	SIGA-PS	01 02 0295		A			A	A			
CHAMBRE 526	S	SIGA-PS	01 02 0270		A			A	A			
PASSAGE PRES 528	S	SIGA-OSD	01 02 0318		A			A	A			
5e ETAGE AILE OUEST LOCAL 531 (salle electrique derriere ascenseur 2)	SFD	SIGA-CT1	01 02 0423		A			A	A			
PUITS ESCALIER SECOURS NON CHAUFFÉ (avec escabeau 12 pi.)	HT	CF135MP	01 02 0423		A						17	
CORRIDOR 533 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0378		A			A	A			
CORRIDOR 533 AG	AG	CLE	01 02 0379		A			A	A			
PASSAGE PRES 533	S	SIGA-OSD	01 02 0319		A			A	A			
PRÈS ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 02 0376		A			A	A			
PRÈS ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 02 0377		A			A	A			
ESCALIER PRÈS ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 02 0263		A			A	A			
AILE OUEST - 4e ÉTAGE												
PRÈS ASCENSEUR PS (435)	M	SIGC-270PB	01 02 0388		A			A	A			
PRÈS ASCENSEUR AG (435)	AG	CLE	01 02 0389		A			A	A			
CORRIDOR FACE 425	S	SIGA-PS	01 02 0264		A			A	A			
CORRIDOR 415	S	SIGA-PS	01 02 0267		A			A	A			
CORRIDOR FACE 411	S	SIGA-PS	01 02 0265		A			A	A			
CORRIDOR FACE 405	S	SIGA-PS	01 02 0266		A			A	A			
CORR. LOCAL 436 PS (GRENIER)	M	SIGC-270PB	01 02 0386		A			A	A			
CORR. LOCAL 436 AG (GRENIER)	AG	CLE	01 02 0387		A			A	A			
CORRIDOR PRÈS 435	S	SIGA-PS	01 02 0309		A			A	A			
LOCAL 443B CONCIÈRGERIE	S	SIGA-PHS	01 02 0307		A			A	A			
CORRIDOR PRÈS 443	S	SIGA-PS	01 02 0308		A			A	A			
LOCAL 443 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0384		A			A	A			
LOCAL 443 AG	AG	CLE	01 02 0385		A			A	A			
PRÈS LOCAL 402 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0410		A			A	A			
PRÈS LOCAL 402 AG	AG	CLE	01 02 0411		A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 13 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installé	Manquant	Requiert	Activé	Indiqué	Surveillance	Commentaire
AILE OUEST - 3e ÉTAGE											
LOCAL 300C	S	SIGA-PS	01 02 0260		A			A	A		
CORRIDOR 300B	S	SIGA-PS	01 02 0256		A			A	A		
CORRIDOR FACE 302	M	SIGC-270PB	01 02 0400		A			A	A		
CORRIDOR FACE 302	AG	CLE	01 02 0401		A			A	A		
CHAMBRE 301	S	SIGA-PS	01 02 0262		A			A	A		
CHAMBRE 302	S	SIGA-PS	01 02 0259		A			A	A		
CHAMBRE 303	S	SIGA-PS	01 02 0261		A			A	A		
CHAMBRE 304	S	SIGA-PS	01 02 0258		A			A	A		
CHAMBRE 306	S	SIGA-PS	01 02 0257		A			A	A		
CHAMBRE 309	S	SIGA-PS	01 02 0286		A			A	A		
CHAMBRE 310	S	SIGA-PS	01 02 0285		A			A	A		
CHAMBRE 312	S	SIGA-PS	01 02 0284		A			A	A		
CHAMBRE 313	S	SIGA-PS	01 02 0294		A			A	A		
CORRIDOR FACE 313	S	SIGA-PS	01 02 0255		A			A	A		
CHAMBRE 314	S	SIGA-PS	01 02 0283		A			A	A		
CHAMBRE 316	S	SIGA-PS	01 02 0282		A			A	A		
CHAMBRE 318	S	SIGA-PS	01 02 0281		A			A	A		
CHAMBRE 320	S	SIGA-PS	01 02 0280		A			A	A		
CHAMBRE 324	S	SIGA-PS	01 02 0279		A			A	A		
CHAMBRE 325	S	SIGA-PS	01 02 0293		A			A	A		
CHAMBRE 329	S	SIGA-PS	01 02 0292		A			A	A		
CORRIDOR FACE 331	S	SIGA-PS	01 02 0254		A			A	A		
CHAMBRE 331	S	SIGA-PS	01 02 0291		A			A	A		
CHAMBRE 333	S	SIGA-PS	01 02 0290		A			A	A		
CORRIDOR FACE 337	S	SIGA-PS	01 02 0253		A			A	A		
CHAMBRE 335	S	SIGA-PS	01 02 0289		A			A	A		
CHAMBRE 337	S	SIGA-PS	01 02 0288		A			A	A		
PRÈS ESCALIER OUEST	M	SIGC-270PB	01 02 0394		A			A	A		
PRÈS ESCALIER OUEST	AG	CLE	01 02 0395		A			A	A		
CHAMBRE 338	S	SIGA-PS	01 02 0287		A			A	A		
CORRIDOR FACE 342	S	SIGA-PS	01 02 0252		A			A	A		
LOCAL 345 VIA 341	M	SIGC-270PB	01 02 0398		A			A	A		
LOCAL 345 VIA 341	AG	CLE	01 02 0399		A			A	A		
LOCAL REPOS 349	M	SIGC-270PB	01 02 0396		A			A	A		
LOCAL REPOS 349	AG	CLE	01 02 0397		A			A	A		
ESCALIER EVACUATION ARRIÈRE STATION MANUELLE	SFD	SIGA-CT2	01 02 0408/0409		A			A	A		
BALCON PS (VIA 349)	M	270-GAOF	01 02 0408		A			A	A		
BALCON AG (VIA 349)	AG	CLE	01 02 0409		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 14 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation / Note
CORR. FACE 342 PRÈS ASC.	M	SIGC-270PB	01 02 0392	A			A	A			
CORR. FACE 342 PRÈS ASC.	AG	CLE	01 02 0393	A			A	A			
LOCAL 351	S	SIGA-PS	01 02 0251	A			A	A			
CORRIDOR 351	M	SIGC-270PB	01 02 0390	A			A	A			
CORRIDOR 351	AG	CLE	01 02 0391	A			A	A			
CORRIDOR PRÈS 346	M	SIGC-270PB	01 02 0402	A			A	A			
CORRIDOR PRÈS 346	AG	CLE	01 02 0403	A			A	A			
CORRIDOR ENTRE 363 / 365	M	SIGC-270PB	01 02 0406	A			A	A			
CORRIDOR ENTRE 363 / 365	AG	CLE	01 02 0407	A			A	A			
ALCOVE FACE 348-350	S	SIGA-PS	01 02 0306	A			A	A			
ALCOVE FACE 352-354	S	SIGA-PS	01 02 0305	A			A	A			
ALCOVE FACE 354-356	S	SIGA-PS	01 02 0304	A			A	A			
CORRIDOR FACE LOCAL 360	M	SIGC-270PB	01 02 0404	A			A	A			
CORRIDOR FACE LOCAL 360	AG	CLE	01 02 0405	A			A	A			
ALCOVE FACE 362	S	SIGA-PS	01 02 0303	A			A	A			
ALCOVE FACE 366	S	SIGA-PS	01 02 0302	A			A	A			
ALCOVE FACE 368	S	SIGA-PS	01 02 0301	A			A	A			
CORRIDOR 3004	M	SIGC-270PB	01 02 0412	A			A	A			
CORRIDOR 3004	AG	CLE	01 02 0413	A			A	A			
CORRIDOR SALLE ATTENTE 3004	S	SIGA-PS	01 02 0311	A			A	A			
CORRIDOR PRÈS 3008	S	SIGA-PS	01 02 0310	A			A	A			
CORRIDOR PRES 3018	S	SIGA-PS	01 02 0314	A			A	A			
BUREAU 3018 A	S	SIGA-PS	01 02 0313	A			A	A			
BUREAU 3018 B	S	SIGA-PS	01 02 0316	A			A	A			
BUREAU 3020	S	SIGA-PS	01 02 0312	A			A	A			
BUREAU 3022	S	SIGA-PS	01 02 0315	A			A	A			
AILE OUEST - 2e ÉTAGE											
LOCAL 236	S	SIGA PS	01 02 0033	A			A	A			
LOCAL 251	S	SIGA-PS	01 02 0005	A			A	A			
LOCAL 251 PS	M	SIGC 270PB	01 02 0131	A			A	A			
LOCAL 251 AG	AG	CLE	01 02 0132	A			A	A			
LOCAL 247 PS (CUISINE)	M	SIGC 270PB	01 02 0133	A			A	A			
LOCAL 247 AG (CUISINE)	AG	CLE	01 02 0134	A			A	A			
CORRIDOR FACE 247	S	SIGA PS	01 02 0006	A			A	A			
PUITS ESCALIER	Zin	SIGA-CT2		A			A	A			
BALCON PS	M	270-GAOF	01 02 0180	A			A	A			
BALCON AG	AG	CLE	01 02 0181	A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 15 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
CHAMBRE 230	S	SIGA-PS	01 02 0032	A			A	A			
LOCAL 245 VIA 243 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0138	A			A	A			
LOCAL 245 VIA 243 AG	AG	CLE	01 02 0139	A			A	A			
CORRIDOR FACE 230	M	SIGC-270PB	01 03 0140	A			A	A			
CORRIDOR FACE 230 AG	AG	CLE	01 03 0141	A			A	A			
CHAMBRE 239	S	SIGA-PS	01 02 0029	A			A	A			
CORRIDOR FACE 239	S	SIGA-PS	01 02 0007	A			A	A			
CHAMBRE 226	S	SIGA-PS	01 02 0031	A			A	A			
CHAMBRE 224	S	SIGA-PS	01 02 0030	A			A	A			
CHAMBRE 222	S	SIGA-PS	01 02 0028	A			A	A			
CORRIDOR FACE 221	S	SIGA-PS	01 02 0008	A			A	A			
CHAMBRE 221	S	SIGA-PS	01 02 0027	A			A	A			
CHAMBRE 219	S	SIGA-PS	01 02 0026	A			A	A			
CHAMBRE 214	S	SIGA-PS	01 02 0025	A			A	A			
CORRIDOR FACE 212	S	SIGA-PS	01 02 0009	A			A	A			
CHAMBRE 212	S	SIGA-PS	01 02 0024	A			A	A			
CHAMBRE 213	S	SIGA-PS	01 02 0022	A			A	A			
CHAMBRE 210	S	SIGA-PS	01 02 0023	A			A	A			
CORRIDOR FACE 214	M	SIGC-270PB	01 02 0142	A			A	A			
CORRIDOR FACE 214 AG	AG	CLE	01 02 0143	A			A	A			
CHAMBRE 209	S	SIGA-PS	01 02 0021	A			A	A			
CHAMBRE 206	S	SIGA-PS	01 02 0011	A			A	A			
CORRIDOR FACE 203	S	SIGA-PS	01 02 0010	A			A	A			
CHAMBRE 204	S	SIGA-PS	01 02 0012	A			A	A			
CHAMBRE 203	S	SIGA-PS	01 02 0013	A			A	A			
CHAMBRE 202	S	SIGA-PS	01 02 0014	A			A	A			
CHAMBRE 201	S	SIGA-PS	01 02 0016	A			A	A			
DÉPÔT 200-B	S	SIGA-PS	01 02 0015	A			A	A			
CORRIDOR FACE 201 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0144	A			A	A			
CORRIDOR FACE 201 AG	AG	CLE	01 02 0145	A			A	A			
AILE OUEST - 1er ÉTAGE											
SALLE DE RÉUNION 102	S	SIGA-PS	01 02 0004	A			A	A			
SALLE DE RÉUNION 102	S	SIGA-PS	01 02 0003	A			A	A			
PRÈS PORTE 106 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0150	A			A	A			
PRÈS PORTE 106 AG	AG	CLE	01 02 0151	A			A	A			
PRÈS RECEPTION PS	M	SIGC-270PB	01 02 0146	A			A	A			
PRÈS RECEPTION AG	AG	CLE	01 02 0147	A			A	A			
CORRIDOR PRES ASC.2	S	SIGA-PS	01 04 0036	A			A	A			
PORTE 132 PS (ENTRÉE PRINCIPALE)	M	SIGC-270PB	01 02 0148	A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 16 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes Installé correctement Manquant Requiert des réparations Indication confirmée Surveillance & mise à la terre confirmée Observation / Recommandation / Note							
Référence : 21-980-1017											
Page 16 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
PORTE 132 AG (ENTRÉE PRINCIPALE)	AG	CLE	01 02 0149		A			A	A		
CORRIDOR FACE 124	S	SIGA-PS	01 02 0001		A			A	A		
LOCAL 135-B (PCAI)	S	SIGA-PS	01 02 0002		A			A	A		
TOILETTE 135-A	S	SIGA-PS	01 02 0034		A			A	A		
AILE OUEST - REZ-DE-CHAUSSÉE											
PRÈS DE R-2 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0158		A			A	A		
PRÈS DE R-2 AG	AG	CLE	01 02 0159		A			A	A		
AILE OUEST R-D-C SALLE ELECTRIQUE R-17	S	SIGA-PS	01 02 0317		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS R-14 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0156		A			A	A		
CORRIDOR PRÈS R-14 AG	AG	CLE	01 02 0157		A			A	A		
PRÈS LOCAL R-34 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0154		A			A	A		
PRÈS LOCAL R-34 AG	AG	CLE	01 02 0155		A			A	A		
PRÈS LOCAL R-43 PS	M	SIGC-270PB	01 02 0152		A			A	A		
PRÈS LOCAL R-43 AG	AG	CLE	01 02 0153		A			A	A		
ENTREPÔT CUISINE R-48	S	SIGA-PS	01 02 0017		A			A	A		
COMPRESSEURS CUISINE R-50	S	SIGA-PS	01 02 0018		A			A	A		
PUITS ESCALIER ROUGE VERS SS7 PRÈS R09 VESTIAIRE H.	S	SIGA-OSD	01 05 0013		A			A	A		
LOCAL SS7A	S	SIGA-OSD	01 05 0011		A			A	A		
LOCAL SS7C (PAN. ÉLECTR.)	S	SIGA-OSD	01 05 0012		A			A	A		
SORTIE VIDE SANITAIRE LAVERIE (face R18, via trappe au sol)	M	SIGC-270PB	01 05 0150		A			A	A		
SORTIE VIDE SANITAIRE LAVERIE AG (face R18, via trappe au sol)	AG	CLE	01 05 0151		A			A	A		
FUMEE SYSTEME VENTILATION LAVERIE (face R18 via trappe au dessus du convoyeur)	DS	SIGA-SD	01 05 0005		A			A	A		20
EMPLACEMENT INCONNU	SFD	SIGA-CT1	01 02 0135								19
SYST. AUTO EXT. HOTTE DE CUISINE		CONTACT	01 02 0135								

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 17 de 49

				Mesures relatives aux composantes								Observation / Recommandation / Note
Endroit		Appareil		Adresse		Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	
PLACARD ELECTRIQUE CUISINE (portes bois coulissantes)		SFD	SIGA-CT1			A			A	A		
DÉT. GAZ PROPANE CUISINE (supervision)			CONTACT	01 02 0200		A			A	A		7

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 18 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Me relative	Installé	Manq	Requis	Activer	Indice	Surveillance	C Recom	N
AILE CENTRALE											4	
AILE CENTRALE - ALARME GÉNÉRALE	Zin	3-IDC8/4	02 02 0001		A			A	A			
ALARME GÉNÉRALE	AG	CLE	02 02 0001		A			A	A			
AILE CENTRALE 1er ÉTAGE	Zin	3 IDC8/4	02 02 0004		A			A	A			
SORTIE SECOURS SUIVI INTENSIF	M	270-GAOF	02 02 0004		A			A	A			
SORTIE SECOURS SUIVI INTENSIF	AG	CLE	02 02 0001		A			A	A			
AILE CENTRALE 1er ÉTAGE	Zin	3-IDC8/4	02 02 0007		A			A	A			
PRÈS LOCAL 106	S	6250C	02 02 0007		A			A	A			
SALLE INFORMATIQUE 112	S	EDW2151A	02 02 0007		A			A	A			
AU PANNEAU EST-3	EOL	RFL			A			A	A			
AILE CENTRALE - REZ DE CHAUSSÉE	Zin	3-IDC8/4	02 02 0005		A			A	A			
SORTIE R-27A	M	270-GAOF	02 02 0005		A			A	A			
SORTIE R-27A	AG	CLE	02 02 0001		A			A	A			
SORTIE GYMNASSE R-8 SUD	M	270-GAOF	02 02 0005		A			A	A			
SORTIE GYMNASSE R-8 SUD	AG	CLE	02 02 0001		A			A	A			
SORTIE GYMNASSE R-8 NORD EST	M	270-GAOF	02 02 0005		A			A	A			
SORTIE GYMNASSE R-8 NORD EST	AG	CLE	02 02 0001		A			A	A			
SORTIE GYMNASSE R-8 NORD OUEST	M	270-GAOF	02 02 0005		A			A	A			
SORTIE GYMNASSE R-8 NORD OUEST	AG	CLE	02 02 0001		A			A	A			
CONTENEUR R-27B	HT	283C	02 02 0005		A			A	A		7	
DÉPÔT GYMNASSE R-6	S	EC30U-3	02 02 0005		A			A	A			
SORTIE SALLE MEC.R27C LAVERIE	M	SIGC-270PB	01 05 0147		A			A	A			
SORTIE SALLE MEC.R27C LAVERIE AG	AG	CLE	01 05 0148		A			A	A			
CHUTE A LINGE R27E LAVERIE	S	SIGA-PD	01 05 0008		A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 19 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives	Installé	Manquant	Requiert	Activé	Indiqué	Surveillance	Commentaires
PAVILLON MÈRE ST- EUGÈNE											4
ALARME GÉNÉRALE											
ALARME GÉNÉRALE CHAUFFERIE/MENUISERIE	Zin	3-IDC8/4	02 02 0002		A			A	A		
ALARME GÉNÉRALE	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
PAVILLON MÈRE ST-EUGÈNE (Ancienne Menuiserie)											
PUITS ESCALIERS PAVILLON	Zin	3-IDC8/4	02 02 0003		A			A	A		
PUITS ESCALIER 1	S	6249C	02 02 0003		A			A	A		
PUITS ESCALIER 2	S	SIGA-PS	01 05 0003		A			A	A		
2e ÉTAGE	Zin	3-IDC8/4	02 02 0006		A			A	A		
PRÈS ESCALIER # 1	M	270-GAOF	02 02 0006		A			A	A		
PRÈS ESCALIER # 1	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
PRÈS ESCALIER # 2	M	270-GAOF	02 02 0006		A			A	A		
PRÈS ESCALIER # 2	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 211)	RHT	281C	02 02 0006		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 212)	RHT	281C	02 02 0006		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 213)	RHT	5601A	02 02 0006		A			A	A		
CONCIËRGERIE 208	RHT	281C	02 02 0006		A			A	A		
1e ÉTAGE	Zin	3-IDC8/4	02 02 0008		A			A	A		
PRES ESCALIER #1	M	270-GAOF	02 02 0008		A			A	A		
PRES ESCALIER #1	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
PRES ESCALIER #2	M	270-GAOF	02 02 0008		A			A	A		
PRES ESCALIER #2	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 111)	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 112)	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 113)	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
GARDE-ROBE EST (# 114)	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
CONCIERGERIE 107	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
BUREAU 105	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
BUREAU 106	RHT	281C	02 02 0008		A			A	A		
REZ-DE-CHAUSSÉE	Zin	3-IDC8/4	02 03 0002		A			A	A		
ENTRÉE R-7 (PORTE P34)	M	270-GAOF	02 03 0002		A			A	A		
ENTRÉE R-7 (PORTE P34)	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
BUREAU R-6	RHT	281C	02 03 0002		A			A	A		
ENTRETIEN MÉNAGER R10	S	C2M-PD1	02 03 0002		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 20 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation /	Note
ATELIER ENTREPÔT R-14 (ACCÈS VIA R-8) (code 1524)	S	EC30U-3	02 03 0002		A			A	A		
CLASSE FORMATION R-13	S	EC30U-3	02 03 0002		A			A	A		
DÉPÔT CLASSE FORMATION R-13 (code r10)	S	EC30U-3	02 03 0002		A			A	A		
BUREAU VIA R-12 (code 135)	S	C2M-PD1	02 03 0002		A			A	A		
REZ-DE-CHAUSSÉE OUEST	Zin	3-IDC8/4	02 03 0003		A			A	A		
ENTRÉE OUEST R-1 (PORTE P33)	M	270-GAOF	02 03 0003		A			A	A		
ENTRÉE OUEST R-1 (PORTE P33)	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
CORRIDOR BUREAU R-1	RHT	CR135	02 03 0003		A			A	A		
BUREAU R-3	RHT	281B-PL	02 03 0003		A			A	A		
PAVILLON R-15 (ENTREPOT) VIA P37A	Zin	3-IDC8/3	02 03 0008		A			A	A		
ENTREPÔT PAVILLON NORD	M	270-GAOF	02 03 0008		A			A	A		
ENTREPÔT PAVILLON NORD	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
ENTREPÔT PAVILLON SUD	M	270-GAOF	02 03 0008		A			A	A		
ENTREPÔT PAVILLON SUD	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
ENTREPÔT PAVILLON NORD	RHT	281C	02 03 0008		A			A	A		
ENTREPÔT PAVILLON SUD	RHT	281C	02 03 0008		A			A	A		
SOUS-SOL (VIA R-15)	Zin	3-IDC8/4	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-1	M	270-GAOF	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-1	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
SOUS-SOL SS-1	RHT	281C	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-1	RHT	281C	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-1	RHT	281C	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-1 (TRANSFO.)	S	C2M-PD1	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-2	RHT	281C	02 03 0004		A			A	A		
SOUS-SOL SS-2	RHT	281C	02 03 0004		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 21 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Surveillance confirmée	Observation & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 21 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
CHAUFFERIE (USINE)											4
CHAUFFERIE - REZ-DE-CHAUSSÉE	Zin	3-IDC8/4	02 03 0006		A			A	A		
RÉSERVOIRS EAUX CHAUDES R-1	M	270-GAOF	02 03 0006		A			A	A		
RÉSERVOIRS EAUX CHAUDES R-1	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
RÉSERVOIRS EAUX CHAUDES R-1	RHT	281C	02 03 0006		A			A	A		
RÉSERVOIRS EAUX CHAUDES R-1	RHT	282C	02 03 0006		A			A	A		
ATELIER R-2	RHT	281C	02 03 0006		A			A	A		
ATELIER R-2	RHT	281C	02 03 0006		A			A	A		
ATELIER R-2	M	270-GAOF	02 03 0006		A			A	A		
ATELIER R-2	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
MEZZANINE R-2	RHT	281C	02 03 0006		A			A	A		
SALLE DE PAUSE R-6	HT	283B-PL	02 03 0006		A						17
SALLE DE PAUSE R-6	M	270-GAOF	02 03 0006		A			A	A		
SALLE DE PAUSE R-6	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
RÉSERVOIRS À HUILE R-7 VIA R-6	RHT	5601A	02 03 0006		A			A	A		
CHAUFFERIE R-3	RHT	282C	02 03 0006		A			A	A		
CHAUFFERIE R-3	RHT	282C	02 03 0006		A			A	A		
CHAUFFERIE R-3	M	270-GAOF	02 03 0006		A			A	A		
CHAUFFERIE R-3	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
CHAUFFERIE R-3 partie basse ouest	RHT	281C	02 03 0006		A			A	A		
CHAUFFERIE R-3 partie basse ouest	RHT	281C	02 03 0006		A			A	A		
LOCAL R-10 EXT. GÉNÉRATRICE (P30)	RHT	SIGA-HRS	01 05 0004		A			A	A		
LOCAL R-10 EXT. GÉNÉRATRICE - PS	M	SIGC-270PB	01 05 0141		A			A	A		
LOCAL R-10 EXT. GÉNÉRATRICE - AG	AG	CLE	01 05 0142		A			A	A		
LOCAL R-10 EXT. GÉNÉRATRICE (demander clef à la maintenance)	SFD	SIGA-CT2	01 05 0143/0144		A			A	A		
LOCAL R-11 EXT. RÉSERV. FUEL - PS	M	270-GAOF	01 05 0143		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 22 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installé	Manquant	Requis	Activé	Indiqué	Surveillance	Commentaire
LOCAL R-11 EXT. RÉSERV. FUEL AG	AG	CLE	01 05 0144		A			A	A		
LOCAL R-10 PRÈS GÉNÉRATRICE EXTÉRIEUR NORD CHAUFFERIE	SFD	SIGA-CT1	01 05 0145		A			A	A		7
SUPERVISION DE CONDITION DE PANNE SUR LA GÉNÉRATRICE		CONT. N/O			A			A	A		7
CHAUFFERIE - ÉTAGE	Zin	3-IDC8/4	02 03 0005		A			A	A		
BUREAU SYNDICAT SORTIE AVANT- PS	M	270-GAOF	02 03 0005		A			A	A		
BUREAU SYNDICAT SORTIE AVANT- AG	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
BUREAU SYNDICAT SORTIE ARRIÈRE- PS	M	270-GAOF	02 03 0005		A			A	A		
BUREAU SYNDICAT SORTIE ARRIÈRE- AG	AG	CLE	02 02 0002		A			A	A		
CHAMBRE DES FOURNAISES CHAUFFERIE R-C PRÈS Valve GLYC.	SFD	SIGA-CT1			A			A	A		7
ALERTE DÉTECTION GAZ		CONT N/O	01 05 0146		A			A	A		7
ENTRÉE TUNNELS SUR LE MUR (réservoir eau chaude)	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
GÉNÉRATRICE EN CHARGE - libre	EOL	RFL 47kΩ	01 05 0139								10
ARRÊT DE LA GÉNÉRATRICE - libre	EOL	RFL 47kΩ	01 05 0140								10
TUNNEL CHAUFFERIE (accès via R 7)	Zin	3-IDC8/4	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL OUEST PRÈS CHAUFFERIE	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL OUEST VERS CHAUFFERIE	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL OUEST VERS CHAUFFERIE	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL OUEST VERS CENTRE HÉBER	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL OUEST PRÈS CENTRE HÉBER	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 23 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes	Installé	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
TUNNEL EST PRÈS CHAUFFERIE	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL EST	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		
TUNNEL EST PRÈS AILE NORD	S	6249C	02 03 0007		A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 24 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installé	Manquant	Requis	Activé	Indice	Surveillance	Commentaire
DÉTECTION COMMUNAUTÉ											23,24,25
4e ETAGE											
SALLE MECANIQUE	S	SIGA-PS	01 04 0251		A			A	A		
3e ÉTAGE											
PRÈS CHAMBRE 61 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0412		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 61 AG	AG	CLE	01 04 0413		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 45 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0414		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 45 AG	AG	CLE	01 04 0415		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 55 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0416		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 55 AG	AG	CLE	01 04 0417		A			A	A		
PUITS ESCALIER	S	SIGA-PS	01 04 0252		A			A	A		
PUITS ASCENSEUR (perche)	S	SIGA-PS	01 04 0253		A			A	A		
PUITS ESCALIER PRES 307 (mur)	S	SIGA-PS	01 04 0255		A			A	A		
2e ÉTAGE											
PRÈS 202 OUEST PS	M	SIGC-270PB	01 04 0380		A			A	A		
PRÈS 202 OUEST AG	AG	CLE	01 04 0381		A			A	A		
PRÈS ENTRE 219 ET CUISINETTE PS	M	SIGC-270PB	01 04 0382		A			A	A		
PRÈS ENTRE 219 ET CUISINETTE AG	AG	CLE	01 04 0383		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 14 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0408		A			A	A		
PRÈS CHAMBRE 14 AG	AG	CLE	01 04 0409		A			A	A		
PRÈS LOCAL 22 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0410		A			A	A		
PRÈS LOCAL 22 AG	AG	CLE	01 04 0411		A			A	A		
PRÈS 206 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0406		A			A	A		
PRÈS 206 AG	AG	CLE	01 04 0407		A			A	A		
					A			A	A		
1er ETAGE					A			A	A		
FACE ASCENSEUR	S	SIGA-PS	01 04 0254		A			A	A		
PRÈS SALLE COMMUNAUTE 126 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0418		A			A	A		
PRÈS SALLE COMMUNAUTE 126 AG	AG	CLE	01 04 0419		A			A	A		
PRÈS ASCENSEUR PS	M	SIGC-270PB	01 04 0404		A			A	A		
PRÈS ASCENSEUR AG	AG	CLE	01 04 0405		A			A	A		
ENTREE PRINC. 1A (100) PS	M	SIGC-270PB	01 04 0376		A			A	A		
ENTREE PRINC. 1A (100) AG	AG	CLE	01 04 0377		A			A	A		
PRÈS PORTE 0 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0388		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 25 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation / Note
PRÈS PORTE 0 AG	AG	CLE	01 04 0389	A			A	A			
LOCAL 9 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0390	A			A	A			
LOCAL 9 AG	AG	CLE	01 04 0391	A			A	A			
REZ-DE-CHAUSSEE				A			A	A			
PRÈS PORTE R-21 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0384	A			A	A			
PRÈS PORTE R-21 AG	AG	CLE	01 04 0385	A			A	A			
SOLARIUM PS	M	SIGC-270PB	01 04 0386	A			A	A			
SOLARIUM AG	AG	CLE	01 04 0387	A			A	A			
SORTIE R-25 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0392	A			A	A			
SORTIE R-25 AG	AG	CLE	01 04 0393	A			A	A			
PRÈS PORTE R-32 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0396	A			A	A			
PRÈS PORTE R-32 AG	AG	CLE	01 04 0397	A			A	A			
PRÈS SORTIE R-37 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0394	A			A	A			
PRÈS SORTIE R-37 AG	AG	CLE	01 04 0395	A			A	A			
SORTIE R-4 PS	M	SIGC-270PB	01 04 0378	A			A	A			
SORTIE R-4 AG	AG	CLE	01 04 0379	A			A	A			
SOUS-SOL											
PORTE EST PS	M	SIGC-270PB	01 04 0402	A			A	A			
PORTE EST AG	AG	CLE	01 04 0403	A			A	A			
PORTE NORD PS	M	SIGC-270PB	01 04 0398	A			A	A			
PORTE NORD AG	AG	CLE	01 04 0399	A			A	A			
CUISINE PS	M	SIGC-270PB	01 04 0400	A			A	A			
CUISINE AG	AG	CLE	01 04 0401	A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 26 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 26 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
GICLEURS											8
DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT- CAVE COMMUNAUTÉ (S-S, ENTREE D'EAU) CAVE ST-AMABLE	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve D.A.R.	SS	702	01 02 0210		A			A	A		
Valve D.A.R.	SS	702	01 02 0210		A			A	A		
ENTREE D'EAU DOMESTIQUE	SS	PTS-C	01 02 0211		A			A	A		
GICLEURS OUEST											
Vide technique S-24 accès via R-22	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
SURVEILLANCE S-6 CHUTE À LINGE OUEST	SS	PTS-C	01 02 0162		A			A	A		
SURVEILLANCE S-6 CHUTE À LINGE OUEST	FS	VSR-F	01 02 0163		A			A	A		
Vide technique S-24 accès via R-22	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve PRINCIPALE (vide technique S-24 accès via R-22)	SS	Valve	01 02 0197		A			A	A		
P.I.V. EXTÉRIEUR OUEST	SS	PCVS-2	01 02 0198		A			A	A		
Vide technique S-24 accès via R-22	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve DISP. ANTI-REFOULEMENT # 1 (vide tech. S-24 accès via R-22)	SS	Valve	01 02 0195		A			A	A		
Valve DISP. ANTI-REFOULEMENT # 2 (vide tech. S-24 accès via R-22)	SS	Valve	01 02 0196		A			A	A		
Vide technique S-24 accès via R-22	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
DEBIT BOYAU EST	FS	VSR-F	01 02 0160		A			A	A		
SURVEILLANCE S-7 BOYAUX INCENDIE EST	SS	Valve	01 02 0161		A			A	A		
Vide technique S-24 accès via R-22	SFD	SIGA-CT1			A			A	A		
DEBIT GICLEUR R-24 OUEST	FS	VSR-F	01 02 0179		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 27 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
Vide technique S-24 accès via R-22	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve BOYAU EST	SS	Valve	01 02 0208		A			A	A		
Valve GICLEUR R-24 OUEST (emplacement inconnu)	SS	Valve	01 02 0209		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST HAUTE PRESSION (GICLEURS ROSE-COMMUNAUTÉ)	SS	PS40-2	01 02 0193		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST BASSE PRESSION (GICLEURS ROSE-COMMUNAUTÉ)	SS	PS40-2	01 02 0194		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST (GICLEURS SECTEUR ORANGE)	SS	Valve	01 02 0202		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST (GICLEURS ROSE-COMMUNAUTÉ)	SS	Valve	01 02 0203		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST HAUTE PRESSION (GICLEURS SECTEUR VERT)	SS	PS40-2	01 02 0185		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST BASSE PRESSION (GICLEURS SECTEUR VERT)	SS	PS40-2	01 02 0186		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST DÉBIT (GICLEURS SECTEUR VERT)	FS	PS10-2A	01 02 0177		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST DÉBIT (GICLEURS SECTEUR JAUNE)	FS	PS10-2A	01 02 0178		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST HAUTE PRESSION (GICLEURS SECTEUR JAUNE)	SS	PS40-2	01 02 0187		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST BASSE PRESSION (GICLEURS SECTEUR JAUNE)	SS	PS40-2	01 02 0188		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 28 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation / Note
LOCAL R-24 OUEST HAUTE PRESSION (GICLEURS SECTEUR BLEU)	SS	PS40-2	01 02 0189		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST BASSE PRESSION (GICLEURS SECTEUR BLEU)	SS	PS40-2	01 02 0190		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST DÉBIT (GICLEURS SECTEUR BLEU)GICLEURS	FS	PS10-2A	01 02 0175		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST (GICLEURS SECTEUR ORANGE)	FS	PS10-2A	01 02 0176		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST HAUTE PRESSION (GICLEURS SECTEUR ORANGE)	SS	PS40-2	01 02 0191		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST BASSE PRESSION (GICLEURS SECTEUR ORANGE)	SS	PS40-2	01 02 0192		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST (GICLEURS SECTEUR JAUNE)	SS	Valve	01 02 0204		A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST (GICLEURS SECTEUR BLEU)	SS	Valve	01 02 0205		A			A	A		
SURVEILLANCE S-4- LOCAL R-24	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST DÉBIT (GICLEURS ROSE-COMMUNAUTÉ)	FS	PS10-2A	01 02 0173		A			A	A		
LOCAL R-24 (BASSE PRESSION AIR)	SS	PS40-2A	01 02 0174		A			A	A		
vide technique S-24 accès via R-22	Zin	SIGA-CT2			A			A	A		
LOCAL R-24 OUEST (GICLEURS SECTEUR VERT)	SS	Valve	01 02 0206		A			A	A		
SURVEILLANCE Valve S-10 (Vide technique S-24 accès via R-22)	SS	PTS-C	01 02 0207		A			A	A		
PLAFOND TOILETTE 205	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 29 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation / Note
DÉBIT 200 OUEST (LIBRE)	EOL	RFL 47kΩ	01 02 0167								
Valve 200 OUEST (S1)	SS	PTS-C	01 02 0166		A		A	A			
PLAFOND TOILETTE 305	SFD	SIGA-CT2			A		A	A			
DÉBIT 300 OUEST (LIBRE)	EOL	RFL 47kΩ	01 02 0165								
Valve 300 OUEST (S2)	SS	PTS-C	01 02 0164		A		A	A			
LOCAL 407 PLAFOND	SFD	SIGA-CT2			A		A	A			
DÉBIT 400 OUEST (LIBRE)	EOL	RFL 47kΩ	01 02 0169								
Valve 400 OUEST (S3)	SS	PTS-C	01 02 0168		A		A	A			
GICLEURS AILE EST											
LOCAL R-13	SFD	SIGA-CT1			A		A	A			
Valve GLYCOL DÉBARCADÈRE R7A	SS	Valve	01 03 0160		A		A	A			
CORRIDOR R-11 (entre-plafond)	SFD	SIGA-CT1			A		A	A			
Valve	SS	PIVSU-A1	01 02 0182		A		A	A			
CORRIDOR FACE R-12 (entre-plafond)	SFD	SIGA-CT1			A		A	A			
Valve	SS	PIVSU-A1	01 02 0183		A		A	A			
SALLE MÉC. R-15 EST- DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT	SFD	SIGA-CT1			A		A	A			
Valve D.A.R.	SS	702	01 03 0129		A		A	A			
Valve D.A.R.	SS	702	01 03 0129		A		A	A			
SALLE MÉC. R-15 EST	SFD	SIGA-CT2			A		A	A			
SALLE MÉC. R-15 EST- DEBIT S-9 BOYAUX EST	FS	VSR-F	01 02 0213		A		A	A			
SALLE MÉC. R-15 EST- Valve S-9 BOYAUX EST	SS	PIVSU-AI	01 02 0214		A		A	A			
SALLE MÉC. R-15 EST	SFD	SIGA-CT2			A		A	A			
ALIMENTATION EN EAU TUNNEL ET CHAUFFERIE	FS	VSR-F	01 03 0154		A		A	A			
Valve ALIMENTATION EN EAU TUNNEL ET CHAUFFERIE	SS	Valve	01 03 0155		A		A	A			
SALLE MÉC. R-15 EST	SFD	SIGA-CT2			A		A	A			
DÉBIT GÉNÉRAL	FS	PS10-2A	01 03 0156		A		A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 30 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
Valve PRINCIPALE	SS	Valve	01 03 0157		A			A	A		
SALLE MÉC. R-15 EST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
HAUTE PRESSION	SS	PS120-2A	01 03 0158		A			A	A		
BASSE PRESSION	SS	PS120-2A	01 03 0159		A			A	A		
LOCAL R-15 EST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve R.-C. AILE EST	SS	Valve	01 03 0152		A			A	A		
DÉBIT R.-C. AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0153		A			A	A		
LOCAL R-15 EST	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve R.-C. AILE NORD	SS	Valve	01 03 0161		A			A	A		
DÉBIT R.-C. AILE NORD	FS	VSR-F	01 03 0162		A			A	A		
CHUTE LINGE R-17 ENTRE PLAFOND- SURVEILLANCE S-5	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		9
CHUTE LINGE R-17 ENTRE PLAFOND	SS	OSYSU	01 02 0170								9
CHUTE LINGE R-17 ENTRE PLAFOND	FS	DÉBIT	01 02 0171		A			A	A		9
CORRIDOR FACE R-31 EST (entre-plafond)	SFD	SIGA-CT1			A			A	A		
Valve	SS	PIVSU-A1	01 02 0184		A			A	A		
LOCAL 131	SFD	SIGA-CT2									
Valve 1er ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0163		A			A	A		
DÉBIT 1er ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0164		A			A	A		
LOCAL 213	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve 2e ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0150		A			A	A		
DÉBIT 2e ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0151		A			A	A		
LOCAL 315	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve 3e ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0403		A			A	A		
DÉBIT 3e ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0404		A			A	A		
3E ETAGE EST- BUREAU VITRE UNITEE INTENSIVE (trappe vitree derriere porte)	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
3e-UNITE INTENS.-VALVE GICL. CELLULE CRISE			01 03 0410		A			A	A		
3e ETAGE - UNITE INTENSIVE (Entree Libre)			01 03 0411								

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 31 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 31 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
3E ETAGE EST- CORRIDOR UNITEE INTENSIVE (trappe au plafond pres porte double-identifie)	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
3e -UNITE INTENSIVE-VALVE GICLEUR CORRIDOR			01 03 0412		A			A	A		
3e ETAGE - UNITE INTENSIVE (Entree Libre)			01 03 0413								
3E ETAGE EST- CORRIDOR UNITEE INTENSIVE (trappe au plafond pres porte double-identifie)	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
3e - UNITE INTENS. -VALVE GICLEUR DORTOIRS			01 03 0414		A			A	A		
3e ETAGE - UNITE INTENSIVE (Entree Libre)			01 03 0415								
LOCAL 415	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve 4e ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0401		A			A	A		
DÉBIT 4e ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0402		A			A	A		
LOCAL 515	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve 5e ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0399		A			A	A		
DÉBIT 5e ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0400		A			A	A		
LOCAL 613	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve 6e ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0395		A			A	A		
DÉBIT 6e ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0396		A			A	A		
SALLE MÉCANIQUE 7e ÉTAGE	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve 7e ÉTAGE AILE EST	SS	Valve	01 03 0397		A			A	A		7
DÉBIT 7e ÉTAGE AILE EST	FS	VSR-F	01 03 0398		A			A	A		7
GICLEUR CHAUFFERIE											
CHAUFFERIE R-C (menuiserie)	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
ALARME COMMUNE GICLEURS	FS	PS10-2A	01 05 0137		A			A	A		
HAUTE PRESSION	SS	PS120-2A	01 05 0138		A			A	A		
CHAUFFERIE RDC (menuiserie)	SFD	SIGA-CT2			A			A	A		
Valve PRINCIPALE	SS	Valve	01 05 0133		A			A	A		
BASSE PRESSION	SS		01 05 0134		A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 32 de 49

Endroit	Appareil	Adresse	Mesures relatives aux composantes							
			Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation /	Recommandation /	Note
CHAUFFERIE R.D.C. (menuiserie)	SFD	SIGA-CT2		A			A	A		
DÉBIT CHAUFFERIE RDC	FS	VSR-F	01 05 0135	A			A	A		
Valve CHAUFFERIE R.D.C.	SS	Valve	01 05 0136	A			A	A		7
TUNNEL NORD-EST	SFD	SIGA-CT2		A			A	A		
TUNNEL DÉBIT NORD-EST.	FS	VSR-F	01 05 0129	A			A	A		
TUNNEL Valve NORD-EST	SS	Valve	01 05 0130	A			A	A		
TUNNEL NORD-OUEST	SFD	SIGA-CT2		A			A	A		
TUNNEL DÉBIT NORD-OUEST.	FS	VSR-F	01 05 0131	A			A	A		
TUNNEL Valve NORD-OUEST	SS	Valve	01 05 0132	A			A	A		
CHAMBRE DES FOURNAISES CHAUFFERIE RDC	SFD	SIGA-CT1		A			A	A		
Valve AU GLYCOL CHAUFFERIE (mur près détecteur de gaz, sortie 31)	SS	Valve	01 05 0128	A			A	A		
CHAUFFERIE ÉTAGE (entre-plafond cuisinette)	SFD	SIGA-CT2		A			A	A		
DÉBIT CHAUFFERIE ÉTAGE	FS	VSR-F	01 05 0126	A			A	A		
Valve CHAUFFERIE ÉTAGE	SS	Valve	01 05 0127	A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 33 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 33 de 49											
Endroit	Appareil		Adresse								
SIGNALISATION											17,29
REZ-DE-CHAUSSEE OUEST		3-IDC8/4	02 07 0001		A			A	A		
PRÈS DE R-14 cafeteria	B	439D-6AWC			A			A	A		
SECTEUR CUISINE	B	439D-6AWC			A			A	A		
SECTEUR CHAMBRES FROIDES (près frigo 7)	B	439D-6AWC			A			A	A		
1er ÉTAGE OUEST		3-IDC8/4	02 07 0002		A			A	A		
CORRIDOR FACE RÉCEPTION	B	439D-6AWC			A			A	A		
2e ÉTAGE OUEST		3-IDC8/4	02 07 0005		A			A	A		
CORRIDOR FACE CHAMBRE 239	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS CHAMBRE 214	B	439D-6AWC			A			A	A		
3e ÉTAGE OUEST		3-IDC8/4	02 07 0006		A			A	A		
CORRIDOR AUMONIER 354 PRÈS 356	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 365	B	439D-6AWC			A			A	A		
POSTE DE GARDE	B	MB6-24			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 339	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 314	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 339	V	LAMPE			A			A	A		
4e ÉTAGE OUEST		3-IDC8/4	02 08 0001		A			A	A		
FACE ASCENSEUR # 2	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 439	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRÈS 422	B	439D-6AWC			A			A	A		
LOCAL 432	B	439D-6AWC			A			A	A		
LOCAL 437	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR 443	B	439D-6AWC			A			A	A		
5e ÉTAGE OUEST		3-IDC8/4	02 08 0002		A			A	A		
CORRIDOR PRES 504	B	439D-6AWC			A			A	A		
CORRIDOR PRES 520	B	SSM6-24			A			A	A		
LAMPE PRÈS ASCENSEUR	V	LAMPE			A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 34 de 49

Endroit	Appareil	Adresse	Mesures relatives aux composantes							
			Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
2e & 4e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 08 0005		A			A	A	
Corr. 4ième étage aile ouest, près de 402 (grille murale)	B	439D-6AWC			A			A	A	
Corr. 3ième étage aile ouest, près de 302 (grille murale)	B	439D-6AWC			A			A	A	
Corr. 2ième étage aile ouest, près de 202 (grille murale)	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE EST - REZ-DE-CHAUSSÉE & SOUS-SOL		3-IDC8/4	02 08 0006		A			A	A	
CORRIDOR EST R35	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR EST PRES R-23	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR EST PRES R-5	B	439D-6AWC			A			A	A	
SALLE MÉC. R-15 (pres tunnel)	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR FACE ASC. 3-4	B	439D-6AWC			A			A	A	
CABANON TELUS (accès ext. au dessus débarcadere)	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE EST - 1er ÉTAGE		3-IDC8/4	02 09 0001		A			A	A	
CORRIDOR EST 165	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR CENTRE 137	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR CENTRE PRÈS 126	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORR. PRÈS ESCALIER 116	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE EST - 2e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 09 0002		A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 231	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 243	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR FACE 223	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 211	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORR. OUEST AILE EST 202	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 210	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE EST - 3e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 09 0005		A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 345	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 325	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 319	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 302	B	439D-6AWC			A			A	A	

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 35 de 49

Endroit	Appareil	Adresse	Mesures relatives aux composantes							
			Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
AILE EST - 4e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 09 0006		A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 439	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 419	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 402	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE EST - 5e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 10 0001		A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 541	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 519	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 502	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE EST - 6e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 10 0002		A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 641	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 619	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORRIDOR PRÈS 602	B	439D-6AWC			A			A	A	
SALLE MÉC. ASC. 7e ÉTAGE	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE NORD - SOUS-SOL & REZ-DE-CHAUSSÉE		3-IDC8/4	02 10 0005		A			A	A	
SOUS-SOL PRÈS ESC. (VIA ESC. R19 OU TUNNEL)	B	439D-6AWC			A			A	A	
R-C PRÈS ESC. R17	B	439D-6AWC			A			A	A	
R-C PRÈS ESC. R3	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE NORD - 1er ÉTAGE		3-IDC8/4	02 10 0006							
CORRIDOR PRÈS 105	B	439D-6AWC			A			A	A	
PRÈS ENTRÉE BIBLIOTHÈQUE	B	MB6-24			A			A	A	
PRÈS SORTIE D'URGENCE BIBLIO.	B	MB6-24			A			A	A	
BIBLIOTHÈQUE PRÈS 107	B	MB6-24			A			A	A	
BIBLIOTHÈQUE PRÈS 110	B	MB6-24			A			A	A	
AILE NORD - 2e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 11 0001		A			A	A	
CORR. PRÈS ESCALIER 201	B	439D-6AWC			A			A	A	
CORR. PRÈS ESCALIER 221	B	439D-6AWC			A			A	A	
AILE NORD - 3e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 11 0002		A			A	A	
CORR. PRÈS ESCALIER 301	B	439D-6AWC			A			A	A	

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 36 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives aux composantes							
				Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
CORR. PRÈS ESCALIER 325	B	439D-6AWC		A			A	A			
AILE NORD - 4e ÉTAGE		3-IDC8/4	02 11 0005	A			A	A			
CORR. PRÈS ESCALIER 401	B	439D-6AWC		A			A	A			
CORR. PRÈS ESCALIER 421	B	439D-6AWC		A			A	A			
SALLE MÉC. ASC. 5e ÉTAGE	B	439D-6AWC		A			A	A			
AILE CENTRALE		3-IDC8/4	02 11 0006	A			A	A			
SALLE MÉC R27F (VIA SALLE R27C)	B	MB6-24		A			A	A			
SALLE R27C (EXPÉDITION LINGE SOUILLÉ)	B	MB6-24		A			A	A			
LAVERIE (PLONGE)	B	MB6-24		A			A	A			
VIDE TECHNIQUE LAVERIE (VIA TRAPPE)	B	MB6-24		A			A	A			
PRÈS SORTIE R-27A	B	439D-6AWC		A			A	A			
CORRIDOR FACE R-1	B	439D-6AWC		A			A	A			
GYMNASE R-8	B	439D-6AWC		A			A	A			
PRÈS SORTIE CORR. 102	B	439D-6AWC		A			A	A			
SALLE ÉLECTRIQUE R27F	BPS	BPS6A	NAC 1	A			A	A			
STROBES R27 & LAVERIE	Zout	SIGA-CC1S	01 05 0149	A			A	A			
SALLE ÉLECTRIQUE R27F	V	G1-VM		A			A	A			
LAVERIE	V	CS405-7A-T		A			A	A			
DANS BOOSTER POWER SUPPLY	EOL	RFL 15kΩ		A			A	A			
CHAUFFERIE / ATELIERS		3-IDC8/4	02 12 0001	A			A	A			
BUREAU SYNDICAL CHAUFFERIE ÉTAGE	H	882-2C		A			A	A			
SALLE RÉSERV. EAUX CHAUDES CHAUFFERIE R-C	H	882-2C		A			A	A			
ATELIER CHAUFFERIE	H	882-2C		A			A	A			
SALLE DE FOURNAISES CHAUFFERIE	H	882-2C		A			A	A			
SALLE GÉNÉRATRICE R-10	HV	757-5A-T		A			A	A			
RÉSERV. DIESEL GÉNÉRATRICE R-11	HV	757-5A-T		A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 37 de 49

[illegible]

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 38 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installé	Manquant	Requis	Actifs	Indicateurs	Surveillance	Catégorie	Recommandation
SIGNALISATION COMMUNAUTÉ											11	
PRÉ-SIGNAL			02 13 0002								21	
2e ÉTAGE NORD FACE LOCAL 14	H	G1R H			A			A	A			
2e ÉTAGE PRÈS LOCAL 210	H	G1R H			A			A	A			
3e ÉTAGE PRÈS CH. 45	H	G1R-H			A			A	A			
CORR. SECTEUR 3000 FACE 3016	H	G1R H			A			A	A			
ALARME GÉNÉRALE												
SECTEUR SUD-OUEST		3-IDC8/4	02 12 0005		A			A	A			
R-C SORTIE R-4	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉT. CORR. DERRIÈRE CHAPELLE PRÈS DE 116	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉT. CORR. CENTRE HÉBERG. SACRÉ COEUR PRÈS DE 115	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉT. CORR. PRÈS LOCAL 10	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉT. CORR. PRÈS CH. 4	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉT. CORR. PRÈS DE 109	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
2e ÉTAGE PRÈS LOCAL 210	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
2e ÉTAGE PRÈS LOCAL 219	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
SECTEUR CENTRE		3-IDC8/4	02 13 0005		A			A	A			
R-C PRÈS SORTIE R-25	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
R-C CORR. FACE CH. 10 VIA R-18	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉTAGE FACE CHAPELLE OUEST	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
1er ÉTAGE PRÈS ASC. (PRÈS 118)	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
2e ÉTAGE PRÈS BUREAU 1	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
2e ÉTAGE PRÈS PORTE 30	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
3e ÉTAGE PRÈS LOCAL 61	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
CORRIDOR PRÈS 3005	HV	G1R-P			A			A	A			
CORRIDOR FACE 3016	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
SECTEUR NORD			02 13 0006		A			A	A			
SOUS-SOL PRÈS ATELIER	HV	G1R-HDV30			A			A	A			
R-C PRÈS ESCALIER R-32	HV	G1R-HDV30			A			A	A			

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 39 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installation	Manque	Requis	Actives	Indices	Surveillance	Recommandations
1er ÉTAGE PRÈS 126	HV	G1R-HDV30			A			A	A		
1er ÉTAGE PRÈS SALLE 125 VIA 121	HV	G1R-HDV30			A			A	A		
2e ÉTAGE PRÈS CH. 14	HV	G1R-HDV30			A			A	A		
2e ÉTAGE PRÈS LOCAL 22	HV	G1R-HDV30			A			A	A		
3e ÉTAGE FACE LOCAL 48	HV	G1R-HDV30			A			A	A		
3e ÉTAGE FACE CH. 45	HV	G1R-HDV30			A			A	A		

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 40 de 49

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR				Mesures relatives aux composantes	Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
Référence : 21-980-1017											
Page 40 de 49											
Endroit	Appareil	Adresse									
RELAIS AUXILIAIRES											
RAPPELS D'ASCENCEURS											
4E ETAGE SALLE MECANIQUE COMMUNAUTE	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL GÉNÉRAL AU 1ER ÉTAGE ASCENSEUR COMMUNAUTE		CONTACT	01 04 0420		A			A	A		
4E ETAGE SALLE MECANIQUE COMMUNAUTE	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL ASC. MEC. & PUIITS COMMUNAUTE (CLIGNOTANT POMPIER)		CONTACT	01 04 0421		A			A	A		
4E ETAGE SALLE MECANIQUE COMMUNAUTE	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL ASCENSEUR ALTERNATIF AU R-C COMMUNAUTE		CONTACT	01 04 0422		A			A	A		
SALLE MÉC. ASCENSEUR #2	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL GÉN. AU 1er ÉTAGE ASCENSEUR #2		CONTACT	01 02 0415		A			A	A		
SALLE MÉC. ASCENSEUR #2	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RELAIS ASCENSEUR #2 RAPPEL ALTERNATIF AU 2e ÉTAGE		CONTACT	01 02 0416		A			A	A		28
SALLE MÉC. ASCENSEUR #2	AD	SIGA-CR			A			A	A		
FUMÉE MÉC./puits ASC. #2 (clignotant pompier dans la cabine)		CONTACT	01 02 0417		A			A	A		
SALLE MÉC. ASCENSEUR #2	AD	SIGA-CR			A			A	A		
ASC. #2 GÉNÉRATRICE EN MARCHE (lampe alimentation de secours)		CONTACT	01 02 0418		A			A	A		14
SALLE MÉC. ASCENSEUR #2	AD	SIGA-CR			A			A	A		
ASC. #2 ARRÊT GÉNÉRATRICE		CONTACT	01 02 0419		A			A	A		14

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 41 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives	Installé	Manquant	Requis	Activé	Indice	Surveillance	Commentaire
SALLE MÉC. ASCENSEUR #2	AD	SIGA-CR			A			A	A		
libre		libre	01 02 0421								
INCONNU	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL GÉNÉRAL ASC. #3-4 AU 1ER ÉTAGE (procédure dans accueil)		N/O	01 02 0126		A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL ALTERNATIF ASC. #3-4 AU R-C (procédure dans accueil)		N/O	01 02 0127		A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RAPPEL ASCENSEUR #3-4 FUMÉE CANABON (procédure dans accueil)		N/O	01 02 0128		A			A	A		
AILE EST - 7e ÉTAGE (salle mécanique ascenseur, coté contrôle ascenseur)	AD	SIGA-CR	01 03 0424		A			A	A		
RELAIS ASCENSEUR #3-4 GÉNÉRATRICE EN MARCHÉ (procédure dans accueil)		LIBRE									15
AILE EST - 7e ÉTAGE (salle mécanique ascenseur, coté contrôle ascenseur)	AD	SIGA-CR	01 03 0425		A			A	A		
RELAIS ASCENSEUR #3-4 ARRÊT GÉNÉRATRICE (procédure dans accueil)		LIBRE									15

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 42 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesure relative	Installé	Manquant	Requis	Activé	Indiqué	Surveillé	Commentaire
CONTRÔLES DE PORTES											12
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0128		A			A	A		
2e ÉTAGE EST - E.-A. PORTES COUPE-FEU CORRIDOR PRES 224 (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0148		A			A	A		
2e ÉTAGE EST - RETENUES MAGN. PORTE PRÈS 224 (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0166		A			A	A		
2e ÉTAGE EST - É.-AIMANT ESC. EST (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
					A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0418		A			A	A		
2e ÉTAGE EST - É.-A. ENTRÉE (2) (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0394		A			A	A		
3e ÉTAGE EST - FERME-PORTE COUPE-FEU PRÈS 321 EST (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0416		A			A	A		
3e ÉTAGE EST - UNITÉ INTENSIVE ÉLECTRO-AIMANT PORTES (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0417		A			A	A		
3e ÉTAGE EST - É.-AIMANT ESC. EST (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
					A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0419		A			A	A		
3e ÉTAGE EST - É.-AIMANT ENTRÉE (PEDO)		CONTACT			A			A	A		
AILE NORD 3IEME, PRES PORTE 301	AD	SIGA-CRH	01 04 0152		A			A	A		
E-AIMANTS, PORTES 301 / 325		CONT. N/F			A			A	A		

Nom du projet : CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR

Référence : 21-980-1017

Page 43 de 49

Endroit	Appareil		Adresse	Mesures relatives	Installé	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note
ENTREPLAFOND GAUCHE 5E ETAGE OUEST PRES PORTE TOIT EST	AD	SIGA-CR	01 02 0422		A			A	A		
ELECTRO-AIMANT 5E ETAGE OUEST PORTE TOIT CÔTÉ EST		CONT. N/F			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 03 0149		A			A	A		
PORTE COUPE-FEU REZ-DE-CHAUSSÉE PRÈS ASC. 3 & 4		CONTACT			A			A	A		
R-C AU DESSUS PORTE ENTRE- PLAFOND	AD	SIGA-CR	01 02 0199		A			A	A		
2X RET. MAGN. DE PORTES VIA GYM. (PORTE ACCÈS SERVICE R-C & 1er ÉT.)		CONTACT			A			A	A		
INCONNU	AD	SIGA-CR	01 02 0414		A			A	A		
ÉLECTRO-AIMANT CORR. PRES 368		CONTACT									
PRES DE LA PORTE P6 DANS ESCALIER EST ENTRE R-D-C ET 1ER ETAGE	AD	SIGA-CR	01 03 0175		A			A	A		
E.-A. PORTE P6 EST		CONT. N/F			A			A	A		
LOCAL R-21 EST	AD	SIGA-CR	01 03 0173		A			A	A		
E.-A. PORTE R-35 EST		CONT. N/O			A			A	A		
LOCAL R-21 EST	AD	SIGA-CR			A			A	A		
RELAIS CONTROLE ACCES		CONT. N/F	01 03 0174		A			A	A		19
LOCAL DU PCAI 135-B	AD	SIGA-CR	01 02 0212		A			A	A		
RELAIS CONTROLE ACCES		CONT. N/O			A			A	A		
PCAI NODE 2	AD	SIGA-CR	01 02 0129		A			A	A		
CONSOLE SIDELCO (CONTRÔLE D'ACCÈS 2e & 3e ÉTAGE OUEST)		CONT. N/F	0v								
PCAI NODE 2	AD	SIGA-CR	01 02 0130		A			A	A		
ACTIVATION MODULE 8 RELAIS (46213-1594)		CONT. N/O			A			A	A		
(PCAI 02) MODULE 8 RELAIS	AD	46213-1594									

Nom du projet : **CENTRE HEBERGEMENT SACRE-COEUR**

Référence : **21-980-1017**

Page 44 de 49

Endroit	Appareil	Adresse	Mesures relatives aux composantes							
			Installé correctement	Manquant	Requiert des réparations	Activation confirmée	Indication confirmée	Surveillance & mise à la terre confirmée	Observation / Recommandation / Note	
CONTACTEUR 2-57-C16C-U		CONT. N/F	R1	0 V	A			A	A	22
PRESSURISATION ESCAL. EST		CONT. N/O	R2	131 Vac	A			A	A	22
RETENUE PORTES OUEST		CONT. N/F	R3	118 Vac	A			A	A	22
RETENUE PORTES EST		CONT. N/F	R4	118 Vac	A			A	A	22
ARRÊT DE VENTILATION EST		CONT. N/F	R5	0 V	A			A	A	22
RETENUE DE PORTE		CONT. N/F	R6	119 Vac	A			A	A	22
RETENUE DE PORTE		CONT. N/F	R7	119 Vac	A			A	A	22
E.-A. SORTIE ESC. PRES DE 360 3e ÉTAGE OUEST)		CONT. N/F	R8	0 V	A			A	A	22
RELAIS SUR DÉT. DE VENT.	AD	SIGA-CR	01 04 0153		A			A	A	
SOUS-SOL AILE NORD ARRÊT VENT. 6ER		CONT. N/F			A			A	A	
SALLE MEC. AILE EST (accès via esc. 601)	AD	SIGA-CR	01 03 0426		A			A	A	
RELAIS ARRÊT VENT. 29VA.VA3		CONT. N/F			A			A	A	
SALLE MEC. AILE EST (accès via esc. 601)	AD	SIGA-CR	01 03 0427		A			A	A	
RELAIS ARRÊT VENT. 29VE.VE3		CONT. N/F			A			A	A	
LOCAL R-15 EST	AD	SIGA-CR	01 03 0165		A			A	A	
COUPURE EAU DOMESTIQUE (sur débit)		N/O			A			A	A	
TRANSMISSION VERS CENTRALE										
PANNEAU CABINET #2										
TX ALARME MICROTEC		CONT. N/O			A			A	A	
TX SUPERVISION MICROTEC		CONT. N/F			A			A	A	
TX PANNE MICROTEC		CONT. N/F			A			A	A	
DISJONCTEURS										
CORRIDOR PRES DE 114, PANNEAU 0114B-U/0RR17-U1, DISJ. #10 (PAI 01-02)										2

CORRIDOR FACE R-18, PANNEAU 0R29U, DISJ. #4 (BPS)											2
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Les instructions suivante s'applique au rapport ci-dessus :

- La mesure ou la confirmation de la sensibilité (%) du détecteur de fumée devrait être indiquée dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- La date du nettoyage ou du remplacement du détecteur de fumée devrait aussi être indiquée dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- Le changement d'état, y compris le délai, devraient être indiqués dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- La pression différentielle (inH2O) des détecteurs de fumée pour conduits d'air devrait être confirmée et indiquée dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- Le réglage du délai de l'interrupteur d'écoulement d'eau devrait être indiqué dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- Les interrupteur de surveillance des gicleurs déclenchent l'annonce d'une condition de dérangement, mais ne déclenche pas l'annonce d'une condition d'alarme.
- Le réglages supérieur et inférieur de la pression des dispositifs de surveillance devraient être indiqués dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- Le réglage de basse température devrait être indiqué dans la colonne: Mesure relative aux composantes.
- Indiquer les dispositifs auxiliaires particuliers.
- Indiquer la date ou le dispositif à été modifié dans la colonne des notes.
- Indiquer le fonctionnement normal du dispositif (p. ex. indication d'alarme, de dérangement, de surveillance et d'annonce.
- Indiquer la zone, le numéro de circuit ou l'adresse.
- Indiquer les emplacements des dispositifs classiques.
- Indiquer la liaison de données, l'adresse et l'emplacement du dispositif actif et du dispositif d'appui.
- Mettre à l'essai et confirmer la surveillance du câblage du dispositif classique.
- Confirmer que le dispositif n'a subi aucun dommage.
- Confirmer que le dispositif est exempt de matières étrangères.
- Confirmer que le dispositif est soutenu par un dispositif mécanique indépendamment du câblage.
- Confirmer que les couvercles protecteurs ou les pare-poussières du dispositif sont enlevés.
- Le terme 'installation correcte' est utilisé conformément à la version de la norme CAN/ULC-S524, Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie, en vigueur au moment de l'installation du dispositif qui doit être soumis à l'essai.

Les essais indiqués sur ce formulaire ne comprennent pas l'essai de fonctionnement des dispositifs auxiliaires.

Liste des visites sur le projet

Visite	Date	Nom	# ACAI	Tâches
A	19 août 2024	Nicolas Jacques		Inspection

E3.1 Mise à l'essai des dispositifs - Légende

(Ref: 5.7.4.1.3-5.5.7.4.3.1.5.7.4.5.1.5.7.8.1.1.5.7.8.2.2.5.7.8.2.4)

Type de composante : AD (Dispositif auxiliaire) Total = 40

46213-1594 Qté : 1	CONT. N/F Qté : 2	SIGA-CR Qté : 36	SIGA-CRH Qté : 1
--------------------	-------------------	------------------	------------------

Type de composante : AG (Clé sur l'avertisseur manuel d'incendie) Total = 120

CLE Qté : 120

Type de composante : ANN (Annonciateur d'alarme incendie) Total = 7

3-LCDANN Qté : 7

Type de composante : B (Cloche) Total = 75

439D-6AWC Qté : 65	MB6-24 Qté : 9	SSM6-24 Qté : 1
--------------------	----------------	-----------------

Type de composante : BPS (Bloc d'alimentation secondaire) Total = 2

BPS6A Qté : 2

Type de composante : DS (Détecteur de fumée de conduit) Total = 2

SIGA-PS/DH Qté : 1	SIGA-SD Qté : 1
--------------------	-----------------

Type de composante : EM (Module d'isolation en cas de défaut) Total = 20

SIGA-IM Qté : 18	SIGA-IM2 Qté : 2
------------------	------------------

Type de composante : EOL (Résistance de fin de ligne) Total = 8

CONT. N/ORFL 47kΩ Qté :	RFL Qté : 1	RFL 15kΩ Qté : 1	RFL 47kΩ Qté : 5
-------------------------	-------------	------------------	------------------

Type de composante : FS (Interrupteur de débit des gicleurs) Total = 26

DÉBIT Qté : 1	PS10-2A Qté : 7	VSR-F Qté : 18
---------------	-----------------	----------------

Type de composante : H (Avertisseur sonore) Total = 15

757-1A-T Qté : 1	882-2C Qté : 10	G1R-H Qté : 4
------------------	-----------------	---------------

Type de composante : HT (Détecteur de chaleur non réarmable) Total = 3

283B-PL Qté : 1	283C Qté : 1	CF135MP Qté : 1
-----------------	--------------	-----------------

Type de composante : HV (Avertisseur sonore et visuelle) Total = 27

757-5A-T Qté : 2	G1R-HDV30 Qté : 24	G1R-P Qté : 1
------------------	--------------------	---------------

Type de composante : M (Avertisseur manuel d'incendie) Total = 118

1534-2D-F Qté : 8	270-GAOF Qté : 23	SIGC-270B Qté : 2	SIGC-270PB Qté : 83
SIGC-270PBC Qté : 2			

Type de composante : PAI (Panneau d'alarme incendie) Total = 2

EST-3 Qté : 2

Type de composante : RHT (Détecteur de chaleur réarmable) Total = 39

281B-PL Qté : 1	281C Qté : 25	282C Qté : 3	5601A Qté : 2
CR135 Qté : 2	SIGA-HFS Qté : 1	SIGA-HRS Qté : 5	

Type de composante : S (Détecteur de fumée) Total = 329

6249C Qté : 9	6250C Qté : 1	C2M-PD1 Qté : 3	EC30U-3 Qté : 4
EDW2151A Qté : 1	SIGA-OSD Qté : 7	SIGA-PD Qté : 13	SIGA-PHS Qté : 1
SIGA-PS Qté : 290			

Type de composante : SFD (Dispositif d'appui (Surveillance)) Total = 59

SIGA-CT1 Qté : 14	SIGA-CT2 Qté : 45
-------------------	-------------------

Type de composante : SS (Dispositif de surveillance des gicleurs) Total = 60

702 Qté : 4	OSYSU Qté : 1	PCVS-2 Qté : 1	PIVSU-A1 Qté : 3
PIVSU-AI Qté : 1	PS120-2A Qté : 3	PS40-2 Qté : 10	PS40-2A Qté : 1
PTS-C Qté : 6	Valve Qté : 29		

Type de composante : V (Dispositif de signalisation visuelle) Total = 4

CS405-7A-T Qté : 1	G1-VM Qté : 1	LAMPE Qté : 2
--------------------	---------------	---------------

Type de composante : Zin (Module conventionnel (Entrée)) Total = 18

3-IDC8/3 Qté : 1	3-IDC8/4 Qté : 15	SIGA-CT2 Qté : 2
------------------	-------------------	------------------

Type de composante : Zout (Module conventionnel (Sortie)) Total = 1

SIGA-CC1S Qté : 1

E3.1 Mise à l'essai des dispositifs - Notes

(Ref: 5.7.4.1.3-5.7.4.3.1.5.7.4.5.1.5.7.8.1.1.5.7.8.2.2.5.7.8.2.4)

Notes	Description	Commentaire	Page
1	Ce panneau est désuet et les pièces de remplacement ne sont plus disponibles. Il serait recommandé de remplacer votre panneau d'alarme incendie afin d'éviter de laisser votre bâtiment sans protection advenant un bris majeur.	Recommandation (2024)	1
2	Le disjoncteur d'alimentation du panneau d'alarme incendie devrait être de couleur rouge, bien identifié, lisible et verrouillable en position marche. (ULC-S524-01, art. 3.2.1.4)	Recommandation (2024)	44,45
3	Nous vous recommandons de faire ajouter de la détection dans le corridor Ouest face R34, R38, R22, ascenseur 2, R17, R13, R9 et R3. Et ce afin d'améliorer votre système incendie.	Recommandation (2024)	2
4	Afin d'améliorer l'efficacité du système, Il serait recommandé de remplacer les dispositifs de détection conventionnels par des dispositifs adressables.	Recommandation (2024)	18,19,21
5	Cette station manuelle n'est pas à la bonne hauteur et devrait être réinstallée. Une station manuelle doit être installée entre 1200 mm et 1400 mm du centre de la station et le niveau du plancher. (ULC-S-524 art. 5.2.1)	Recommandation (2024)	12
6	Ce dispositif a été vérifié en actionnant la micro-switch interne du système SAFETY FIRST.	Observation	
7	Ce dispositif a été vérifié électriquement (essai statique seulement). (ULC S536-04 5.7.8.1.)	Observation	6,17,18,22,31, 32
8	L'inspection gicleur a été faite avec la collaboration de la compagnie TROY.	Observation	26
9	Le débit a été activé lors des tests de gicleur, cependant la valve n'a pas été trouvée. Nous recommandons de rechercher ce dispositif (renovation passée possible). Chaque dispositif doit être mis à l'essai au moins une fois tous les deux ans. (ULC S536-04 5.7.1.3)	Recommandation (2024)	30
10	Les deux circuits d'entrée de ce dispositif sont actuellement libres. Ils sont déjà programmés et prêts à être raccordés à leur fonction respective provenant de la génératrice. Nous vous recommandons de faire compléter ces raccordements par un électricien.	Recommandation (2024)	22
11	La signalisation de la partie communauté (monastère) fonctionne présentement à une étape. Le système sonnera en alarme générale dès qu'une alarme sera déclenchée.	Observation (2024)	38
12	Lors du test des relais de portes, prévenir la sécurité afin de prévoir avant de déverrouiller les portes aux 1,2,3e ouest et 3e nord.	Observation (2024)	1,42
13	Ce détecteur n'a pas un dégagement libre dans un rayon de 450mm. (ULC S524-06 5.7.2.2)	Observation (2024)	11
14	Ces relais fonctionneront tel que programmés. Cependant, étant donné que les deux circuits d'entrée du dispositif servant à leur activation sont libres, ils ne pourront jamais être activés. Il serait donc recommandé de compléter les raccordements requis avec le contrôle de la génératrice.	Recommandation (2024)	40
15	Ces relais fonctionnent tel que programmé. Cependant, ils ne sont pas raccordés à l'intérieur du contrôle d'ascenseur.	Observation (2024)	2,41
16	Je n'ai pas eu accès à ce dispositif l'accès est possible seulement avec un technicien d'ascenseur. Cependant j'ai prévenu le client dès le début de notre inspection.	Observation	2
17	Ce détecteur est à déclenchement unique. Inspection visuelle seulement.	Observation	12,21,33
18	Nous recommandons un détecteur de chaque côté de la poutre. Présentement il n'y en a qu'un seul côté.	Recommandation (2024)	5,9,11

19	Je n'ai pas localiser ce dispositif. Ce dispositif devra être localiser. Chaque dispositifs doivent être mis à l'essai au moins une fois tous les deux ans.(ULC S536-04 5.7.1.3)	Observation (2024)	16,43
20	L'accès à ce détecteur est très difficile car il est situé dans l'entre-plafond au dessus du convoyeur à plateau et que la trappe d'accès est trop petite. Il serait recommandé de refaire une trappe d'accès plus grande ou de relocaliser le détecteur à un autre endroit mieux accessible.	Recommandation (2024)	16
21	Les klaxons utilisés pour pré-signal ne produisent pas un son similaire aux klaxons d'alarme générale dans la partie communauté (monastère). Il serait même recommandé d'enlever ces appareils puisqu'ils ne sont plus requis étant donné que cette partie de l'édifice fonctionne en mode une étape.	Recommandation (2024)	38
22	Nous avons vérifié le changement d'état des contacts du module 8 relais au multimètre.	Observation	44
23	Dans la partie communauté (monastère), nous vous recommandons de faire ajouter de la détection dans les locaux techniques suivants : sous-sol sud : - salle gicleur/électrique sous-sol nord : - salle mécanique rez de chaussée aile nord - salle de couture R35 - buanderie R34 rez de chaussée aile est : - conciergerie R6 2e étage aile nord : - utilité 215 3e étage aile nord : - utilité 315 1er étage : - sortie près 123 (station manuelle)	Recommandation (2024)	2,24

24	Dans la partie communauté (monastère), nous vous recommandons de faire ajouter de la détection dans les corridors suivants : rez de chaussée aile nord : - près de R35, R28, R26 et R24 rez de chaussée aile ouest : - près de R10 et R14 rez de chaussée aile centre : - près de R11 rez de chaussée aile est : - face à R7 et près de R2 1er étage aile est : - près de R103 et face à R107 1er étage aile centrale : - près de R117, R111, R113 et R115 1er étage aile ouest : - près de R15, R16 et R4 1er étage aile nord : - près de R120, R126, R124 2e étage aile centrale : - près de R202, R206 2e étage aile est : - face à 222 (4x) et près de 222 et 219 - salle 218 2e étage aile sud : - près de 203, 207, 210, 213 2e étage aile nord : - près de 30, 25, 10, 14, 24, 19 3e étage aile nord : - près de 45, 48, 41, 56, 60 3e étage aile centrale : - près de 32	Recommandation (2024)	2,24
25	Dans la partie communauté (monastère), nous vous recommandons de faire ajouter de la détection dans les puits d'escalier suivants : - puits d'escalier 0 (aile est, 1er étage) - puits d'escalier sous-sol (aile nord, rdc) - puits d'escalier principal (rdc et 3e étage, aile sud) - puits d'escalier 104 (1er étage, aile est)	Recommandation (2024)	2,24
27	Nous vous recommandons de faire ajouter de la détection dans la salle de transformateur via SS7C Ouest, la salle compresseur via SS7A Ouest, dans le puits d'escalier près de RC09 Ouest et dans le corridor 2e étage Nord face au local 220.	Recommandation (2024)	2
28	Le rappel alternatif de l'ascenseur #2 s'effectue actuellement au 2e étage. Nous vous recommandons de faire modifier cela par votre compagnie d'ascenseur pour un rappel alternatif au rez-de-chaussée.	Recommandation (2024)	40
30	Nous vous recommandons de rajouter un détecteur de fumée dans la chambre 211 est et ce afin d'améliorer le système alarme incendie.	Recommandation (2024)	8
31	L'ascenseur #1 n'a aucun rappel incendie.	Observation (2024)	2
